


Prace mechaniczne Gr M4 uzupełnienie do M1 PT 2026

Id.	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Popr.Nazwy zasobów	27-wrz-2827-paź-0527-paź-1227-paź-1927-paź-2627-lis-02																										
							ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p
1		Prace mechaniczne GR M4 CTA PT 2026	36,92 dn?	nie, 26-09-27 08:00	wto, 26-11-03 06:00																												
2		E-1522A	36,88 dn	nie, 26-09-27 09:00	wto, 26-11-03 06:00																												
3		Montaż rusztowań	1,42 dn	nie, 26-09-27 09:00	pon, 26-09-28 19:00	Montaż rusztowań																											
4		Demontaż izolacji	1,42 dn	pon, 26-10-05 09:00	wto, 26-10-06 19:00	Demontaż izolacji																											
5		Przygotowanie wymiennika - część procesowa	3,5 dn	pon, 26-10-05 00:00	czw, 26-10-08 12:00	Przygotowanie wymiennika																											
6		Otwarcie wymienika	1,25 dn	czw, 26-10-08 12:00	pią, 26-10-09 18:00	5 Otwarcie wymienika																											
7		Mycie hydrodynamiczne	0,5 dn	pią, 26-10-09 18:00	sob, 26-10-10 06:00	6 Mycie hydrodynamiczne																											
8		Próba ciśnieniowa	12 godz.	sob, 26-10-10 06:00	sob, 26-10-10 18:00	7 Próba ciśnieniowa																											
9		Badania PT	0,5 dn	wto, 26-10-13 18:00	śro, 26-10-14 06:00	Bdania PT																											
10		Badania ECT	3 dn	sob, 26-10-10 18:00	wto, 26-10-13 18:00	8 Badania ECT																											
11		Generowanie raportu ECT	0,5 dn	wto, 26-10-13 18:00	śro, 26-10-14 06:00	10 Raport ECT																											
12		Naprawa wymienika	2,5 dn	śro, 26-10-14 06:00	pią, 26-10-16 18:00	11 Naprawa wymienika																											
13		Czyszczenie po naprawie i badaniach PT	0,25 dn	pią, 26-10-16 12:00	pią, 26-10-16 18:00	Czyszczenie po naprawie i badaniach PT																											
14		Próba ciśnieniowa	0,75 dn	pią, 26-10-16 18:00	sob, 26-10-17 12:00	12 Próba ciśnieniowa																											
15		Odbiór UDT	0,25 dn	sob, 26-10-17 06:00	sob, 26-10-17 12:00	Odbiór UDT																											
16		Zamknięcie wymienika	2 dn	sob, 26-10-17 12:00	pon, 26-10-19 12:00	14 Zamknięcie wymienika																											
17		Próby rozruchowe - produkcja	3,5 dn	pon, 26-10-19 12:00	pią, 26-10-23 00:00	16																											
18		Montaż izolacji	2 dn	śro, 26-10-28 06:00	pią, 26-10-30 06:00	Montaż izlacji																											
19		Demontaż rusztowania	2 dn	nie, 26-11-01 06:00	wto, 26-11-03 06:00	Demontaż rusztowania																											
20		E-1522B	36,88 dn?	nie, 26-09-27 09:00	wto, 26-11-03 06:00																												
21		Montaż rusztowań	1,42 dn	nie, 26-09-27 09:00	pon, 26-09-28 19:05	Montaż rusztowań																											
22		Demontaż izolacji	1,42 dn	pon, 26-10-05 09:00	wto, 26-10-06 19:05	Demontaż izolacji																											
23		Przygotowanie wymiennika - część procesowa	3,5 dn	pon, 26-10-05 00:00	czw, 26-10-08 12:00	Przygotowanie wymiennika																											
24		Otwarcie wymienika	1,25 dn	czw, 26-10-08 12:00	pią, 26-10-09 18:00	23 Otwarcie wymienika																											
25		Mycie hydrodynamiczne	0,5 dn	pią, 26-10-09 18:00	sob, 26-10-10 06:00	24 Mycie hydrodynamiczne																											
26		Próba ciśnieniowa	12 godz.	sob, 26-10-10 06:00	sob, 26-10-10 18:00	25 Próba ciśnieniowa																											
27		Badania PT	0,5 dn	wto, 26-10-13 18:00	śro, 26-10-14 06:00	Bdania PT																											
28		Badania ECT	3 dn	sob, 26-10-10 18:00	wto, 26-10-13 18:00	26 Badania ECT																											
29		Generowanie raportu ECT	0,5 dn	wto, 26-10-13 18:00	śro, 26-10-14 06:00	28 Raport ECT																											
30		Naprawa wymienika	2,5 dn	śro, 26-10-14 06:00	pią, 26-10-16 18:00	29 Naprawa wymienika																											
31		Czyszczenie po naprawie i badaniach PT	0,25 dn	pią, 26-10-16 12:00	pią, 26-10-16 18:00	Czyszczenie po naprawie i badaniach PT																											
32		Próba ciśnieniowa	0,75 dn	pią, 26-10-16 18:00	sob, 26-10-17 12:00	30 Próba ciśnieniowa																											
33		Odbiór UDT	0,25 dn	sob, 26-10-17 06:00	sob, 26-10-17 12:00	Odbiór UDT																											
34		Zamknięcie wymienika	2 dn	sob, 26-10-17 12:00	pon, 26-10-19 12:00	32 Zamknięcie wymienika																											
35		Próby rozruchowe - produkcja	3,5 dn	pon, 26-10-19 12:00	pią, 26-10-23 00:00	34 Prace rozruchowe																											
36		Montaż izolacji	2 dn	śro, 26-10-28 06:00	pią, 26-10-30 06:00	Montaż izlacji																											
37		Demontaż rusztowania	2 dn	nie, 26-11-01 06:00	wto, 26-11-03 06:00	Demontaż rusztowania																											
38		E-1461	36 dn	pon, 26-09-28 06:00	wto, 26-11-03 06:00																												
39		Montaż rusztowań	1 dzień	pon, 26-09-28 06:00	wto, 26-09-29 06:00	Montaż rusztowań																											
40		Przygotowanie wymiennika - część procesowa	3,5 dn	pon, 26-10-05 00:00	czw, 26-10-08 12:00	Przygotowanie wymiennika																											
41		Demontaż izolacji	1 dzień	pon, 26-10-05 06:00	wto, 26-10-06 06:00	Demontaż izolacji																											
42		Otwarcie wymienika	1 dzień	czw, 26-10-08 12:00	pią, 26-10-09 12:00	40 Otwarcie wymienika																											
43		Mycie hydrodynamiczne	12 godz.	pią, 26-10-09 12:00	sob, 26-10-10 00:00	42 Mycie hydrodynamiczne																											
44		Badania PT	6 godz.	sob, 26-10-10 00:00	sob, 26-10-10 06:00	43 Bdania PT																											

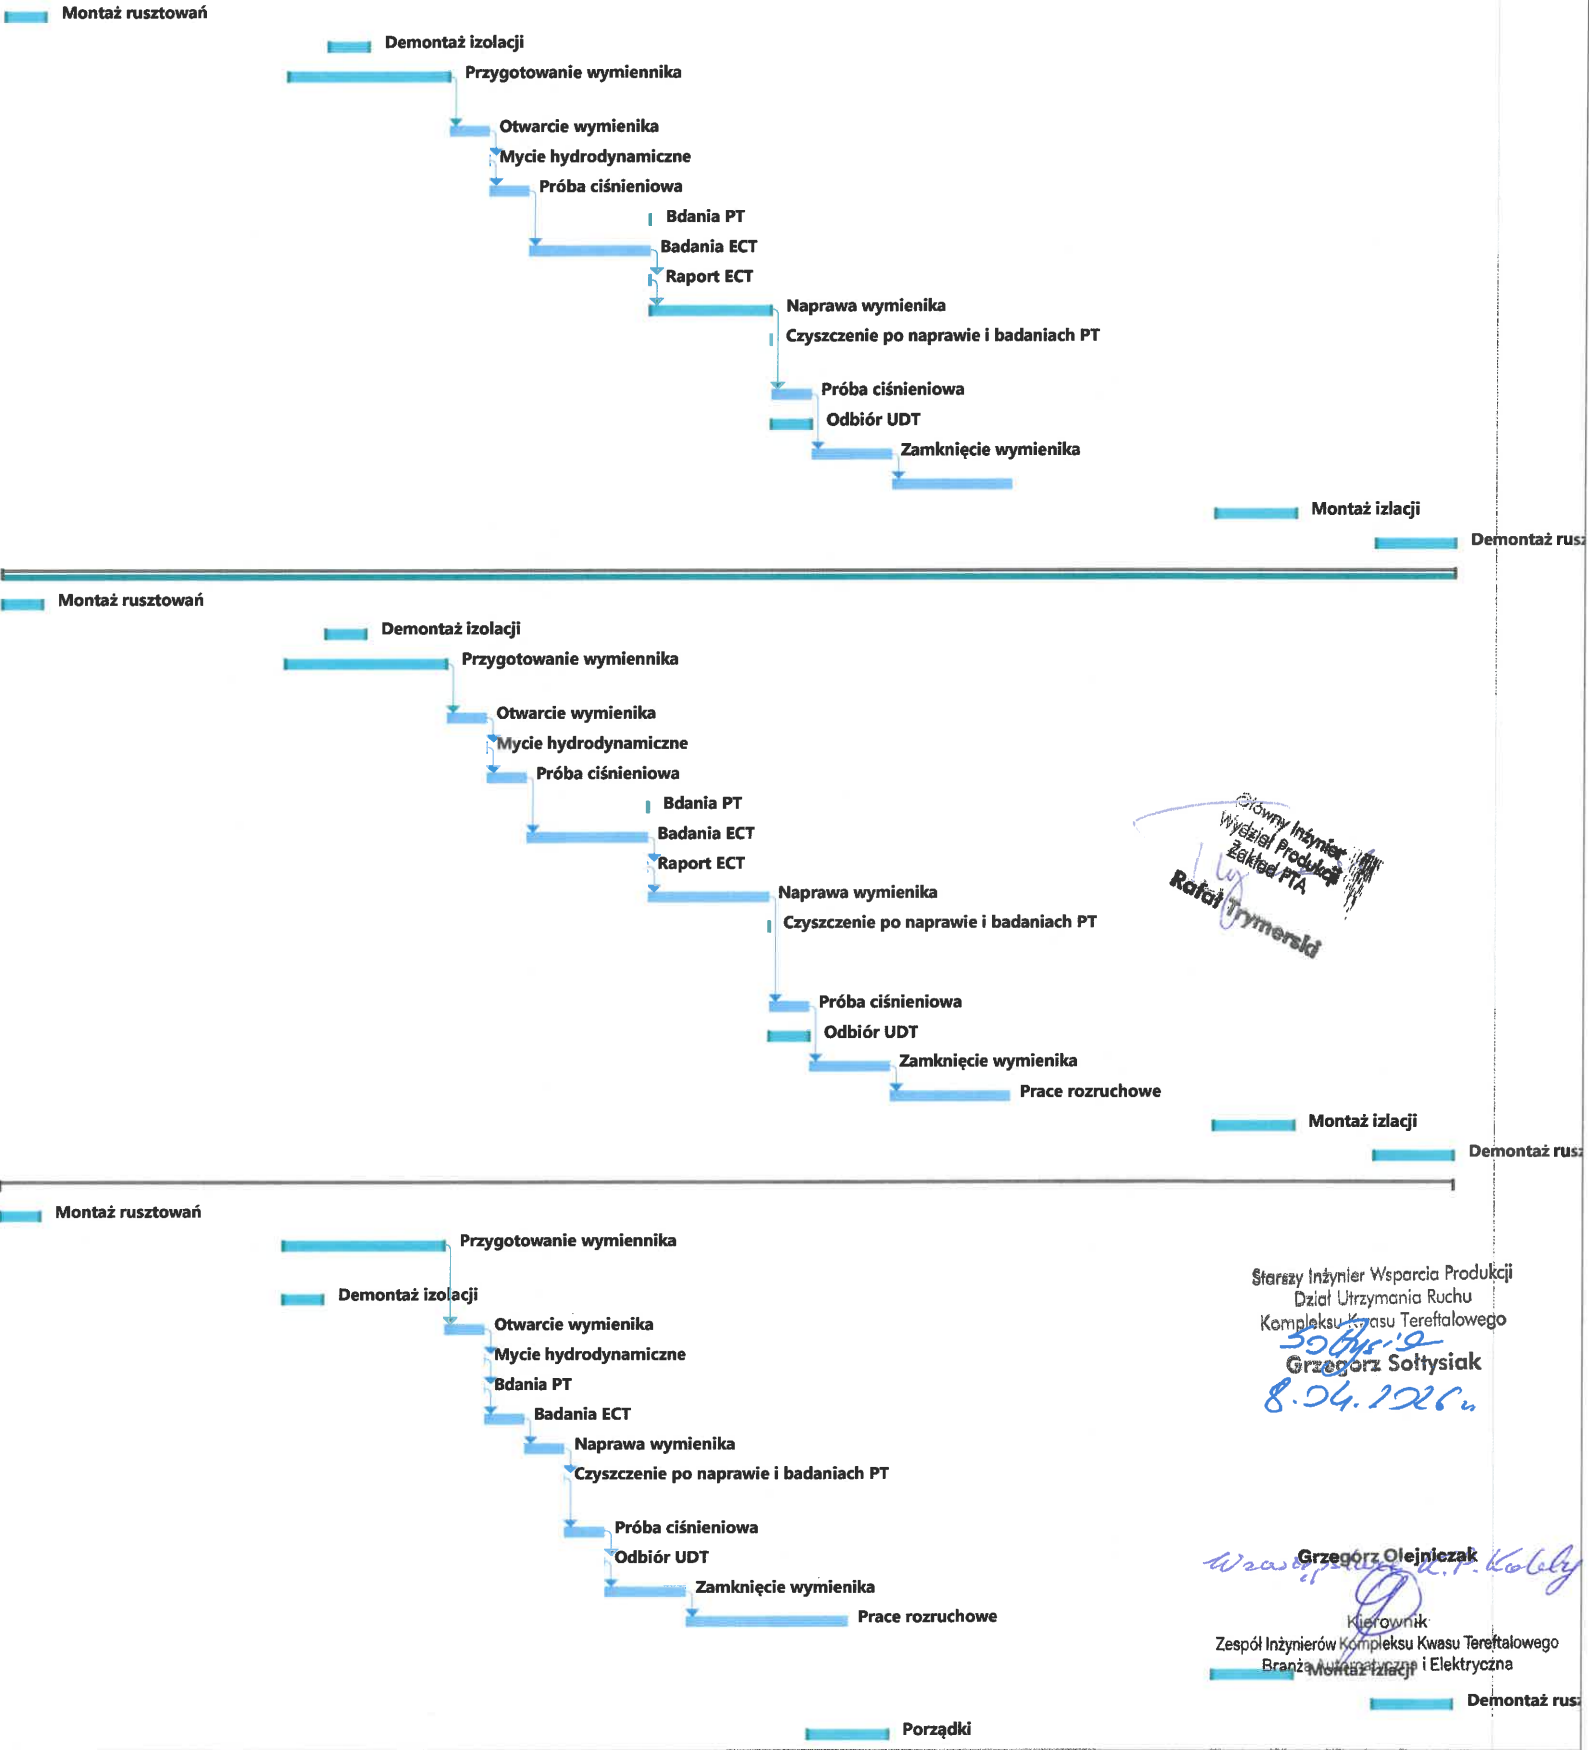

Stary Inżynier  
Wydział Produkcji  
Zakład PTA  
Rafał Tymerski

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji  
Dział Utrzymania Ruchu  
Kompleksu Kwasu Tereftalowego  
Grzegorz Soltysiak  
8.04.2026

Grzegorz Olejniczak  
Kierownik  
Zespół Inżynierów Kompleksu Kwasu Tereftalowego  
Branża Automatyka i Elektryczna

Projekt: kalendarz_24h_2zmiany	Zadanie	Podsumowanie	Nieaktywny punkt kontroli	Tylko z czasem trwania	Tylko z rozpoczęciem	Zewnętrzne punkty kontrolne	Ręczne (postęp)
Data: śro, 26-04-08 13:19	Podział	Podsumowanie projektu	Podsumowanie nieaktywne	Rzutowanie podsumowania ręcznego	Tylko z zakończeniem	Temin ostateczny	
	Punkt kontroli	Zadanie nieaktywne	Zadanie ręczne	Podsumowanie ręczne	Zadania zewnętrzne	Postęp	
