


Instead of the dismantled Ds150 coil, with a length of 1085 mm, installed pigging equipment connections in the KR-102 inlet pipes 6" class 300 RTJ/Vietoje kito rangovo demontuotos Ds150 ritės , kurios ilgis 1085 mm sumontuoti pigging įrangos pajungimui antgalius KR-102 įėjimo atvamzdžiuose 6" class 300 RTJ

- Registracijos riba
→ Kontrolė
— Suvirinimo siūlė
1 Suvirinimo siūlės numeris
1 Suvirintojo žymeklis
0 Vamzdyno elementų pozicijos numeris
0 → Vamzdyno elementų storio matavimo taškai

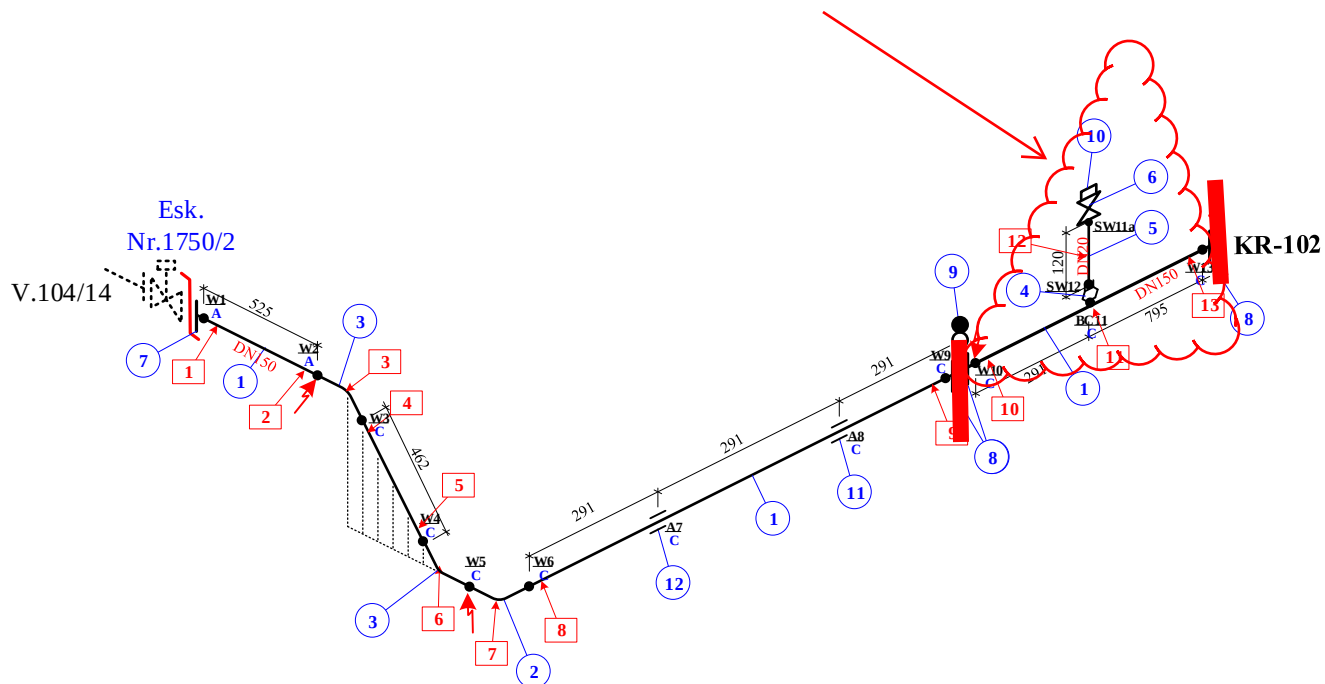

Oper. medium	Vakuuminis distialiatas	GOST Category (BM-4)	-	Parameters	Oper. presure	bar	8	Vamzdynas Nr. ./Pipe line Nr.:/ V.104/15-2	Baras:/ Section:/ GP-Nr.2 Įrenginys Nr.2 (S-100)		
		PED Category	1-II		Desing presure		18				
Test medium	vanduo	Material	A335 P5		Test presure	33,7	Nuo V.104/14 (SP-101) Esk Nr.1750-2 iki KR-102	Lapas	Lapų		
Codes	ASME B31.3	Insulation	YES		Oper. Temp.	315		Page	Pages		
Calc. No.	---	PWHT	YES		Design Temp.	390		1	1		
---	---	Heating	NO		Test Temp.	10÷40					
