


Instead of the dismantled Ds150 coil, with a length of 1085 mm, installed pigging equipment connections in the KR-102 inlet pipes 6" class 300 RTJ/Vietoje kito rangovo demontuotos Ds150 ritės , kurios ilgis 1085 mm sumontuoti pigging įrangos pajungimui antgalius KR-102 įėjimo atvamzdžiuose 6" class 300 RTJ

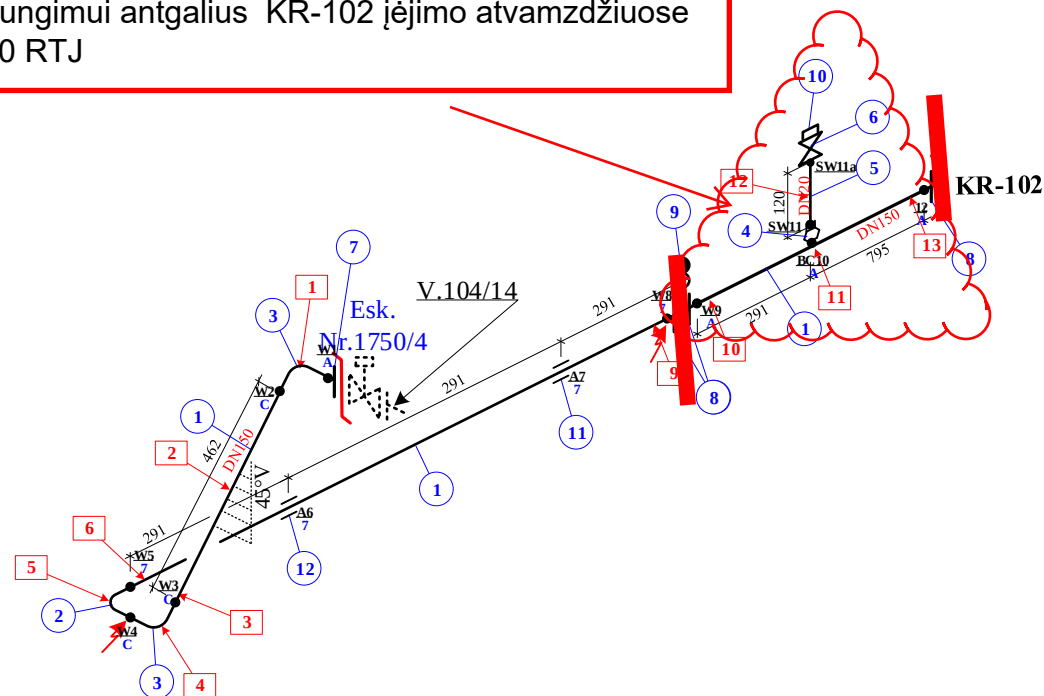

Registracijos riba

Kontrolė

Suvirinimo siūlė

1 Suvirinimo siūlės numeris

1 Suvirintojo žymeklis

0 Vamzdyno elementų pozicijos numeris

0 Vamzdyno elementų storio matavimo taškai

Oper. medium	Vakuuminis distialiatas	GOST Category (BM-4)	-	Parameters	Oper. presure	bar	8	Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/ V.104/15-4	Baras:/ Section:/ GP-Nr.2 Įrenginys Nr.2 (S-100)		
		PED Category	1-II		Desing presure		18				
Test medium	vanduo	Material	A335 P5		Test presure		33,7				
Codes	ASME B31.3	Insulation	YES		Oper. Temp.	°C	315	Nuo V.104/14 (SP-101) Esk Nr.1750-4 iki KR-102	Lapas Page	Lapų Pages	
Calc. No.	---	PWHT	YES		Design Temp.		390		1	1	
---	---	Heating	NO		Test Temp.		10÷40				
