

Altana Magazynowa i3 (nietykowa) – ogólny opis montażu.

1. **Montaż:** Otrzymujecie Państwo informację z kilkudniowym wyprzedzeniem odnośnie montowanego kontenera. Montaż odbywa się na gotowych fundamentach. Kabel zasilający także jest wypuszczony z budynku. Altana nietykowa o wymiarach 7,00 x 2,00m przylega do istniejącego budynku.
2. **Szkielet:** Konstrukcja stalowa ocynkowana z rur 100x100x4 mm – rama, 50x50x3 mm – dach, C80x40x4 mm – podłoga. Całość skręcona śrubami ~140 szt.
3. **Obudowa:** Płyty warstwowe gr. 100 mm PIR.
4. **Podłoga:** Blacha T-18 przykręcana do konstrukcji, wełna mineralna gr.100 mm, płyta OSB 22 mm, blacha aluminiowa ryflowana, obróbki krawędziowe na styku podłogi ze ścianą.
5. **Dach:** Płyty OSB 22 mm x2 przykręcane do konstrukcji, papa podkładowa, papa nawierzchniowa termozgrzewalna wywinięta na krawędzie płyt warstwowych, obróbki blacharskie. Dach zielony w systemie XeroFlor, ułożenie warstw zgodnie z instrukcją i zalanie wodą.
6. **Elektryka:** Kompletny zestaw dostarczany na budowę: przewody, lampy, rozdzielnia, gniazdka, styczniki, koryta itd. Całość okablowania wewnątrz altany układamy w korytkach. Kabel zasilający doprowadzony przez GW. Podpięcie i pomiary elektryczne łącznie z natężeniem oświetlenia podstawowego i awaryjnego po stronie zleceniobiorcy. Protokół musi być sporządzony przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami (budowlane elektryczne).
7. **Obróbki zewnętrzne:** Przykręcone blachowkrętami i uszczelnione silikonem. Dodatkowe obróbki na łączeniu altany z pawilonem.


Materiały dodatkowe po stronie zleceniobiorcy:

Dostarczamy wszystkie materiały potrzebne do montażu. Po stronie zleceniobiorcy jedynie drobne akcesoria jak silikon, uszczelniacze, wkręty, wsporniki pod osadzanie drzwi, itd.

Klimatyzacja:

Oferta nie obejmuje montażu ani rozruchu klimatyzacji - dostawa inwestorska. W zakresie jedynie montaż konstrukcji na ścianie zewnętrznej.

Przykładowe fotografie wykonanych altan:

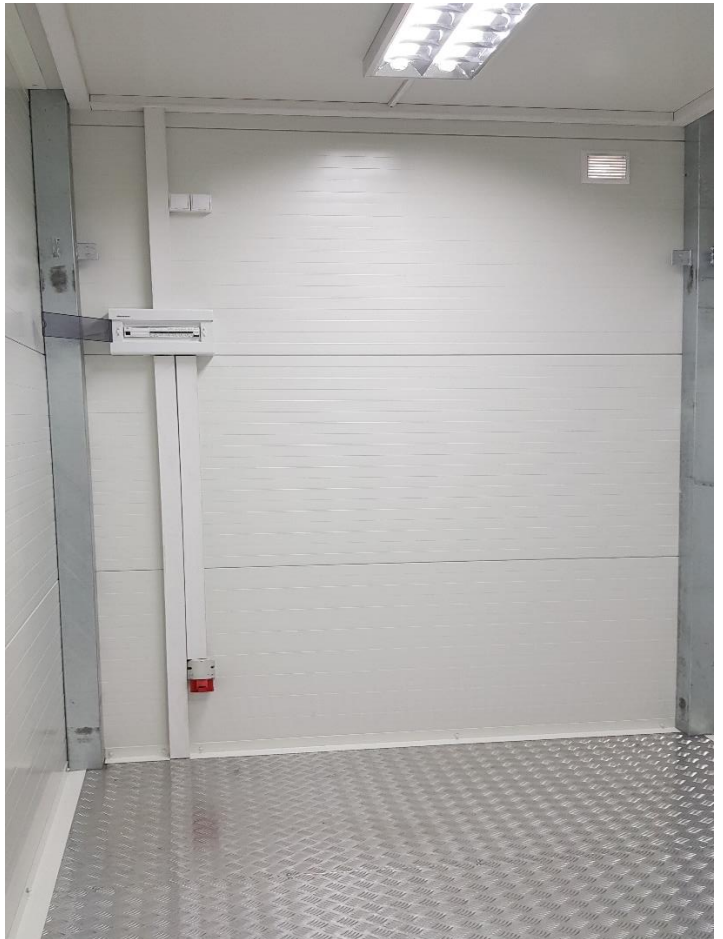



Pokrycie dachu musi być 100% szczelne.

Udzielenie gwarancji na całość 3 lata.

Dokumentacja do wglądu zostanie udostępniona po odesłaniu podpisanego dokumentu o zachowaniu poufności.
