

DARBAI PRISKIRIAMAI UŽSAKYMUI:	
Avarinis	
Skubus	
Planinis	X
Perspektyvus	

TVIRTINU:
Statinių techninės priežiūros ir remonto vadovas

Algirdas Rimiškis
Statinių techninės priežiūros
ir remonto vadovas

STATINIO APŽIŪROS AKTAS

2025.12.04 Nr. (7.3-4)/4712

Mažeikių g. 75, Juodeikiai, Mažeikių r., 89467

Statinio adresas – AB, „Orlen Lietuva“ priešgaisrinio vamzdyno V2 atnaujinimas siurblinė Nr.35 RZ-50, RZ31-36 aušinimas

Apžiūra – Specialioji

Apžiūros tikslas – priešgaisrinio vandentiekio vamzdynų atnaujinimas kvartale Nr.62

Eil. Nr.	Konstruktyvas	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
1.	Priešgaisrinio vandentiekio vamzdynas, Siurblinė Nr.35 RZ-50, RZ 31-36	Senas D200/250 plieninis priešgaisrinio vandentiekio vamzdynas paveiktas korozijos nepatikimas, daugelį sykių remontuotas, sunkiai darinėjasi rezervuarų aušinimo sklendės, fiziškai susidevėjusios valdymo kolonėlės <i>(foto: 1÷5)</i>	Atnaujinti priešgaisrinio vandentiekio vamzdyną, - atviru būdu atkasti demontuoti seną D200-250 plieno vamzdį ir pakloti naują (po vamzdynais betranšėjiniu būdu) PE D355 PN16 vamzdyną m. 470m. -demontuoti senus rezervuarų RZ-50, RZ31-36 aušinimo vamzdynų šulinius ir antžemines kolonėles su armatūra 7vnt. -betranšėjiniu būdu sumontuoti RZ-50, RZ31-36 atšakas D250 PE iki rezervuarų 7vnt./300m. ir pajungti prie esamų D200 aušinimo vamzdynų. -sumontuoti RZ-50, RZ31-36 rezervuarų aušinimo vamzdynų požemines sklendes D200 PN16 su valdymo kolonėlėmis 7vnt. -sumontuoti RZ-50, RZ31-36 rezervuarų aušinimo vamzdynų D50 PN16 drenažines sklendes su valdymo kolonėlėmis 7vnt. -atnaujinti pakeisti priešgaisrinio vandens įvadą į siurblinę Nr.25 1vnt. atviru būdu demontuoti d100 vamzdį ir pakloti naują PE D125 PN16 vamzdį 45m., sumontuoti D100 PN16 požeminę sklendę su valdymo kolonėle. -įrengti dolomitinės skaldos aikštelės ties naujai sumontuotomis kolonėlėmis 30m2 ir signalinius stulpelius 14vnt.

PASTABOS:

1. Prieš darbų pradžią rangovas pasirengia darbo projektą ir suderina su užsakovu
2. Prieš darbų pradžią rangovas suderina su užsakovu numatomas naudoti medžiagas
3. Po remonto darbų atstatyti gerbūvį neblogiau esamo.
4. Visos medžiagos ir mechanizmai rangovo
5. Betono laužą išvežti į statybinių atliekų aikštelę, perteklinį gruntą į gamyklos grunto sandėliavimo aikštelę. Metalo laužą suvežti įrenginyje į užsakovo nurodytą vietą.
6. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą atlieka atnaujinamos atkarpos apžiūrą ir įsivertina galimus papildomus darbus ir pasitiksina darbų apimtį.
7. Rangovas ant naujai sumontuotų lafetų, hidrantų pasigamina užklijuoja lipdukus su numeriais, ant valdymo kolonėlių užrašus kas valdoma.
8. Naujai montuojamų lafetų vamzdynų slėgis ne mažesnis nei Pn16, pagrindinis vamzdynas PE D355 PN16
9. Darbų vykdymas 2026 metais (Pateikti kuo trumpesnę grafiką darbų atlikimui)

Pridedama: Priedas Nr.1 Fotonuotraukos 1 lapas; priedas Nr.2 darbo schema 1 lapas

Apžiūros vykdytojas aktą paruošė – Vyresnysis inžinierius statybininkas

Povilas Dagelis
Mechanikos skyrius
Inžinierius statybininkas

Apžiūros vykdytojas – inžinierius statybininkas

Žilvinas Lazdauskas
Mechanikos skyrius
Inžinierius statybininkas


AB, „Orlen Lietuva“ priešgaisrinio vamzdyno V2 atnaujinimas 35 siurblinė RZ-50, RZ31-36



Pav.1



Pav.2

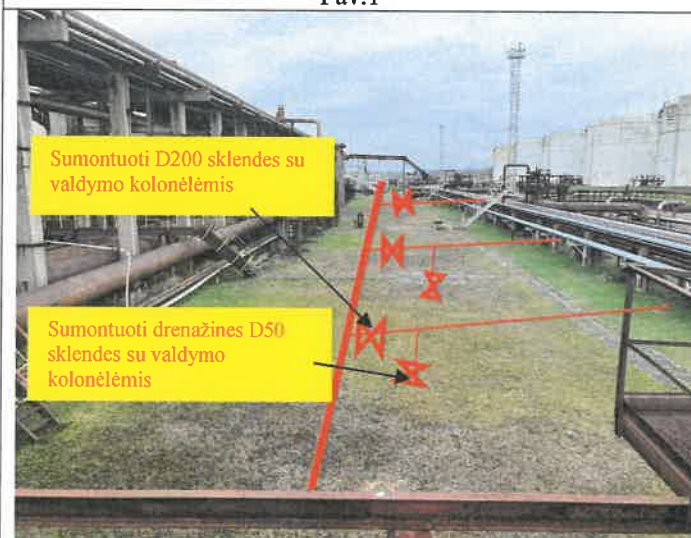

Pav.3



Pav.4



Pav.5



Pav.6

DARBO SCHEMA

Priešgaisrinio vamzdyno atnaujinimas 35 siurblinė RZ-50, RZ31-36

