


Doraźne 2026

GPZ Kleczew—Wiśniewa

Wym. rozł. nr 5-286, 5-1362, 5-706

1. GPZ Kleczew—Wiśniewa: rozł 5-286

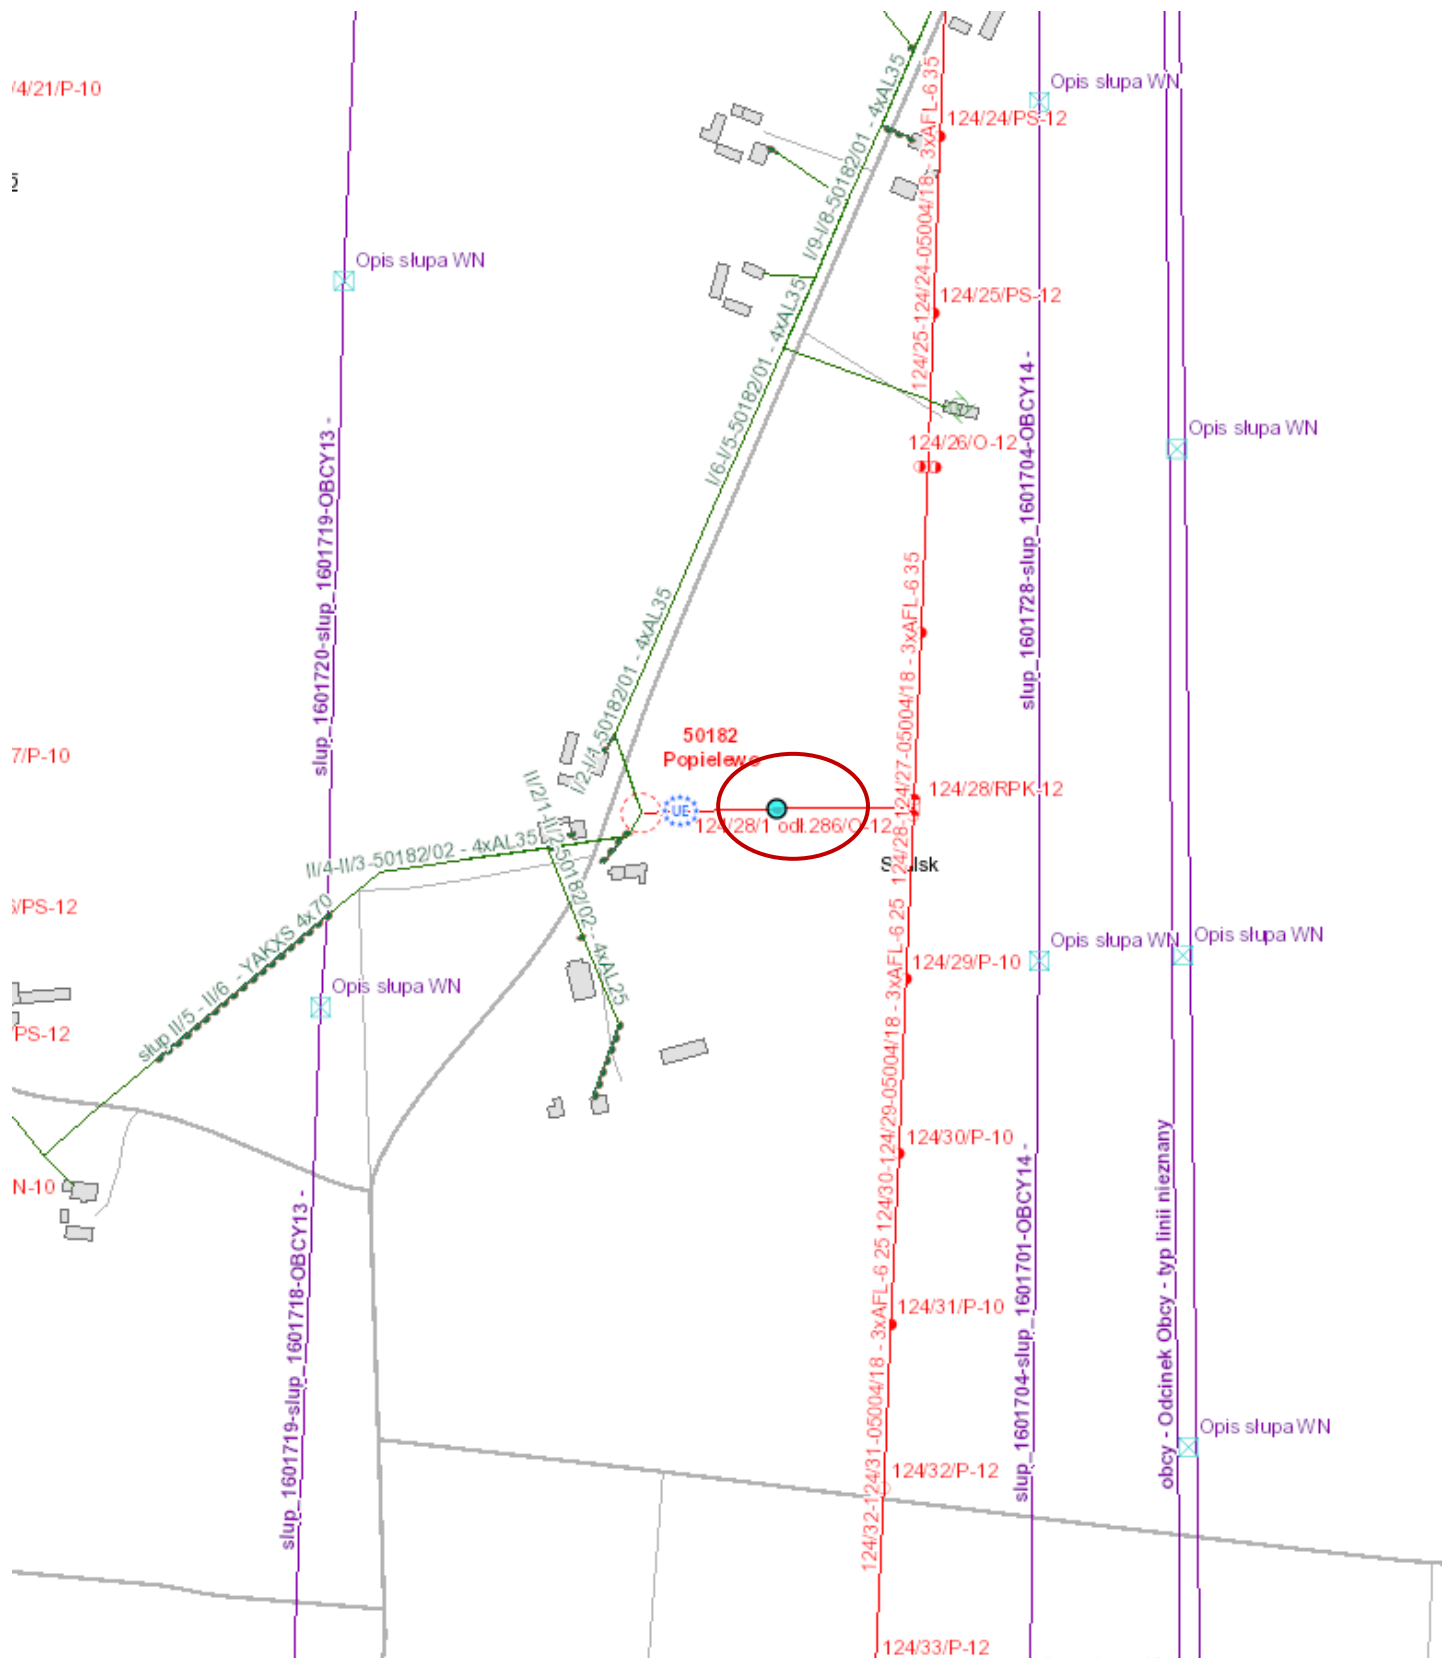


- wymiana rozłącznika 450286 na RUN,
- wymiana słupa nr 124/28/1 na O/E-13,5/17,5
- uziemiaenie =5,7Ω, pomiar napięcia rażenia Utp 86V





2. GPZ Kleczew—Wiśniewa: rozł 5-1362

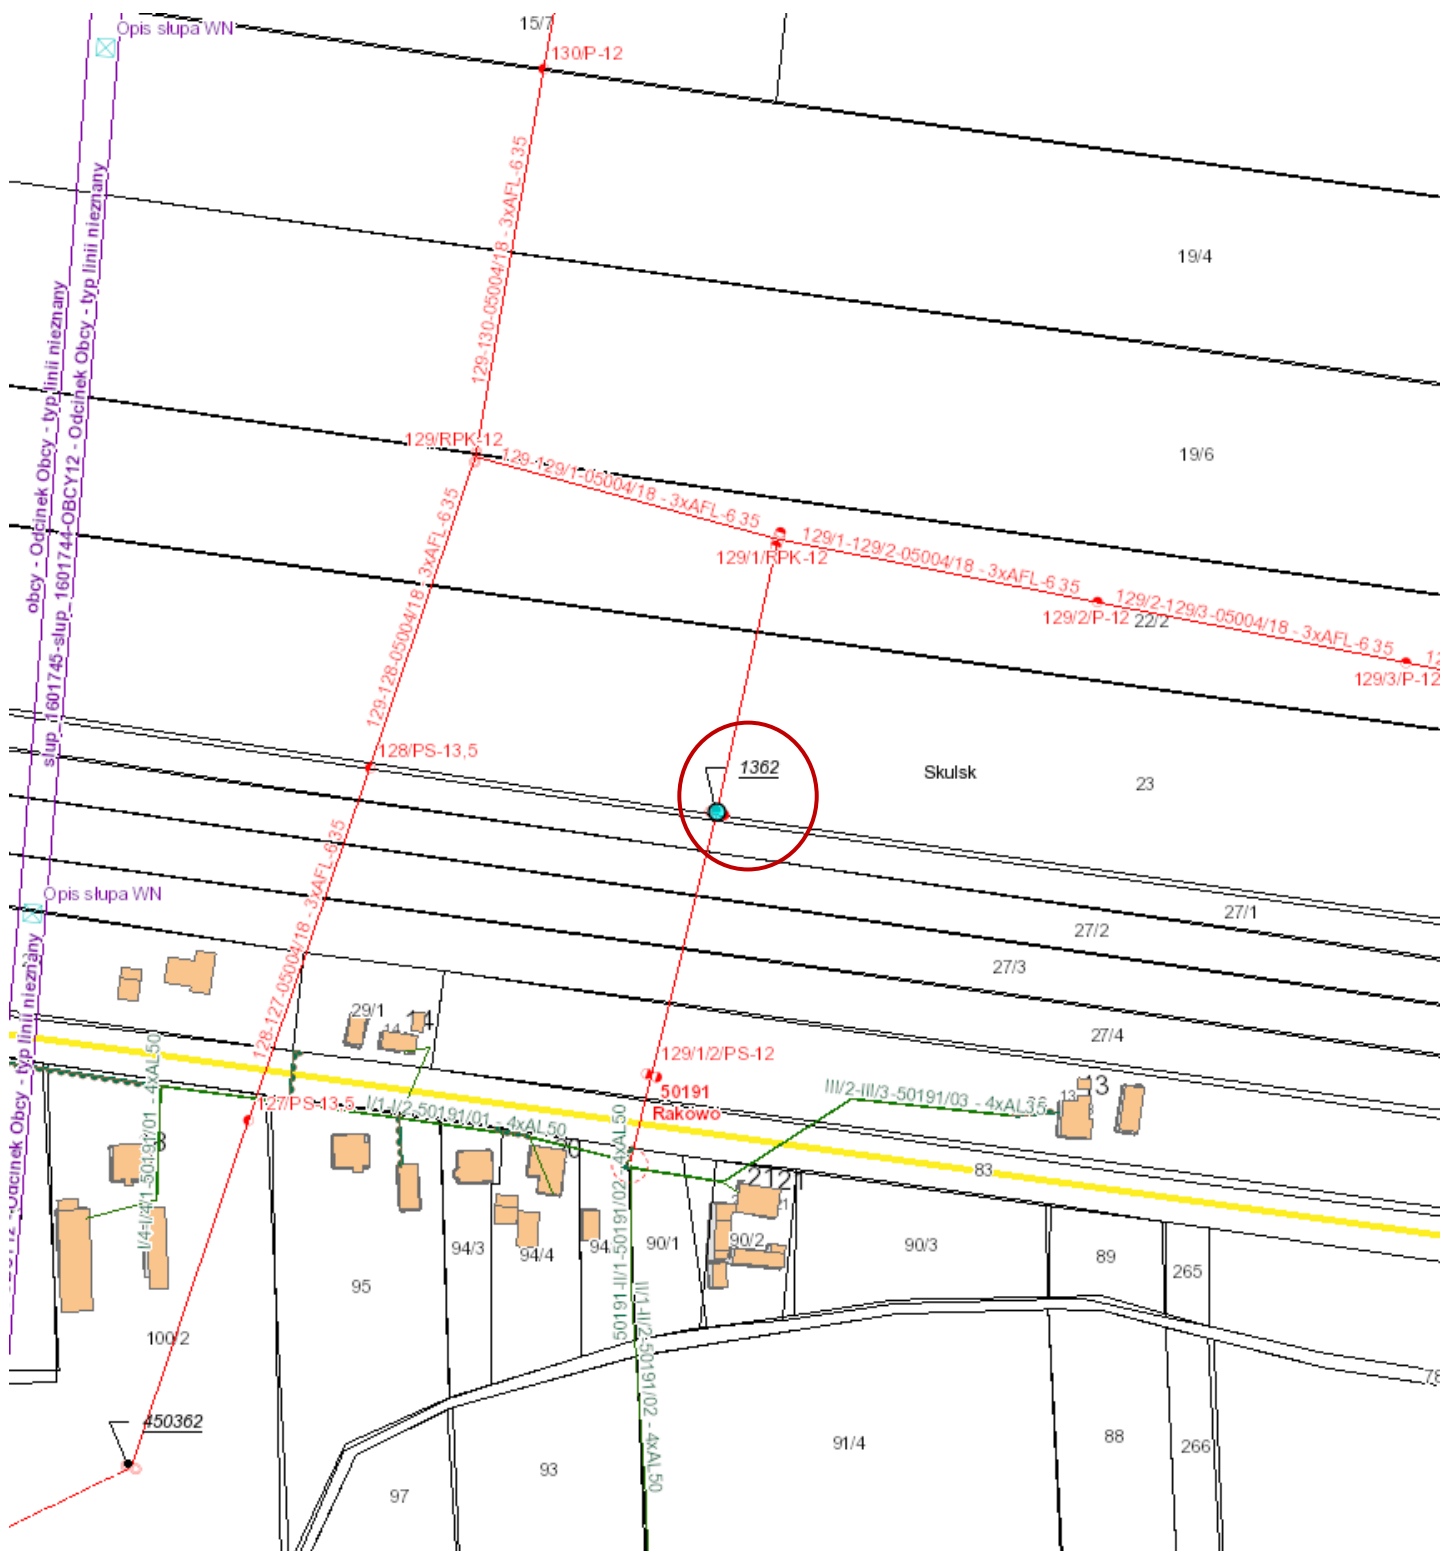

- wymiana rozłącznika 451362 na RUN,
- wymiana słupa nr 129/1/1 na O/E-13,5/17,5
- uziemiaenie $=5,7\Omega$, pomiar napięcia rażenia Utp 86V


rozł. 5-1362



rozł 5-1362



3. GPZ Kleczew—Wiśniewa: rozł 5-706

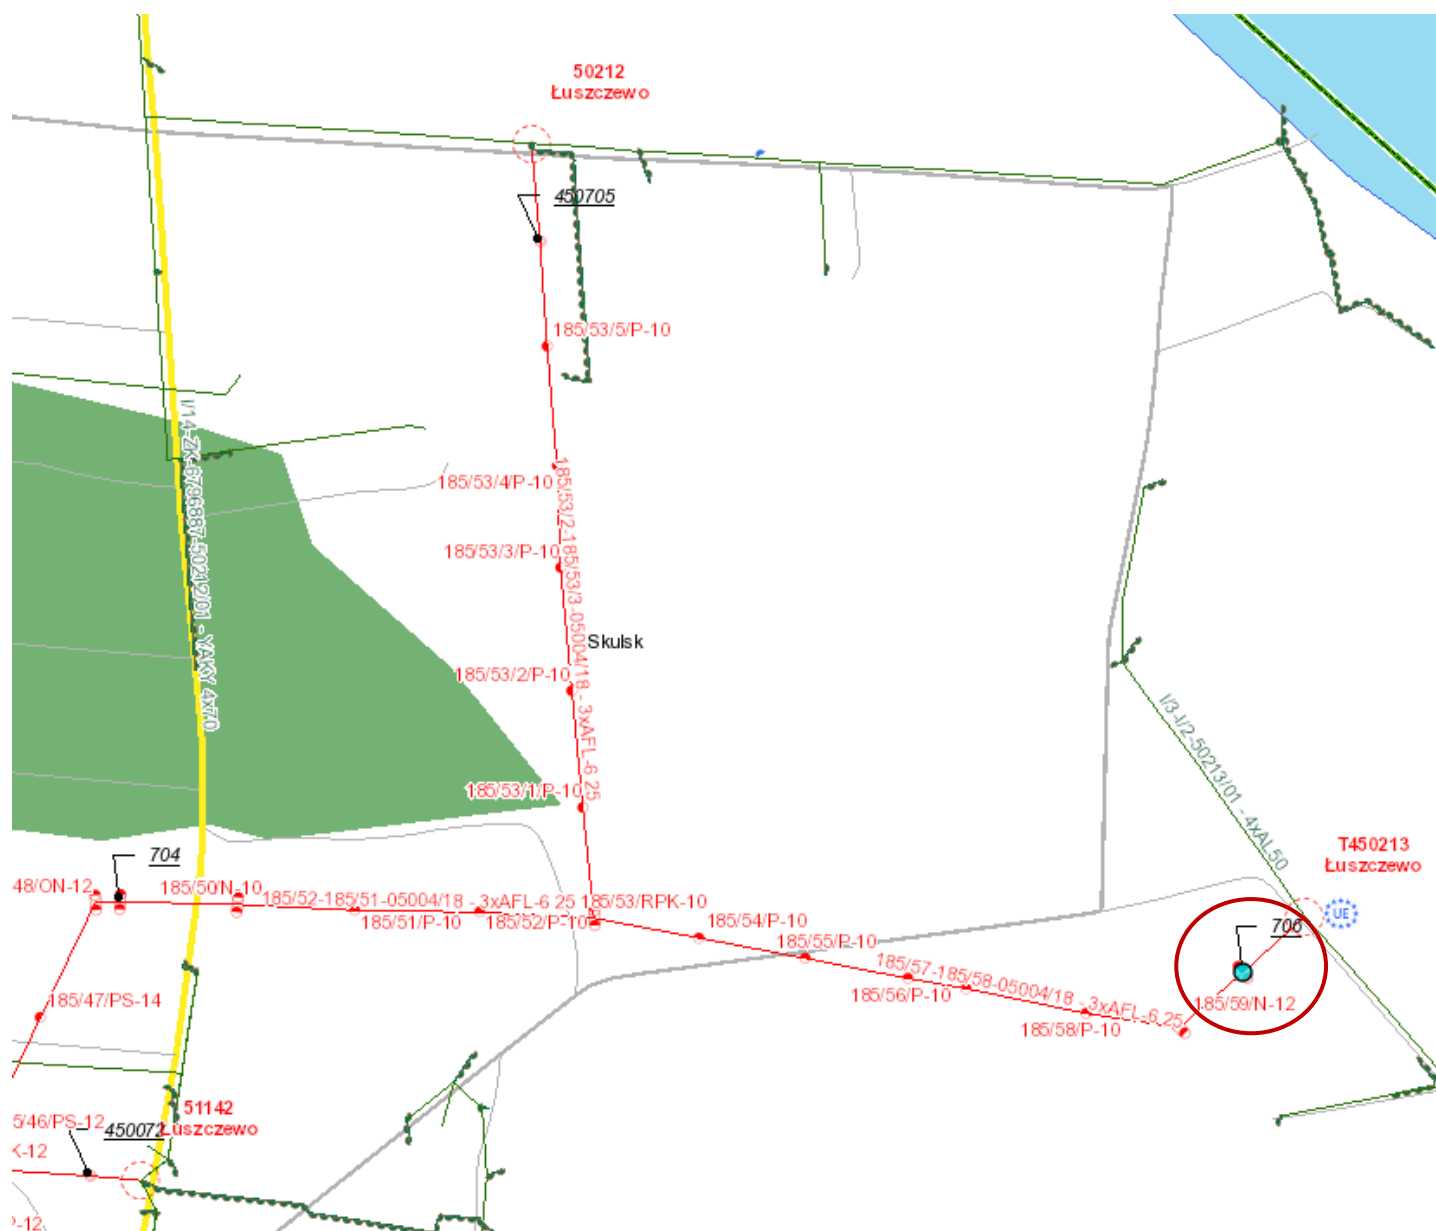

- wymiana rozłącznika 450706 na RUN,
- wymiana słupa nr 185/59 na O/E-13,5/17,5
- uziemiaenie =5,7 Ω , pomiar napięcia rażenia Utp 86V



