

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): OBH20/24/25004 N.D. Gdańsk ul. Wawrzowska

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
 - a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐	ENERGA ☐
------------------------------------	---------------------------------
 - b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐	ENERGA ☐
- Ilość moc.....	- Ilość moc.....
- Ilość moc.....	- Ilość moc.....
- Ilość moc.....	- Ilość moc.....

I. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐	ENERGA ☒
------------------------------------	--

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐	NIE ☒
------------------------------	---

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐	ENERGA ☐
- Ilość moc.....	- Ilość moc.....
- Ilość moc.....	- Ilość moc.....
- Ilość moc.....	- Ilość moc.....
- Ilość moc.....	- Ilość moc.....
- Ilość moc.....	- Ilość moc.....

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń: <u>3 szt.</u>
- czas wyłączeń: <u>18 god. (3x6)</u>

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐	NIE ☒
------------------------------	---

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Sporządził

Pracownik MZE/MMP:

Inżynier Włodący
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Krzysztof Wasilewski

Zatwierdził:

Kierownik MZE/MMP:

Inżynier Włodący
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Krzysztof Wasilewski


ZŁ - SN 52

Proj. złącza kablowe ZŁ-SN
typu T100K w obwodzie betonowej

ZŁACZNIK GRZBIENNY DO PISMA ZN
ZOPISU 16/2024 M/DOW/54 L/DNA OJ.M. 8224
BOKU WZDADNĄ WŁĘCO KONCEPCJE
PRZEBUDOWY OPERATORSKĄ NA PODSTAWIE
WARUNKÓW PRZEBUDOWY DR R123/076 W/10
Z DNIA 06-03-2024 ROKU.

Technik ds. Przyłączeń

Murphy
Jacek Myszk

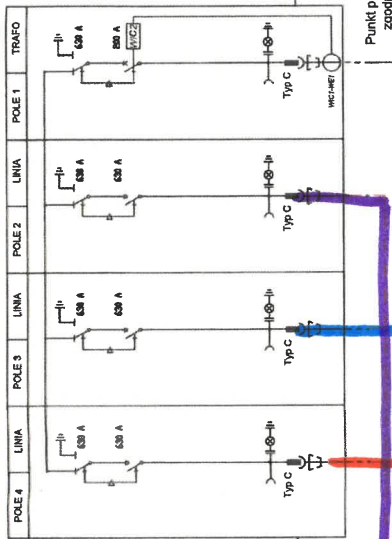

Proj. linia kablowa 10kV
typu 3 x MA2XSFLJ27 1x150/25mm²
długość L=61 (10m)

Proj. linia kablowa 10kV
typu 3 x MA2XSFLJ27 1x150/25mm²
długość L=163 (176m)

STACJA TRANSFORMATOROWA T-5112 NOWY DWÓR POM - DO LIKWIDACJI

CZĘŚĆ ROZDZIELNICZY OBSŁUGIWANA PRZEZ ENERGIA-OPERATOR SA

POLE nr 1	POLE nr 2	POLE nr 3	POLE nr 4	POLE nr 5
Pole liniowe Kier. T-5111 Nowy Dwór Centra Naalenia HAKnFIA 3x120	Pole liniowe Kier. T-5113 Nowy Dwór Mieczan HAKnFIA 3x50	Pole liniowe Kier. T-5114 Nowy Dwór Szkoła HAKnFIA 3x50	Łącznik szyn	Pole pomiarowe
AP 60x10	AP 60x10	AP 60x10	OWB20x1	OWB20x1
U1, U2, U3	U1, U2, U3	U1, U2, U3	U1, U2, U3	U1, U2, U3

CZĘŚĆ ROZDZIELNICZY OBSŁUGIWANA PRZEZ ODBIORCĘ

U1, U2, U3	U1, U2, U3	U1, U2, U3	U1, U2, U3	U1, U2, U3
------------	------------	------------	------------	------------

L. K 15kV HAKnFIA 3x120 6200
Kier. T-5111 Nowy Dwór
Centra Naalenia

Proj. mufa przelotowa

SN 5114 SN 5113

Proj. linia kablowa 10kV
typu 3 x MA2XSFLJ27 1x150/25mm²
długość L=164 (176m)

Proj. mufa przelotowa

L. K 15kV HAKnFIA 3x50 4005
Kier. T-5114 Nowy Dwór Szkoła

STYPR-REKOWSKI Sp. z o.o.
ul. Kościarska 19, 85-400 Kościerzyna Wyprowadzenie
tel./fax: (58) 686-54-28
NIP: 591-169-64-28

Objekt:
Przebudowa linii kablowych SN-15kV w celu usunięcia kolizji z planowaną
zmienną zagospodarowania i budowa złącza kablowego SN-15kV
Dz. nr 12/12 obręb 0004 Nowy Dwór Gdański

Investor:
ENERGA-OPERATOR SA; ul. Marynarki Polskiej 130;

Typ rysunku:
Schemat jednokreskowy zasilania

Skala:
E-02

Data opracowania:
październik 2024

Projektant:
mgr inż. Bartłomiej Syp-Rakowski

Pracownik:
mgr inż. Piotr Klasa

Podpis:
POM/0128/PBE/23

T-5111 N.D. Centra Naalenia
T-5113 N.D. Mieczan
T-5114 N.D. Szkoła
