


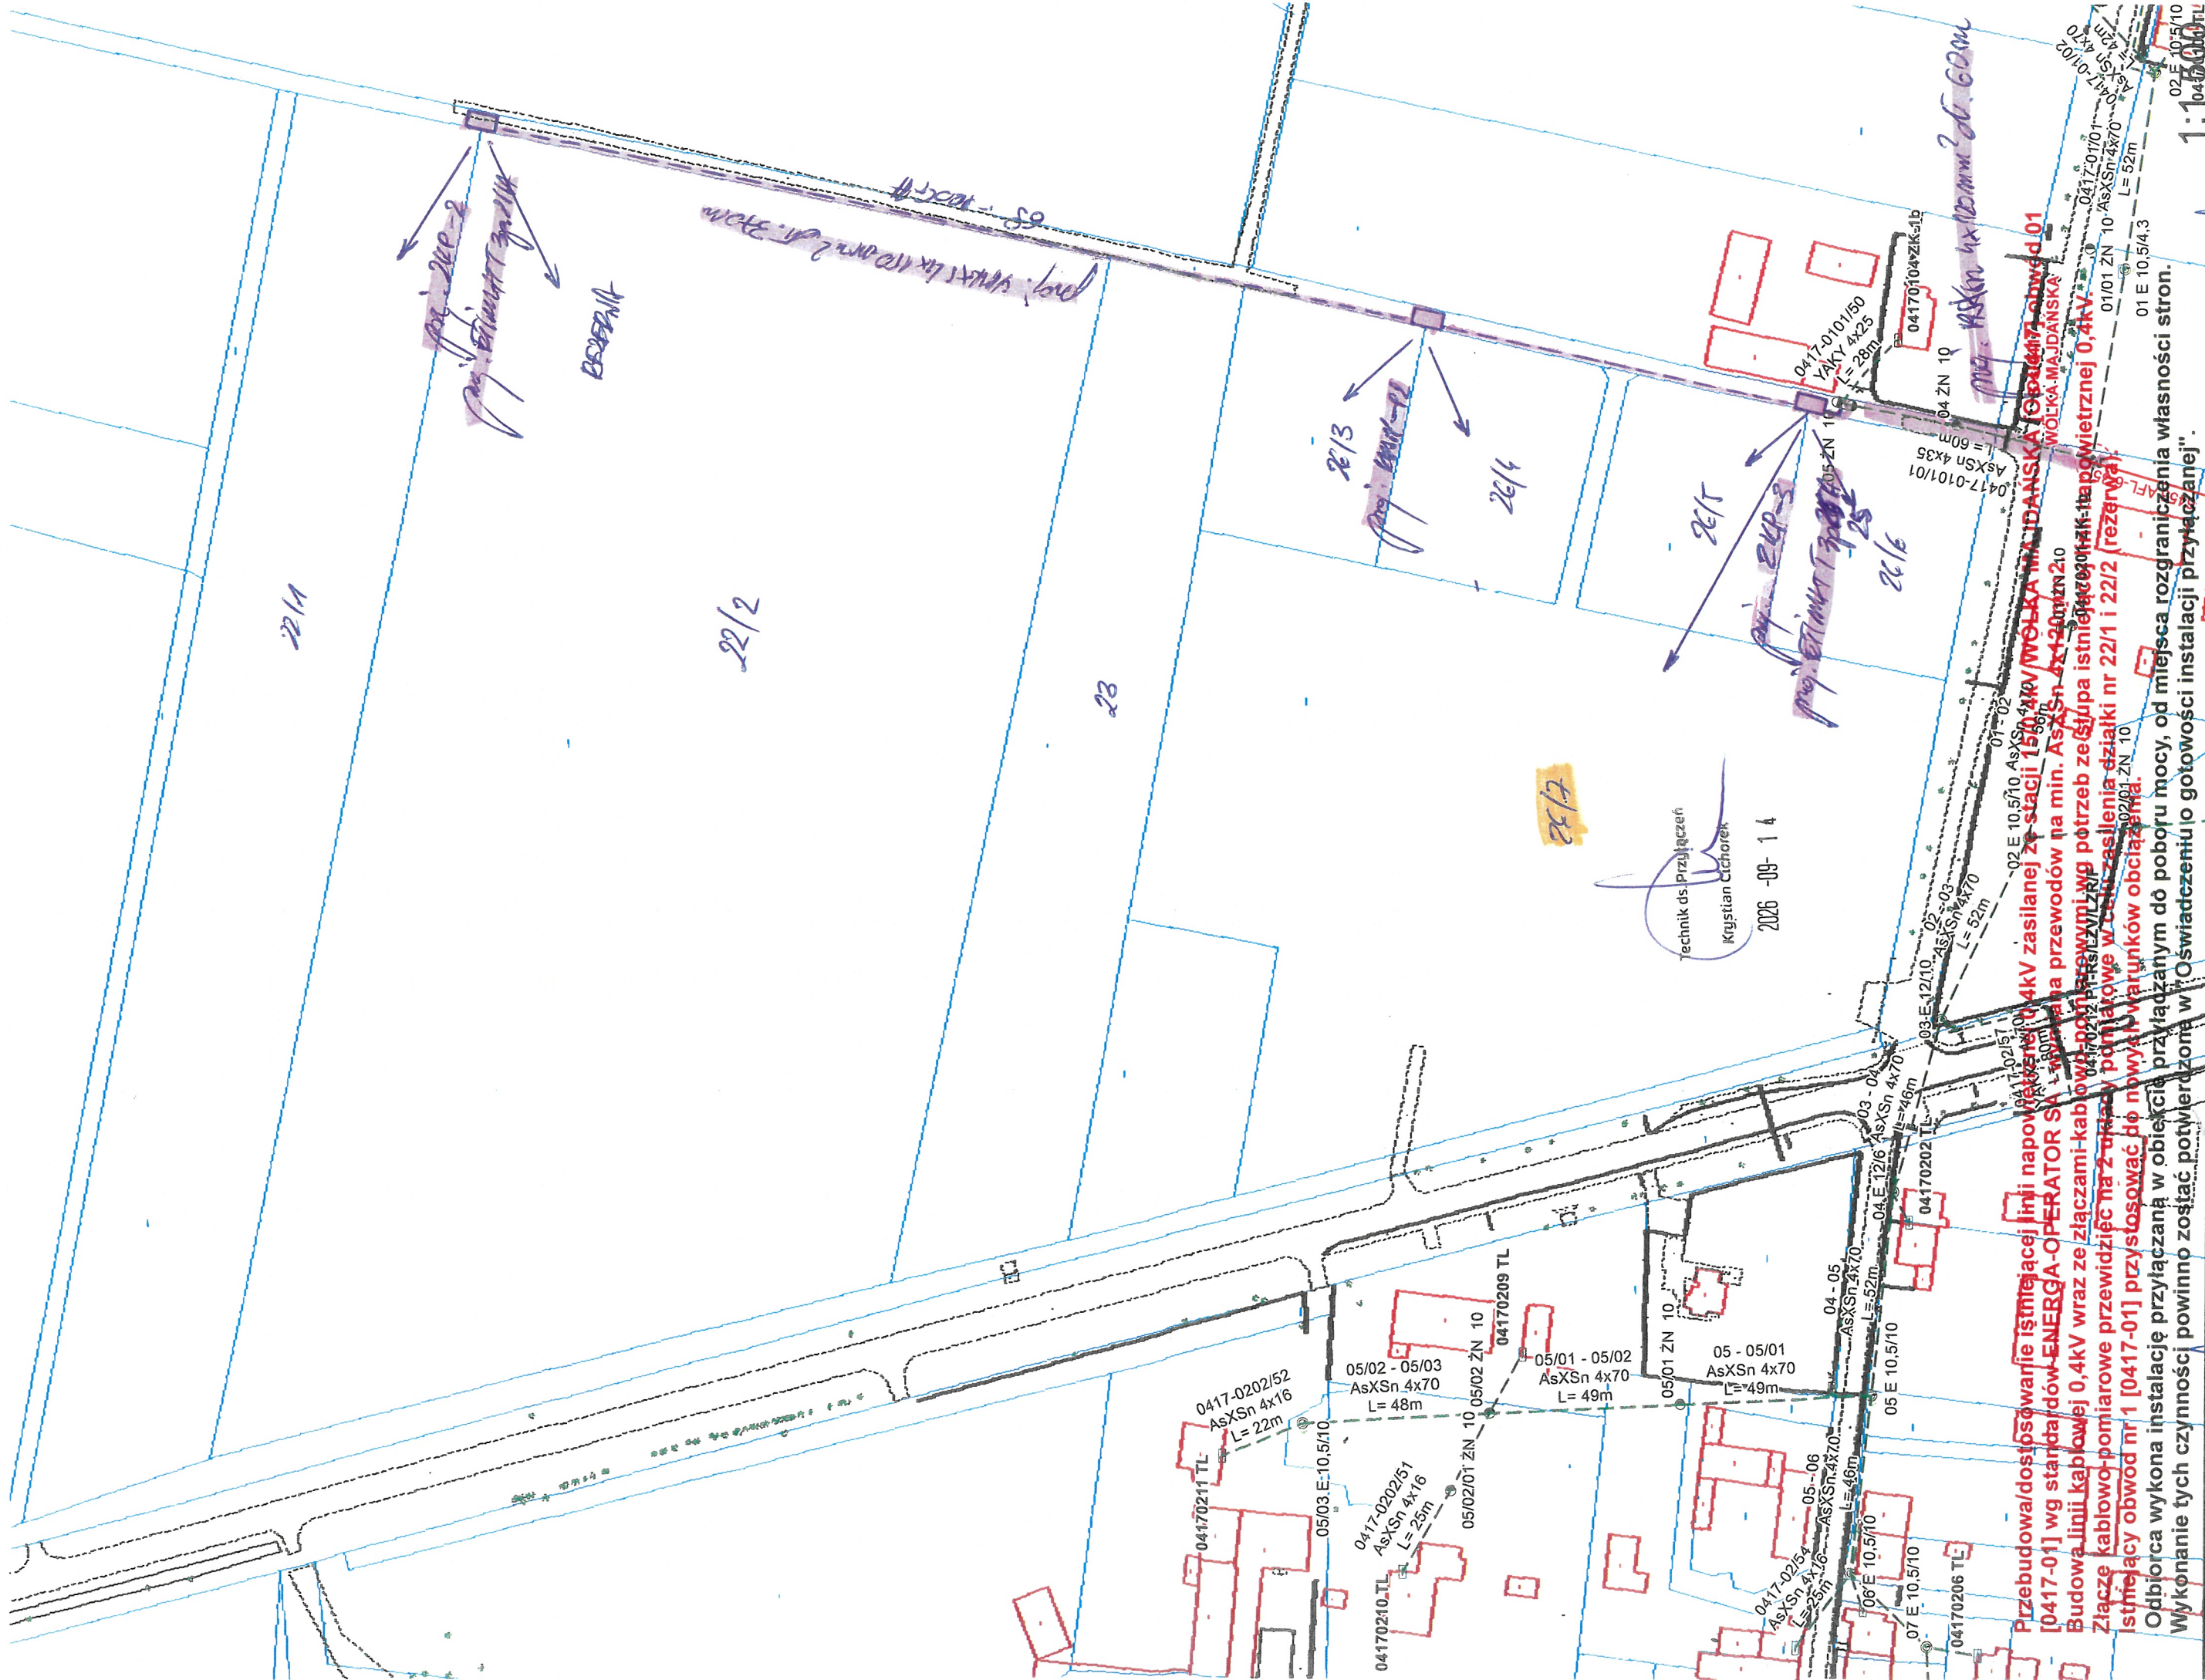

Przebudowa dostrojenie istniejącej linii napowietrznej 0,4kV zasilanej ze stacji 150 kVA WOLKA MAJDAŃSKA (obwód 01 [0417-01] wg standardów ENERGIA-OPERATOR SA) - budowa na przewodach na min. AsXSn 4x120mm² ZN 210 Budowa linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami-kablowo-pomiarowymi wg potrzeb ze stacji istniejącej 0,4kV na powietrznej 0,4kV Złącze kablowo-pomiarowe przewidzieć na 2 okazy pomiarowe w celu zasilenia działki nr 22/1 i 22/2 (rezerwa). Istniejący obwód nr 1 [0417-01] przystosować do nowych warunków obciążenia.

Odbiorca wykona instalację przyłączaną w obiekcie przyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności stron. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".

126/021062
ZASILANIE DOCELOWE - GR. V
MOC 6 kW ETIMAT T 3p. 104

Os-0417 WÓLKA MAJDAŃSKA obw. nr 1 k-k WINIEC
TR-100kVA, SZ-51 zab. gG/3x80A,
przewód AsXSn 4x35mm² dt. 60m

Technik ds. Przyłączeń
Krzysztof Cichorek
2025 -10-14

Technik ds. Przyłączeń
Krzysztof Cichorek
2026 -05-20
