Wstępny harmonogram branżowy remontu Reforming V - wymurówki ogniotrwałe

Id.	Lp.	Tryb zadan	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1			POSTÓJ REMONTOWY INSTALACJI	38 dn	pią, 27-04-09	nie, 27-05-16
2			PRACE REMONTOWE	32 dn	pon, 27-04-12	czw, 27-05-13
3	1		**ORGANIZACJA ZAPLECZA BUDOWY**	3 dn	pią, 27-04-09	nie, 27-04-11
4	2		**Zakres 1_RFV**	**20 dn**	**śro, 27-04-14**	**pon, 27-05-03**
5	2.1		**PIEC 20H1**			
6	2.1.1		Przegląd stanu wymurówek	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14
7	2.1.2		Naprawa ścian i stropu radiacji piec	2 dn	śro, 27-04-14	czw, 27-04-15
8	2.1.3		Uzupełnienie dylatacji poziomych	1 dzień	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16
9	2.1.4		Ręczne czyszczenie rur z osadów technologicznych	3 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18
10	2.1.5		Demontaż podłogi pieca	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21
11	2.1.6		Montaż podłogi pieca	3 dn	śro, 27-04-28	pią, 27-04-30
12	2.1.7		Naprawa gniazd palnikowych i prace porządowe	1 dzień	pią, 27-04-30	pią, 27-04-30
13	2.2		**PIEC 20H2**			
14	2.2.1		Przegląd stanu wymurówek	1 dzień	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15
15	2.2.2		Naprawa ścian i stropu radiacji piec	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16
16	2.2.3		Uzupełnienie dylatacji poziomych	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17
17	2.2.4		Ręczne czyszczenie rur z osadów technologicznych	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18
18	2.2.5		Demontaż podłogi pieca	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22
19	2.2.6		Montaż podłogi pieca	3 dn	czw, 27-04-29	sob, 27-05-01
20	2.2.7		Naprawa gniazd palnikowych i prace porządowe	1 dzień	sob, 27-05-01	sob, 27-05-01
21	2.3		**PIEC 30H5**			
22	2.3.1		Przegląd stanu wymurówek	1 dzień	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16
23	2.3.2		Naprawa ścian i stropu radiacji piec	2 dn	pią, 27-04-16	sob, 27-04-17
24	2.3.3		Uzupełnienie dylatacji poziomych	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18
25	2.3.4		Ręczne czyszczenie rur z osadów technologicznych	3 dn	nie, 27-04-18	wto, 27-04-20
26	2.3.5		Demontaż podłogi pieca	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23
27	2.3.6		Montaż podłogi pieca	3 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02
28	2.3.7		Naprawa gniazd palnikowych i prace porządowe	1 dzień	nie, 27-05-02	nie, 27-05-02
29	2.4		**PIEC 40H1**			
30	2.4.1		Przegląd stanu wymurówek	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17
31	2.4.2		Naprawa ścian i stropu radiacji piec	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18
32	2.4.3		Uzupełnienie dylatacji poziomych	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19
33	2.4.4		Ręczne czyszczenie rur z osadów technologicznych	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21
34	2.4.5		Demontaż podłogi pieca	2 dn	pią, 27-04-23	sob, 27-04-24
35	2.4.6		Montaż podłogi pieca	3 dn	sob, 27-05-01	pon, 27-05-03
36	2.4.7		Naprawa gniazd palnikowych i prace porządowe	1 dzień	pon, 27-05-03	pon, 27-05-03
37	2.5		**KONWEKCJE I KANAŁY**			
38	2.5.1		Przegląd i naprawa wymurówek	9 dn	śro, 27-04-14	czw, 27-04-22
39	3		**Zakres 2_RFV**	**19 dn?**	**śro, 27-04-21**	**nie, 27-05-09**
40	3.1		**PIECE 30H1,30H2,30H3,30H4**			
41	3.1.1		Naprawa ścian radiacji i konwekcji pieców	3 dn	śro, 27-04-21	pią, 27-04-23
42	3.1.2		Uzupełnienie dylatacji poziomych	1 dzień	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24
43	3.1.3		Ręczne czyszczenie rur z osadów technologicznych	7 dn?	czw, 27-04-22	śro, 27-04-28
44	3.1.4		Demontaż warstwy odogniowej podłogi	5 dn	wto, 27-04-27	sob, 27-05-01
45	3.1.5		Wykucie i uzupełnienie uszkodzonych warstw izolacyjnych	2 dn	nie, 27-05-02	pon, 27-05-03
46	3.1.6		Montaż warstwy odogniowej podło	5 dn	wto, 27-05-04	sob, 27-05-08
47	3.1.6		Naprawa gniazd palnikowych i prace porządowe	1 dzień	nie, 27-05-09	nie, 27-05-09
48	3.2		**KONWEKCJE I KANAŁY**			
49	3.2.1		Przegląd i naprawa wymurówek	3 dn	śro, 27-04-21	pią, 27-04-23

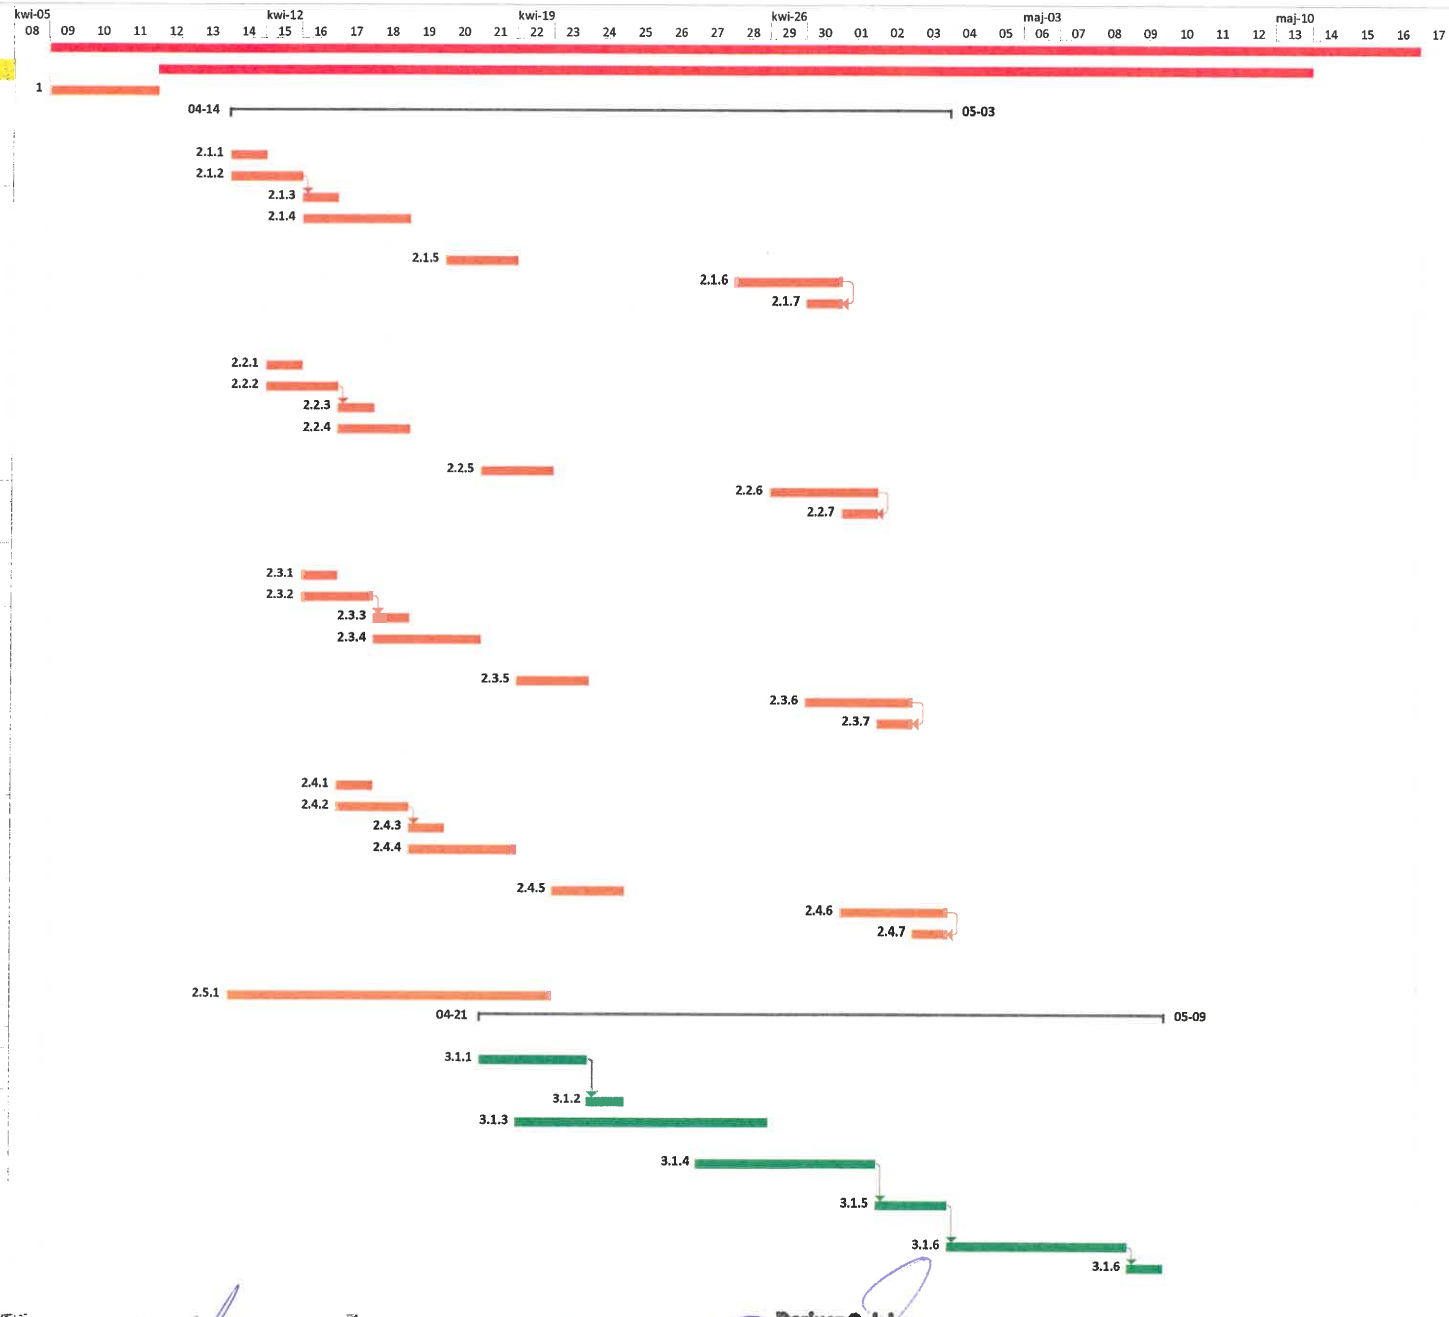

Specjalista
Zespół ds. Remontów Budowlanych
Krystian Kierzkowski

SPRAWDZAŁ

ZATWIERDZIŁ

Dariusz Solak
Kierownik
Zespół ds. Remontów Budowlanych
