Wstępny harmonogram branżowy remontu PTA - chłodnia wentylatorowa

Id.	Lp.	Tryb zadań	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1			POSTÓJ REMONTOWY INSTALACJI	36 dn	pią, 27-04-02	nie, 27-05-09
2			PRACE REMONTOWE	26 dn	śro, 27-04-07	nie, 27-05-02
3	1		**ORGANIZACJA ZAPLECZA BUDOWY**	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08
4	2		**Zakres 1**	**19 dn**	**pią, 27-04-09**	**wto, 27-04-27**
5	2.1		**Chłodnia wetylatorowe - celki E, F**			
6	2.1.1		Przygotowanie powierzchni żelbetowych do napraw (czyszczenie hydrodynamiczne)	2 dn	pią, 27-04-09	sob, 27-04-10
7	2.1.2		Naprawa powierzchni betonu	2 dn	nie, 27-04-11	pon, 27-04-12
8	2.1.3		Iniektowanie rys	5 dn	nie, 27-04-11	czw, 27-04-15
9	2.1.4		Gruntowanie i malowanie	7 dn	pią, 27-04-16	czw, 27-04-22
10	2.1.5		Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej dna bas	4 dn	pią, 27-04-23	pon, 27-04-26
11	2.1.6		Porządki w miejscach pracy i polach odkładczych	1 dzień	wto, 27-04-27	wto, 27-04-27

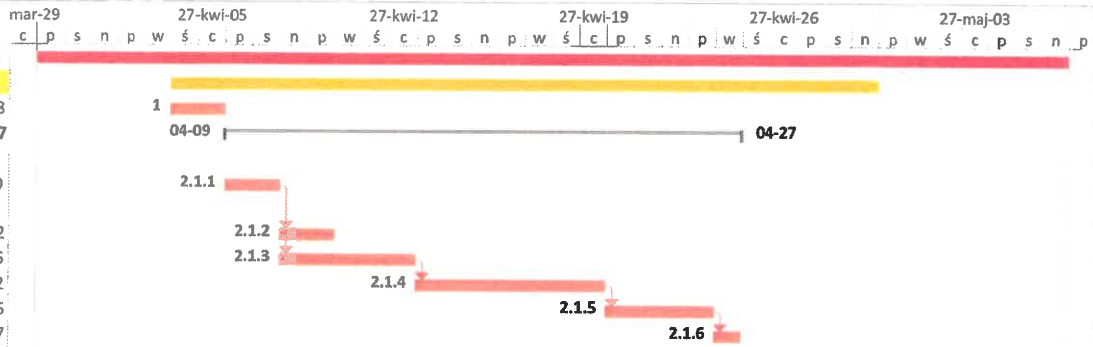

Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu Kompleksu
Kwasu Tereftalowego
Patryk Piasecki

Starszy Specjalista
Zespół ds. Remontów Budowlanych
Piotr Niesłobędzki

OPRACOWAŁ

ZATWIERDZIŁ

Dariusz Solak
Kierownik
Zespół ds. Remontów Budowlanych
