Wstępny harmonogram branżowy remontu instalacji Claus VII - wymurówki ogniotrwałe

Id.	Lp.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1		POSTÓJ REMONTOWY INSTALACJI	30 dn	śro, 27-09-01	czw, 27-09-30
2		PRACE REMONTOWE	19 dn	wto, 27-09-07	sob, 27-09-25
3	**1**	**ORGANIZACJA ZAPLECZA BUDOWY**	3 dn	śro, 27-09-01	pią, 27-09-03
4	**2**	**Zakres 1_CLA VII**	**17 dn**	**wto, 27-09-07**	**czw, 27-09-23**
5	**2.1**	**Kocioł 27H2**			
6	2.1.1	Demontaż włazów	1 dzień	wto, 27-09-07	wto, 27-09-07
7	2.1.2	Przegląd wymurówek	1 dzień	śro, 27-09-08	śro, 27-09-08
8	2.1.3	Naprawa wymurówki cz. cylindrycznej	6 dn	śro, 27-09-08	pon, 27-09-13
9	2.1.4	Wykucie wymurówki ściany sitowej	2 dn	śro, 27-09-08	czw, 27-09-09
10	2.1.5	Usunięcie pozostałych tulejek ceramicznych w rurkach	1 dzień	pią, 27-09-10	pią, 27-09-10
11	2.1.6	Czyszczenie strumieniowo-ścierne ściany sitowej	2 dn	sob, 27-09-11	nie, 27-09-12
12	2.1.7	Czyszczenie sprężonym powietrzem rur	1 dzień	pon, 27-09-13	pon, 27-09-13
13	2.1.8	Montaż i sezonowanie wymurówki ściany sitowej	4 dn	nie, 27-09-19	śro, 27-09-22
14	2.1.9	Uzupełnienia/wymiany dylatacji	1 dzień	śro, 27-09-22	śro, 27-09-22
15	2.1.1(	Montaż włazów	1 dzień	czw, 27-09-23	czw, 27-09-23
16	2.1.1:	Naprawy wymurówki zaworu trójdrożnego	4 dn	śro, 27-09-15	sob, 27-09-18
17	2.1.1:	Naprawy wymurówki rurociągu 500-GPC-802	4 dn	śro, 27-09-15	sob, 27-09-18
18	**3**	**Zakres 2_CLA VII**	**5 dn**	**pon, 27-09-13**	**pią, 27-09-17**
19	3.1	**Reaktory 27R1, R2, R3**			
20	3.1.1	Przegląd wymurówki	1 dzień	pon, 27-09-13	pon, 27-09-13
21	3.1.2	Naprawa wymurówki	4 dn	wto, 27-09-14	pią, 27-09-17

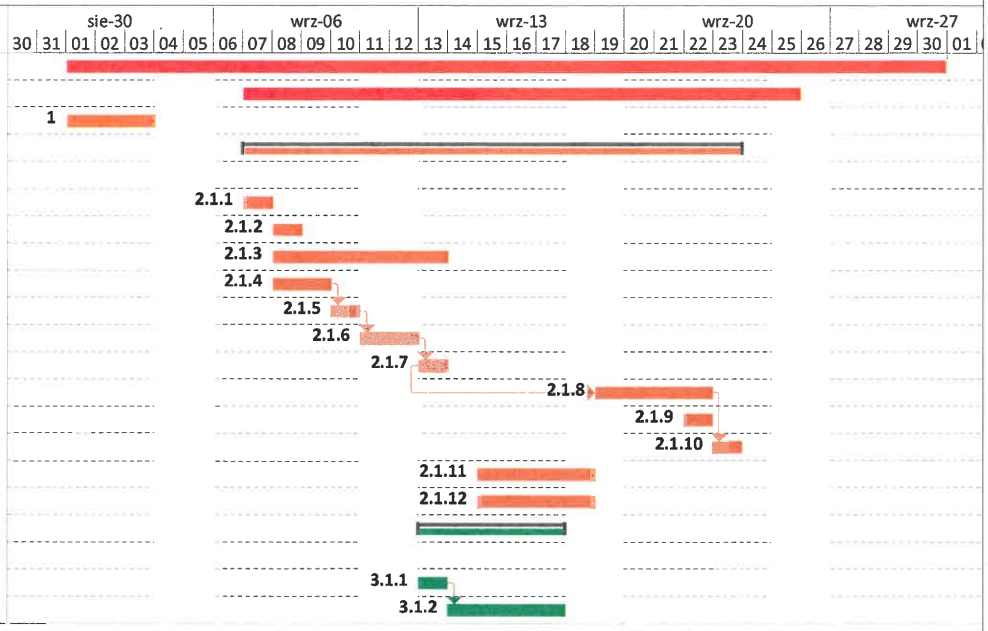

Michał Kołczyński

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół ds. Remontów Budowlanych

OPRACOWAŁ

Dariusz Sołak

Kierownik
Zespół ds. Remontów Budowlanych

ZATWIERDZIŁ
