Wstępny harmonogram branżowy POSTOJU TECHNOLOGICZNEGO na instalacji ALKILACJA wymurówki ogniotrwałe - 2027r

Id.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1	**WYPAD PRODUKCYJNY**	29 dn	śro, 27-09-15	czw, 27-10-14
2	**POSTÓJ TECHNOLOGICZNY**	15 dn	pią, 27-09-24	pią, 27-10-08
3	**Zakres rzeczowy „B" nr 04T/2026 na remont wyłożenia ogniotrwałego pieca 19-H-3**	**7 dn**	śro, 27-09-29	wto, 27-10-05
4	Naprawa wyłożenia ogniotrwałego wewnątrz pieca - ok. 3,0 m2.	4 dn	czw, 27-09-30	pon, 27-10-04
5	Uzupełnienie ubytków dylatacji ok. 10,0 mb.	1 dzień	pon, 27-10-04	pon, 27-10-04
6	Naprawa gniazda palnikowego – 1 szt	1 dzień	wto, 27-10-05	wto, 27-10-05
7	Miejscowa naprawa gniazda palnikowego- szpachlowanie połączeń kształtek masą szpachlową – 3 szt	1 dzień	wto, 27-10-05	wto, 27-10-05
8	Usunięcie zanieczyszczeń po remoncie z posadzki pieca i gniazd palnikowych, odpylenie pieca - kpl	1 dzień	wto, 27-10-05	wto, 27-10-05
9	Przegląd i ocena stanu wymurówki żaroodpornej części wewnętrznej komina i kanału spalin przy pomocy kamery video. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. - kpl	4 dn	pią, 27-10-01	pon, 27-10-04
10	Uzupełnienie ubytków wymurówki ok. 3 m2 (komin stalowy wyłożony wewnątrz wymurówką żaroodporną o grubości 75mm, wysokość h- 82m, średnica 1220mm).	1 dzień	pon, 27-10-04	pon, 27-10-04
11	Uzupełnienie sznurem uszczelniającym połączenia kanału spalin z piecem – kpl	1 dzień	pon, 27-10-04	pon, 27-10-04

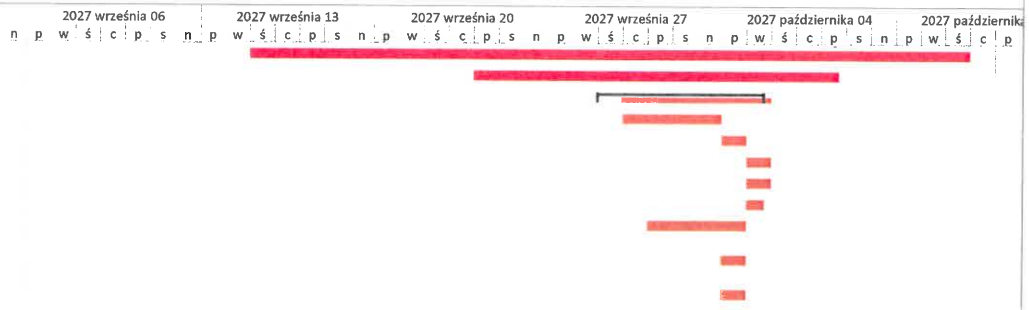

Starszy Specjalista
Zespół ds. Remontów Budowlanych
Damian Józwiak

Dariusz Solak
Kierownik
Zespół ds. Remontów Budowlanych

OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ
