
Harmonogram miesięczny postoju remontowego sekcji 400/500 Paraksylenu (02.04. - 12.05.2027r)

Id.	Tryb zadania	Branża	Nr zakresu	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Nazwy zasobów
1		**M,A,E,W**		**Wypad remontowy**	41 dn?	pią, 27-04-09	śro, 27-05-19		
2		**M,A,E,W**		**Remont planowy**	24 dn?	pią, 27-04-16	nie, 27-05-09		
3		**M**	**1**	**Przygotowanie instalacji do postoju remontowego i ponownego uruchomienia**	**41 dn?**	**pią, 27-04-09**	**śro, 27-05-19**		
4		M		Montaż zaślepek stałych	7 dn?	pią, 27-04-09	czw, 27-04-15		
5		**M**		**Kompleksowa próba szczelności, usuwanie nieszczelności**	3 dn	**pią, 27-05-07**	**nie, 27-05-09**	7;8;9;10;11;12;1	
6		M		Demontaż zaślepek stałych	10 dn?	pon, 27-05-10	śro, 27-05-19	5	
7		**M**	**2**	**Wymiennik 4-E6**	**8 dn?**	**nie, 27-04-18**	**nie, 27-04-25**		
8		**M**		Montaż zaślepek	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18		
9		**M**		Demontaż komór aparatu i wkładu	1 dzień?	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	8	
10		**M**	36	Czyszczenie hydrodynamiczne	1 dzień?	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	9	
11		**M**		Przygotowanie do rewizji UDT	1 dzień?	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21	10	
12		**M**		Rewizja UDT	1 dzień?	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	11	
13		**M**		Montaż wkładu i komór aparatu	1 dzień?	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23	12	
14		**M**		Próba ciśnieniowa dla UDT	1 dzień?	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24	13	
15		**M**		Demontaż zaślepek	1 dzień?	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	14	
16		**M**	**3**	**Wymiennik 4-E10**	**8 dn?**	**nie, 27-04-18**	**nie, 27-04-25**		
17		**M**		Montaż zaślepek	1 dzień?	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18		
18		**M**		Demontaż komór aparatu i wkładu	1 dzień?	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	17	
19		**M**	36	Czyszczenie hydrodynamiczne	1 dzień?	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	18	
20		**M**		Przygotowanie do rewizji UDT	1 dzień?	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21	19	
21		**M**		Rewizja UDT	1 dzień?	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22	20	
22		**M**		Montaż wkładu i komór aparatu	1 dzień?	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23	21	
23		**M**		Próba ciśnieniowa dla UDT	1 dzień?	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24	22	
24		**M**		Demontaż zaślepek	1 dzień?	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25	23	
25		**M**	**7**	**Wymiennik 5-E2**	**15 dn?**	**pią, 27-04-16**	**pią, 27-04-30**		
26		**M**		Montaż zaślepek	1 dzień?	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16		
27		**M**		Demontaż komór aparatu	1 dzień?	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17	26	
28		M		Demontaż wkładu	1 dzień?	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18	27	
29		**M**	36	Czyszczenie hydrodynamiczne	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20	28	
30		**M**		Przygotowanie do rewizji UDT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22	29	
31		**M**		Rewizja UDT	2 dn	pią, 27-04-23	sob, 27-04-24	30	
32		**M**		Montaż wkładu i komór aparatu	2 dn	nie, 27-04-25	pon, 27-04-26	31	
33		**M**		Próba ciśnieniowa dla UDT	2 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28	32	
34		**M**		Demontaż zaślepek	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	33	
35		**M**	**8**	**Wymiennik 5-E3**	**15 dn?**	**pią, 27-04-16**	**pią, 27-04-30**		
36		**M**		Montaż zaślepek	1 dzień?	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16		
37		**M**		Demontaż komór aparatu	1 dzień?	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17	36	
38		**M**		Demontaż wkładu	1 dzień?	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18	37	
39		**M**	36	Czyszczenie hydrodynamiczne	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20	38	
40		**M**		Przygotowanie do rewizji UDT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22	39	
41		**M**		Rewizja UDT	2 dn	pią, 27-04-23	sob, 27-04-24	40	
42		**M**		Montaż wkładu i komór aparatu	2 dn	nie, 27-04-25	pon, 27-04-26	41	
43		**M**		Próba ciśnieniowa dla UDT	2 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28	42	
44		**M**		Demontaż zaślepek	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	43	
45		**M**	**9**	**Chłodnica powietrzna 4-EA1**	**10 dn?**	**pią, 27-04-16**	**nie, 27-04-25**		
46		**M**		Montaż zaślepek	2 dn	pią, 27-04-16	sob, 27-04-17		
47		**M**		Przygotowanie do rewizji UDT	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19	46	
48		**M**		Rewizja UDT - inspekcja wizualna	4 dn	wto, 27-04-20	pią, 27-04-23	47	
49		**M**		Demontaż zaślepek	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25	48	
50		**M**	**10**	**Chłodnica powietrzna 4-EA2**	**10 dn?**	**sob, 27-04-17**	**pon, 27-04-26**		
51		**M**		Montaż zaślepek	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18		
52		**M**		Przygotowanie do rewizji UDT	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20	51	
53		**M**		Rewizja UDT - inspekcja wizualna	4 dn	śro, 27-04-21	sob, 27-04-24	52	
54		**M**		Demontaż zaślepek	2 dn	nie, 27-04-25	pon, 27-04-26	53	
55		**M**	**11**	**Chłodnica powietrzna 5-EA1**	**10 dn?**	**pią, 27-04-16**	**nie, 27-04-25**		
56		**M**		Montaż zaślepek	2 dn	pią, 27-04-16	sob, 27-04-17		
57		**M**		Przygotowanie do rewizji UDT	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19	56	
58		**M**		Rewizja UDT - inspekcja wizualna	4 dn	wto, 27-04-20	pią, 27-04-23	57	
59		**M**		Demontaż zaślepek	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25	58	
60		**M**	**12**	**Chłodnica powietrzna 5-EA2**	**10 dn?**	**sob, 27-04-17**	**pon, 27-04-26**		
61		**M**		Montaż zaślepek	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18		
62		**M**		Przygotowanie do rewizji UDT	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20	61	
63		**M**		Rewizja UDT - inspekcja wizualna	4 dn	śro, 27-04-21	sob, 27-04-24	62	
64		**M**		Demontaż zaślepek	2 dn	nie, 27-04-25	pon, 27-04-26	63	
65		**M**	**13**	**Usprawnienie żaluzji chłodnicy powietrznej**	**17 dn?**	**pią, 27-04-16**	**nie, 27-05-02**		
66		**M**		Demontaż ram głównych segmentów żaluzji na poziom "0,00"	2 dn	pią, 27-04-16	sob, 27-04-17		
67		**M**		Wymiana uszkodzonych łopat żaluzji-700szt.	10 dn	nie, 27-04-18	wto, 27-04-27	66	
68		**M**		Regeneracja czopów żaluzji-700szt.	10 dn	nie, 27-04-18	wto, 27-04-27	66	
69		**M**		Przegląd i konserwacja mechanizmów sterowa	2 dn	śro, 27-04-28	czw, 27-04-29	67;68	
70		**M**		Ptrzeprowadzenie testów ruchowych żaluzji	1 dzień?	pią, 27-04-30	pią, 27-04-30	69	
71		**M**		Montaż ram głównych segmentów żaluzji	2 dn	sob, 27-05-01	nie, 27-05-02	70	
72		**M**	**14**	**Zbiornik 4-V2**	**17 dn?**	**pią, 27-04-16**	**nie, 27-05-02**		
73		**M**		Montaż zaślepek	2 dn	pią, 27-04-16	sob, 27-04-17		
74		**M**		Demontaż włazu i elementów wewnętrznych (d	3 dn	nie, 27-04-18	wto, 27-04-20	73	
75		**M**		Czyszczenie hydrodynamiczne	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22	74	
76		**M**		Przygotowanie do rewizji UDT	4 dn	pią, 27-04-23	pon, 27-04-26	75	
77		**M**		Rewizja UDT	2 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28	76	
78		**M**		Montaż elementów wewnętrznych i włazu	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30	77	
79		**M**		Demontaż zaślepek	2 dn	sob, 27-05-01	nie, 27-05-02	78	
80		**M**	**20**	**Zbiornik 5-V1**	**16 dn?**	**pią, 27-04-16**	**sob, 27-05-01**		
81		**M**		Montaż zaślepek	2 dn	pią, 27-04-16	sob, 27-04-17		
82		**M**		Demontaż włazu i elementów wewnętrznych	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19	81	
83		**M**	37	Czyszczenie hydrodynamiczne	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21	82	
84		**M**		Przygotowanie do rewizji UDT	4 dn	czw, 27-04-22	nie, 27-04-25	83	
85		**M**		Rewizja UDT	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	84	
86		**M**		Montaż elementów wewnętrznych i włazu	2 dn	śro, 27-04-28	czw, 27-04-29	85	
87		**M**		Demontaż zaślepek	2 dn	pią, 27-04-30	sob, 27-05-01	86	
88		**M**	**21**	**Filtr 4-F2A**	**7 dn?**	**nie, 27-04-18**	**sob, 27-04-24**		
89		**M**		Montaż zaślepek, d-ż pokrywy i kosza	1 dzień?	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18		
90		**M**	37	Czyszczenie hydrodynamiczne	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	89	
91		**M**		Przygotowanie do rewizji UDT	1 dzień?	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	90	
92		**M**		Rewizja UDT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22	91	
93		**M**		Montaż kosza i pokrywy, d-ż zaślepek	2 dn	pią, 27-04-23	sob, 27-04-24	92	
94		**M**	**22**	**Filtr 4-F2B**	**7 dn?**	**nie, 27-04-18**	**sob, 27-04-24**		
95		**M**		Montaż zaślepek, d-ż pokrywy i kosza	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18		
96		**M**	37	Czyszczenie hydrodynamiczne	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	95	
97		**M**		Przygotowanie do rewizji UDT	1 dzień?	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	96	
98		**M**		Rewizja UDT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22	97	
99		**M**		Montaż kosza i pokrywy, d-ż zaślepek	2 dn	pią, 27-04-23	sob, 27-04-24	98	
100		**M**	**23**	**Filtr 4-F4**	**6 dn?**	**pon, 27-04-19**	**sob, 27-04-24**		
101		**M**		Montaż zaślepek, d-ż pokrywy i kosza	1 dzień?	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19		
102		**M**	37	Czyszczenie hydrodynamiczne	1 dzień?	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	101	
103		**M**		Przygotowanie do rewizji UDT	1 dzień?	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21	102	
104		**M**		Rewizja UDT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	103	
105		**M**		Montaż kosza i pokrywy, d-ż zaślepek	1 dzień?	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24	104	
106		**M**	**24**	**Filtr 4-F5**	**8 dn?**	**nie, 27-04-18**	**nie, 27-04-25**		
107		**M**		Montaż zaślepek, d-ż pokrywy i wkładów filtra	1 dzień?	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18		
108		**M**	37	Czyszczenie hydrodynamiczne	1 dzień?	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	107	
109		**M**		Przygotowanie do rewizji UDT	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21	108	
110		**M**		Rewizja UDT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23	109	
111		**M**		Montaż wkładów i pokrywy, d-ż zaślepek	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25	110	
112		**M**	**25**	**Filtry pomp procesowych**	**19 dn?**	**pią, 27-04-16**	**wto, 27-05-04**		

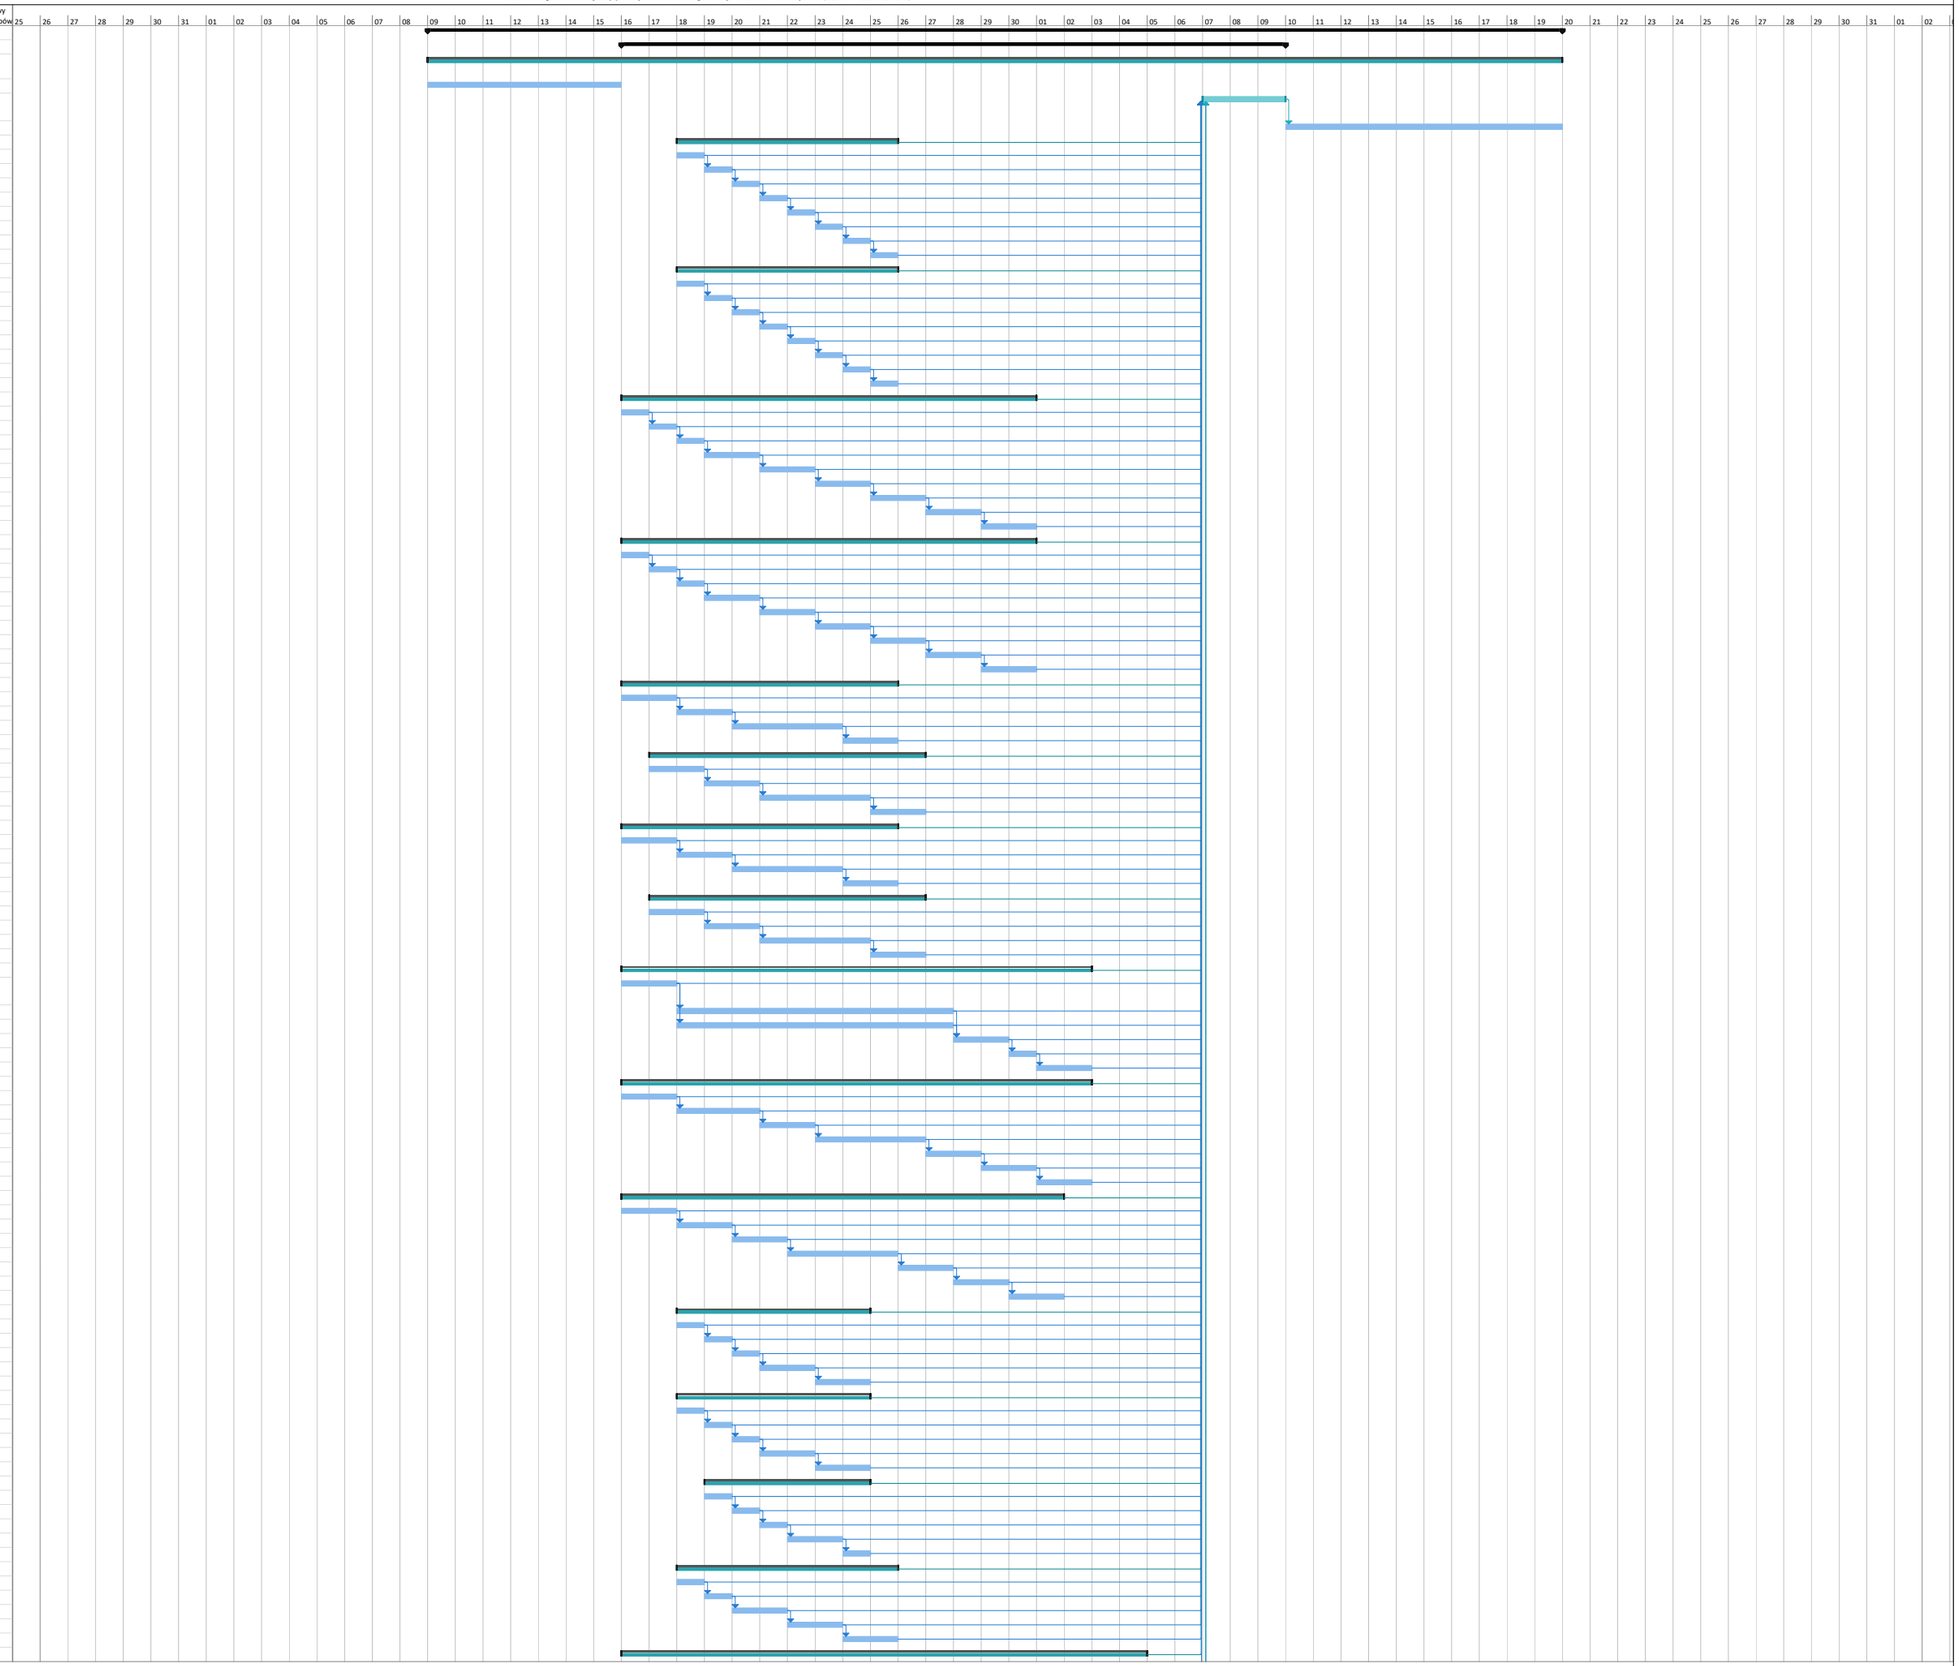


Zadanie · Punkt kontrolny · Podsumowanie projektu · Zewnętrzne punkty kontrolne · Nieaktywny punkt kontrolny · Zadanie ręczne · Rzutowanie podsumowania ręcznego · Tylko z rozpoczęciem · Termin ostateczny · Ręczne (postęp)

Podział · Podsumowanie · Zadania zewnętrzne · Zadanie nieaktywne · Podsumowanie nieaktywne · Tylko z czasem trwania · Podsumowanie ręczne · Tylko z zakończeniem · Postęp

Harmonogram miesięczny postoju remontowego sekcji 400/500 Paraksylenu (02.04. - 12.05.2027r)

Id.	Tryb zadania	Branża	Nr zakresu	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Nazwy zasobów
113		M	29	Montaż zaślepek, d-ż pokryw filtrów	10 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-25		
114		M		Demontaż wkładów i koszy	10 dn	nie, 27-04-18	wto, 27-04-27	113RR+2 dn	
115		M		Czyszczenie, przegląd i naprawa	12 dn	pon, 27-04-19	pią, 27-04-30	114RR+1 dzień	
116		M		Montaż wkładów i koszy	12 dn	śro, 27-04-21	nie, 27-05-02	115RR+2 dn	
117		M		Montaż pokryw filtrów, d-ż zaślepek	12 dn	pią, 27-04-23	wto, 27-05-04	116RR+2 dn	
118		M	26	**Piec 4-H1**	**20 dn?**	**pią, 27-04-16**	**śro, 27-05-05**		
119		M		Montaż zaślepek na połączeniach kołnierzowyc	1 dzień?	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16		
120		M		Demontaż pokryw włazów	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17	119	
121		M		Montaż rusztowań wewnątrz pieca	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18	120RR	
122		M		Przegląd zawiesi	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	121	
123		M		Prace mechaniczne, w tym przygotowanie do rewizji wewnętrznej UDT	1 dzień	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26	464	
124		M		Rewizja UDT	1 dzień	wto, 27-04-27	wto, 27-04-27	123	
125		M		Demontaż rusztowań wewnątrz pieca	2 dn	śro, 27-04-28	czw, 27-04-29	124;464	
126		M		Przegląd i udrożnienie króćców wlotu pary gaśn	2 dn	pią, 27-04-30	sob, 27-05-01	125	
127		M		Przegląd palników gazowych	2 dn	nie, 27-05-02	pon, 27-05-03	125;466	
128		M		Wymiana termopary wężownicy pieca - próba dla UDT	3 dn	pią, 27-04-30	nie, 27-05-02	125	
129		M		Odkurzanie podłogi w piecu	1 dzień	wto, 27-05-04	wto, 27-05-04	128;466;127	
130		M		Montaż pokryw włazów	1 dzień?	wto, 27-05-04	wto, 27-05-04	129RR	
131		M		Demontaż pokryw bocznych skrzyni konwekcyjn	4 dn	wto, 27-04-20	pią, 27-04-23		
132		M		Montaż pokryw bocznych skrzyni konwekcyjnej-26szt.	5 dn	czw, 27-04-29	pon, 27-05-03	131ZR+5 dn	
133		M		Demontaż i montaż przeciwkołnierzy na kolektorach wlot/wylot z wężownic pieca.	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25		
134		M		Sprawdzenie klap kominowych, smarowanie łożysk ślizgowych	3 dn	sob, 27-04-24	pon, 27-04-26		
135		M		Demontaż zaślepek na połączeniach kołnierzov	1 dzień?	śro, 27-05-05	śro, 27-05-05	130;132;133;134	
136		M	27	**Piec 5-H1**	**21 dn?**	**pią, 27-04-16**	**czw, 27-05-06**		
137		M		Montaż zaślepek na połączeniach kołnierzowyc	1 dzień?	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16		
138		M		Demontaż pokrywy włazu	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17	137	
139		M		Montaż rusztowań wewnątrz pieca	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18	138RR	
140		M		Przegląd zawiesi	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	139	
141		M		Prace mechaniczne, w tym przygotowanie do rewizji wewnętrznej UDT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20	140	
142		M		Rewizja UDT	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23	141;146	
143		M		Demontaż rusztowań wewnątrz pieca	2 dn	pią, 27-04-30	sob, 27-05-01	142;472	
144		M		Przegląd i udrożnienie króćców wlotu pary gaśn	2 dn	nie, 27-05-02	pon, 27-05-03	143	
145		M		Przegląd palników gazowych	1 dzień	wto, 27-05-04	wto, 27-05-04	143;474	
146		M		Wymiana termopary wężownicy pieca - próba dla UDT	3 dn	wto, 27-04-20	czw, 27-04-22	141RR	
147		M		Odkurzanie podłogi w piecu	1 dzień	śro, 27-05-05	śro, 27-05-05	146;145	
148		M		Montaż pokrywy włazu	1 dzień?	śro, 27-05-05	śro, 27-05-05	147RR	
149		M		Demontaż pokryw bocznych skrzyni konwekcyjn	4 dn	śro, 27-04-21	sob, 27-04-24		
150		M		Montaż pokryw bocznych skrzyni konwekcyjnej-33szt.	5 dn	pią, 27-04-30	wto, 27-05-04	149ZR+5 dn	
151		M		Sprawdzenie klap kominowych, smarowanie łożysk ślizgowych	3 dn	nie, 27-04-25	wto, 27-04-27		
152		M		Demontaż zaślepek na połączeniach kołnierzov	1 dzień?	czw, 27-05-06	czw, 27-05-06	148;150;151	
153		M	28	**Naprawy rurociągów**	**11 dn**	**nie, 27-04-18**	**śro, 27-04-28**		
154		M		Naprawa rurociągu 6"-HPS-906 - SUR	9 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-26		
155		M		Naprawa rurociągu 6"-RF-409013 - UDT	3 dn	wto, 27-04-20	czw, 27-04-22		
156		M		Naprawa rurociągu P-407012	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24		
157		M		Naprawa rurociągu P-502043	3 dn	sob, 27-04-24	pon, 27-04-26		
158		M		Naprawa rurociągu P-503025	3 dn	pon, 27-04-26	śro, 27-04-28		
159		M	29	**Czyszczenie zraszaczy instalacji p.poż**	**13 dn?**	**czw, 27-04-22**	**wto, 27-05-04**		
160		M		Przegląd i czyszczenie instalacji p.poż	8 dn	czw, 27-04-22	czw, 27-04-29		
161		M		Usuwanie i naprawianie nieszczelności na pierścieniach i orurowaniu	7 dn	pią, 27-04-23	czw, 27-04-29		
162		M		Próby funkcjonalne.	4 dn	pią, 27-04-30	pon, 27-05-03	161	
163		M		Czyszczenie filtrów sieci p.poż.przed i po próbach funkcjonalnych.	6 dn	czw, 27-04-29	wto, 27-05-04		
164		M	30	**Armatura PiA**	**20 dn?**	**pią, 27-04-16**	**śro, 27-05-05**		
165		M		Demontaż armatury PIA	7 dn	pią, 27-04-16	czw, 27-04-22		
166		M		Demontaż i montaż zaworów PCV - 4 szt	9 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-05-05	165ZR+4 dn	
167		M	32	**Zawory bezpieczeństwa**	**19 dn?**	**pią, 27-04-16**	**wto, 27-05-04**		
168		M		Demontaż zaworów bezpieczeństwa	12 dn	pią, 27-04-16	wto, 27-04-27		
169		M		Przegląd i regeneracja zaworów PSV	14 dn	nie, 27-04-18	sob, 27-05-01	168RR+2 dn	
170		M		Montaż zaworów bezpieczeństwa	14 dn	śro, 27-04-21	wto, 27-05-04	169RR+3 dn	
171		M	33	**Armatura zaporowa**	**20 dn?**	**pią, 27-04-16**	**śro, 27-05-05**		
172		M		Demontaż armatury	12 dn	pią, 27-04-16	wto, 27-04-27		
173		M		Regeneracja armatury	15 dn	nie, 27-04-18	nie, 27-05-02	172RR+2 dn	
174		M		Montaż armatury	15 dn	śro, 27-04-21	śro, 27-05-05	173RR+3 dn	
175		M	34	**Pompy procesowe - połączenia kołnierzowe**	**8 dn?**	**śro, 27-04-28**	**śro, 27-05-05**		
176		M		4-P1A	1 dzień?	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28		
177		M		4-P1B	1 dzień?	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28	176RR	
178		M		4-P2A	1 dzień?	czw, 27-04-29	czw, 27-04-29	177	
179		M		4-P2B	1 dzień?	czw, 27-04-29	czw, 27-04-29	178RR	
180		M		4-P3A	1 dzień?	czw, 27-04-29	czw, 27-04-29	179RR	
181		M		4-P3B	1 dzień?	czw, 27-04-29	czw, 27-04-29	180RR	
182		M		5-P1A	1 dzień?	pią, 27-04-30	pią, 27-04-30	181	
183		M		5-P1B	1 dzień?	pią, 27-04-30	pią, 27-04-30	182RR	
184		M		5-P2A	1 dzień?	pią, 27-04-30	pią, 27-04-30	183RR	
185		M		5-P2B	1 dzień?	pią, 27-04-30	pią, 27-04-30	184RR	
186		M		5-P3A	1 dzień?	sob, 27-05-01	sob, 27-05-01	185	
187		M		5-P3B	1 dzień?	sob, 27-05-01	sob, 27-05-01	186RR	
188		M		5-P4A	3 dn	pon, 27-05-03	śro, 27-05-05	366	
189		M		5-P4B	3 dn	pon, 27-05-03	śro, 27-05-05	188RR;372	
190		M		5-P5A	2 dn	sob, 27-05-01	nie, 27-05-02	186RR	
191		M		5-P5B	2 dn	sob, 27-05-01	nie, 27-05-02	190RR	
192		M	36	**Czyszczenie wymienników**	**2 dn**	**pon, 27-04-19**	**wto, 27-04-20**		
193		M	37	**Czyszczenie zbiorników, filtrów, chłodniczek i rurociągów**	**3 dn**	**pon, 27-04-19**	**śro, 27-04-21**		
194		M	38	**Izolacja**	**68 dn**	**pią, 27-03-26**	**wto, 27-06-01**		
195		M		Demontaż izolacji	25 dn	pią, 27-03-26	pon, 27-04-26		
196		M		Montaż izolacji	32 dn	śro, 27-04-21	wto, 27-06-01		
197		M	39	**Rusztowania**	**68 dn?**	**pią, 27-03-26**	**wto, 27-06-01**		
198		M		Montaż rusztowań	30 dn	pią, 27-03-26	sob, 27-05-01		
199		M		Demontaż rusztowań	26 dn	wto, 27-04-27	wto, 27-06-01		
200		M	40	**Kanalizacja "I" system i opadowa**	**10 dn?**	**pią, 27-04-23**	**nie, 27-05-02**		
201		M		Czyszczenie i płukanie kanalizacji	4 dn	pią, 27-04-23	pon, 27-04-26		
202		M		Usunięcie osadów, przegląd studni i kratek	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27	201ZR-1 dzień	
203		M		Inspekcja kamerą wizyjna wraz z zapisem danych po czyszczeniu	3 dn	śro, 27-04-28	pią, 27-04-30	202	
204		M		Próba szczelności kanalizacji "i" systemu oraz kanalizacji opadowej	2 dn	sob, 27-05-01	nie, 27-05-02	203	
205		M	31	**Prace dodatkowe**	**17 dn**	**wto, 27-04-20**	**czw, 27-05-06**		
206		M	41	**Nadzór nad pracami remontowymi i harmonog**	**41 dn**	**pią, 27-04-09**	**śro, 27-05-19**		
207		M	42	**Czyszczenie wiązek rurowych chłodnic powietrznych**	**10 dn?**	**pią, 27-04-16**	**nie, 27-04-25**		
208		M		Chłodnica 4-EA1	3 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18		
209		M		Chłodnica 4-EA2	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19	208	
210		M		Chłodnica 5-EA1	3 dn	wto, 27-04-20	czw, 27-04-22	209	
211		M		Chłodnica 5-EA2	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23	210	
212		M		Chłodnica 1-EA1	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25	211	

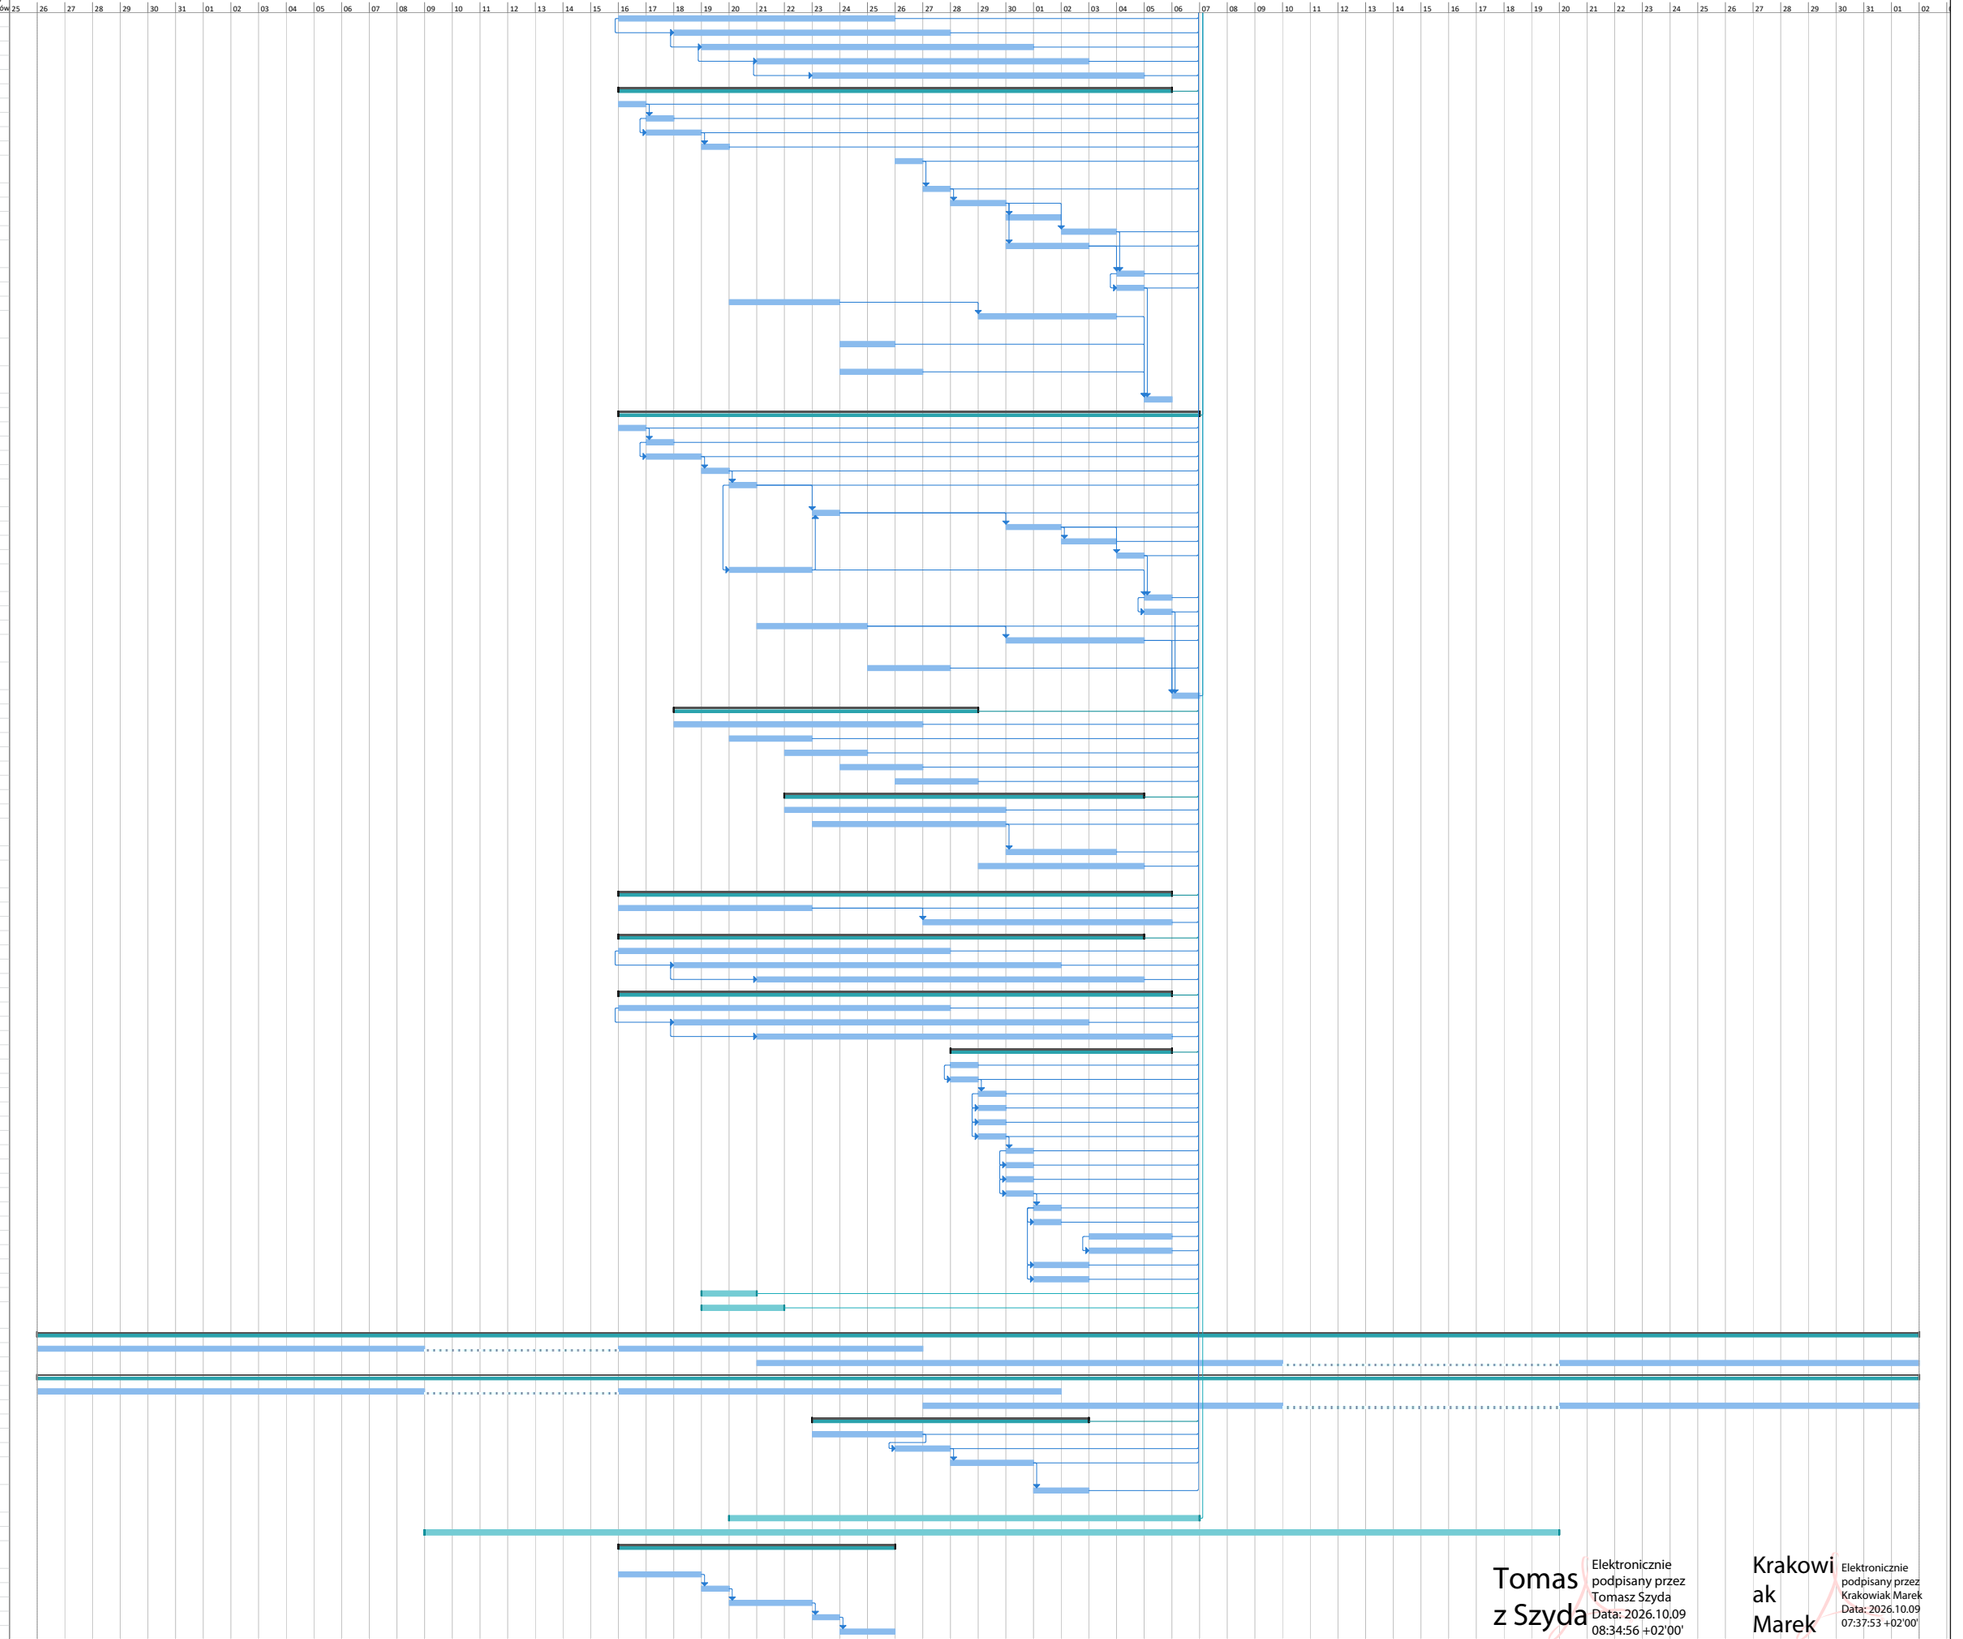

Zadanie
Podział
Punkt kontrolny
Podsumowanie
Podsumowanie projektu
Zadania zewnętrzne
Zewnętrzne punkty kontrolne
Zadanie nieaktywne
Nieaktywny punkt kontrolny
Podsumowanie nieaktywne
Zadanie ręczne
Tylko z czasem trwania
Rzutowanie podsumowania ręcznego
Podsumowanie ręczne
Tylko z rozpoczęciem
Tylko z zakończeniem
Termin ostateczny
Postęp
Ręczne (postęp)

Tomasz Szyda — Elektronicznie podpisany przez Tomasz Szyda Data: 2026.10.09 08:34:56 +02'00'

Krakowiak Marek — Elektronicznie podpisany przez Krakowiak Marek Data: 2026.10.09 07:37:53 +02'00'

Rybacki Mateusz — Elektronicznie podpisany przez Rybacki Mateusz Data: 2026.10.08 13:11:19 +02'00'

Piotr Polek — Elektronicznie podpisany przez Piotr Polek Data: 2026.10.09 07:22:11 +02'00'
