

PREDESTYLACJA PT2027

Id.	SPP	Branża	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1	**1**				**PT instalacji PREDESTYLACJI 2027**	**37 dn?**	**czw, 27-04-01**	**pią, 27-05-14**
2	**1.1**				**ZATRZYMANIE INSTALACJI**	**0 dn**	**pią, 27-04-09**	**pią, 27-04-09**
3	1.1.1		PRODUK	PP11/1	Zatrzymanie instalacji	0 dn	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09
4	**1.2**				**PRZYGOTOWANIE INSTALACJI**	**4 dn**	**pią, 27-04-09**	**śro, 27-04-14**
5	1.2.1		PRODUK	PP11/1	Czynności wskazane przez obszar Produkcji	4 dn	pią, 27-04-09	śro, 27-04-14
6	1.2.2	A	A1	1	Przygotowanie instalacji do postoju (drenaż układów 20 szt.)	4 dn	pią, 27-04-09	śro, 27-04-14
7	1.3	R	R1	21	M-ż rusztowań	6 dn?	czw, 27-04-01	czw, 27-04-08
8	1.4	I	I1	22	D-ż izolacji	6 dn?	czw, 27-04-01	czw, 27-04-08
9	**1.3**				**PRACE REMONTOWE**	**16 dn?**	**czw, 27-04-15**	**pią, 27-04-30**
10	**1.3.1**				**BRANŻA MECHANICZNA**	**16 dn?**	**czw, 27-04-15**	**pią, 27-04-30**
11	**1.3.1.1**	**M**	**M1**	**2**	**Kolumna etylobenzenowa C-503**	**15 dn?**	**czw, 27-04-15**	**czw, 27-04-29**
12	1.3.1.1.1	M	M1	2	M-ż zaślepek	1 dzień?	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15
13	1.3.1.1.2	M	M1	2	D-ż włazów (I otwarcia)	1 dzień?	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16
14	1.3.1.1.3	R	R1	21	Wykonanie studni (110 półek - 220 szt. włazów)	4 dn	sob, 27-04-17	wto, 27-04-20
15	1.3.1.1.4	M	M1	2	M-ż rusztowania	1 dzień?	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17
16	1.3.1.1.5	M	M1	2	Czyszczenie mechaniczne półek i przelewów	1 dzień?	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21
17	1.3.1.1.6	M	M1	2	Rewizja UDT	1 dzień?	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22
18	1.3.1.1.8	M	M1	2	Zamykanie studni (220 szt. włazów)	4 dn	pią, 27-04-23	pon, 27-04-26
19	1.5.1.1.8	R	R1	21	D-ż rusztowania	1 dzień?	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24
20	1.3.1.1.9	M	M1	2	M-ż włazów	1 dzień?	wto, 27-04-27	wto, 27-04-27
21	1.3.1.1.10	M	M1	2	Próba ciśnieniowa UDT	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28
22	1.3.1.1.11				D-ż zaślepek	1 dzień?	czw, 27-04-29	czw, 27-04-29
23	**1.3.1.2**	**M**	**M1**	**3**	**Kolumna etylobenzenowa C-504**	**15 dn?**	**czw, 27-04-15**	**czw, 27-04-29**
24	1.3.1.2.1	M	M1	3	M-ż zaślepek	1 dzień?	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15
25	1.3.1.2.2	M	M1	3	D-ż włazów (I otwarcia)	1 dzień?	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16
26	1.3.1.2.3	M	M1	3	Wykonanie studni (120 półek - 240 szt. włazów)	4 dn	sob, 27-04-17	wto, 27-04-20
27	1.3.1.2.4	R	R1	21	M-ż rusztowania	1 dzień?	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17
28	1.3.1.2.5	M	M1	3	Czyszczenie mechaniczne półek i przelewów	1 dzień?	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21
29	1.3.1.2.6	M	M1	3	Rewizja UDT	1 dzień?	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22
30	1.3.1.2.7	M	M1	3	Zamykanie studni (240 szt. włazów)	4 dn	pią, 27-04-23	pon, 27-04-26
31	1.3.1.2.8	R	R1	21	D-ż rusztowania	1 dzień?	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24
32	1.3.1.2.9	M	M1	3	M-ż włazów	1 dzień?	wto, 27-04-27	wto, 27-04-27
33	1.3.1.2.10	M	M1	3	Próba ciśnieniowa UDT	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28
34	1.3.1.2.11	M	M1	3	D-ż zaślepek	1 dzień?	czw, 27-04-29	czw, 27-04-29
35	**1.3.1.3**	**M**	**M1**	**4**	**Kolumna etylobenzenowa C-505**	**15 dn?**	**czw, 27-04-15**	**czw, 27-04-29**
36	1.3.1.3.1	M	M1	4	M-ż zaślepek	1 dzień?	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15
37	1.3.1.3.2	M	M1	4	D-ż włazów (I otwarcia)	1 dzień?	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16
38	1.3.1.3.3	M	M1	4	Wykonanie studni (120 półek - 240 szt. włazów)	4 dn	sob, 27-04-17	wto, 27-04-20
39	1.3.1.3.4	R	R1	21	M-ż rusztowania	1 dzień?	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17
40	1.3.1.3.5	M	M1	4	Czyszczenie mechaniczne półek i przelewów	1 dzień?	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21
41	1.3.1.3.6	M	M1	4	Rewizja UDT	1 dzień?	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22
42	1.3.1.3.7	M	M1	4	Zamykanie studni (240 szt. włazów)	4 dn	pią, 27-04-23	pon, 27-04-26
43	1.3.1.3.8	R	R1	21	D-ż rusztowania	1 dzień?	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24
44	1.3.1.3.9	M	M1	4	M-ż włazów	1 dzień?	wto, 27-04-27	wto, 27-04-27
45	1.3.1.3.10	M	M1	4	Próba ciśnieniowa UDT	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28
46	1.3.1.3.11	M	M1	4	D-ż zaślepek	1 dzień?	czw, 27-04-29	czw, 27-04-29
47	**1.3.1.4**	**M**	**M1**	**5**	**Wymiennik ciepła CH-3**	**10 dn?**	**czw, 27-04-15**	**sob, 27-04-24**
48	1.3.1.4.1	M	M1	5	M-ż zaślepek	1 dzień?	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15
49	1.3.1.4.2	M	M1	5	D-ż aparatu	1 dzień?	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16
50	1.3.1.4.3	C	C1	23	Mycie aparatu (na placu czyszczeniowym)	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18
51	1.3.1.4.4	M	M1	5	Rewizja UDT	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20
52	1.3.1.4.5	M	M1	5	M-ż aparatu	1 dzień?	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21
53	1.3.1.4.6	M	M1	5	Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23
54	1.3.1.4.7	M	M1	5	D-ż zaślepek	1 dzień?	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24
55	**1.3.1.5**	**M**	**M1**	**6**	**Chłodnica powietrzna E-508**	**10 dn?**	**czw, 27-04-15**	**sob, 27-04-24**
56	1.3.1.5.1	M	M1	6	M-ż zaślepek	1 dzień?	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15
57	1.3.1.5.2	M	M1	6	D-ż aparatu	1 dzień?	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16
58	1.3.1.5.3	C	C1	23	Przygotowanie do rewizji	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18
59	1.3.1.5.4	M	M1	6	Rewizja UDT	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20
60	1.3.1.5.5	M	M1	6	M-ż aparatu	1 dzień?	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21
61	1.3.1.5.6	M	M1	6	Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23
62	1.3.1.5.7	M	M1	6	D-ż zaślepek	1 dzień?	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24
63	**1.3.1.6**	**M**	**M1**	**7**	**Wymiennik E-509A**	**11 dn?**	**czw, 27-04-15**	**nie, 27-04-25**
64	1.3.1.6.1	M	M1	7	M-ż zaślepek	1 dzień?	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15
65	1.3.1.6.2	M	M1	7	D-ż aparatu	1 dzień?	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16

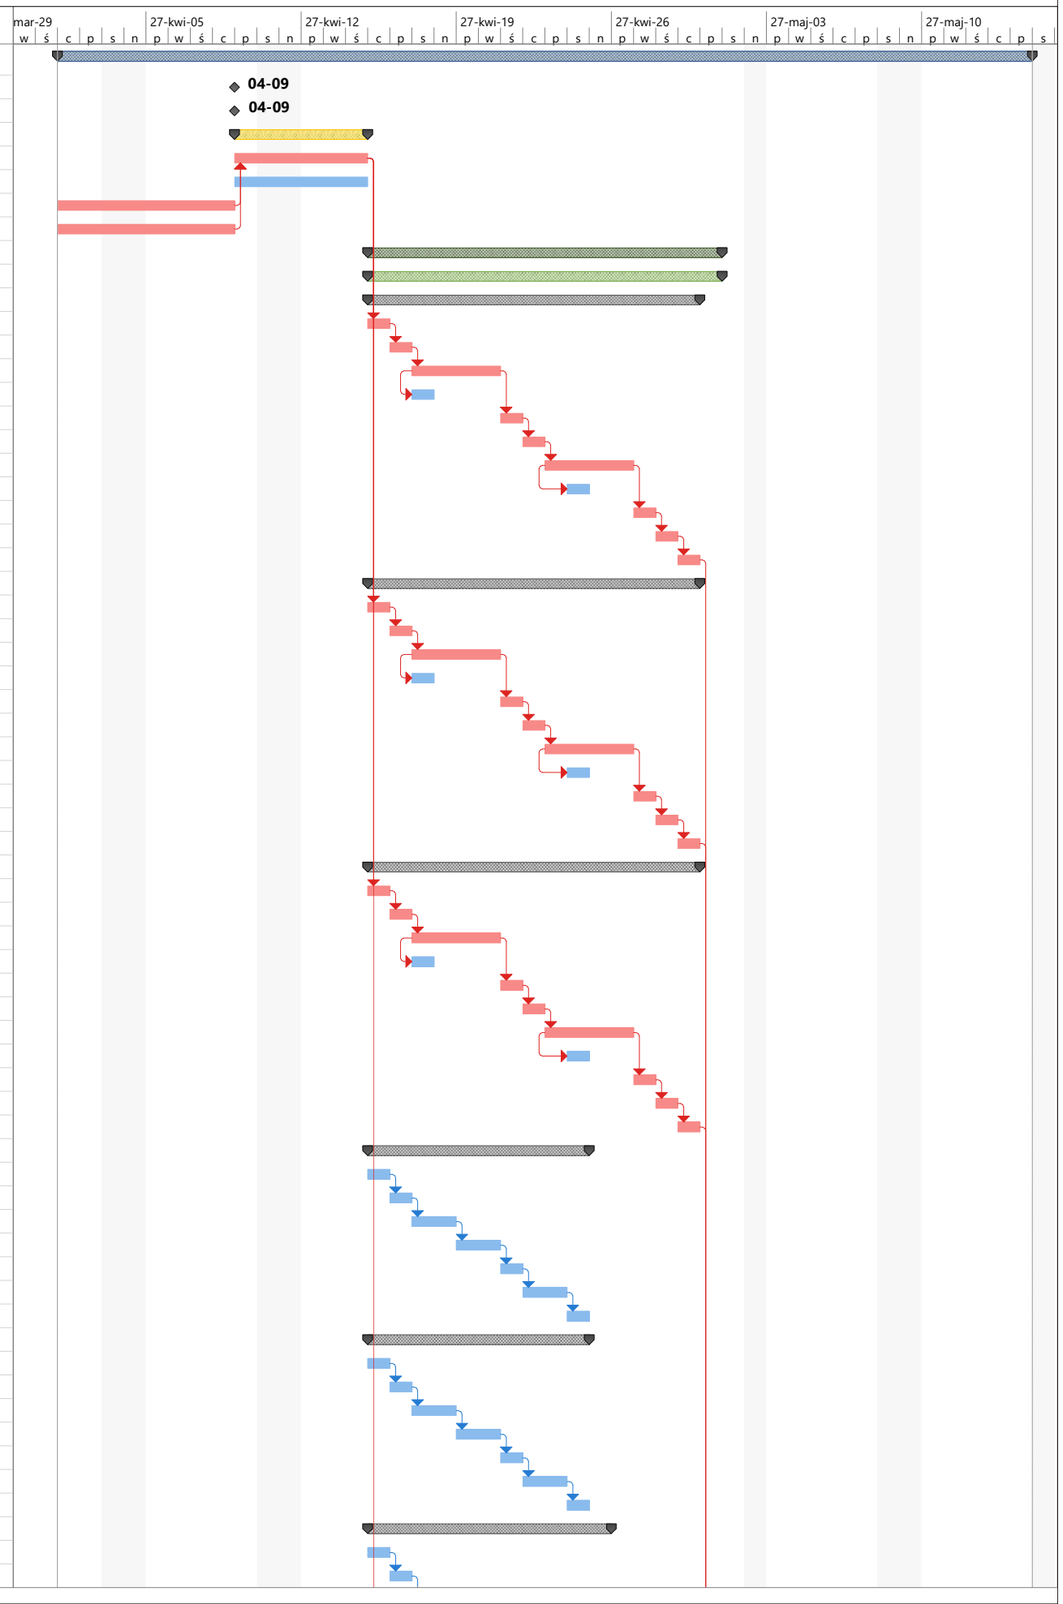


PREDESTYLACJA PT2027

Id.	SPP	Branża	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
66	1.3.1.6.3	C	C1	23	Mycie aparatu (na placu czyszczeniowym)	3 dn	sob, 27-04-17	pon, 27-04-19
67	1.3.1.6.4	M	M1	7	Rewizja UDT	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21
68	1.3.1.6.5	M	M1	7	M-ż aparatu	1 dzień?	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22
69	1.3.1.6.6	M	M1	7	Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	pią, 27-04-23	sob, 27-04-24
70	1.3.1.6.7	M	M1	7	D-ż zaślepek	1 dzień?	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25
71	**1.3.1.7**	**M**	**M1**	**8**	**Wymiennik E-509B**	**10 dn?**	**czw, 27-04-15**	**sob, 27-04-24**
72	1.3.1.7.1	M	M1	8	M-ż zaślepek	1 dzień?	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15
73	1.3.1.7.2	M	M1	8	D-ż aparatu	1 dzień?	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16
74	1.3.1.7.3	M	M1	8	Mycie aparatu (na placu czyszczeniowym)	3 dn	sob, 27-04-17	pon, 27-04-19
75	1.3.1.7.4	M	M1	8	Rewizja UDT	1 dzień?	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20
76	1.3.1.7.5	M	M1	8	M-ż aparatu	1 dzień?	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21
77	1.3.1.7.6	M	M1	8	Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23
78	1.3.1.7.7	M	M1	8	D-ż zaślepek	1 dzień?	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24
79	**1.3.1.8**	M	M1	9	**Wymiennik ciepła E-510**	**8 dn?**	**pon, 27-04-19**	**pon, 27-04-26**
80	1.3.1.8.1	M	M1	9	M-ż zaślepek	1 dzień?	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19
81	1.3.1.8.2	M	M1	9	D-ż aparatu	1 dzień?	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20
82	1.3.1.8.3	C	C1	23	Mycie aparatu (wkład rurowy mycie na placu dla MG33)	3 dn	śro, 27-04-21	pią, 27-04-23
83	1.3.1.8.4	M	M1	9	Rewizja UDT	1 dzień?	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22
84	1.3.1.8.5	M	M1	9	M-ż aparatu (montaz nowego wkładu z MG25)	1 dzień?	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23
85	1.3.1.8.6	M	M1	9	Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25
86	1.3.1.8.7	M	M1	9	D-ż zaślepek	1 dzień?	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26
87	**1.3.1.9**	M	M1	10	**Wymiennik ciepła E-511**	**10 dn?**	**sob, 27-04-17**	**pon, 27-04-26**
88	1.3.1.9.1	M	M1	10	M-ż zaślepek	1 dzień?	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17
89	1.3.1.9.2	M	M1	10	D-ż aparatu	1 dzień?	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18
90	1.3.1.9.3	M	M1	10	Mycie aparatu (wkład rurowy mycie na placu)	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21
91	1.3.1.9.4	M	M1	10	Rewizja UDT	1 dzień?	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22
92	1.3.1.9.5	M	M1	10	M-ż aparatu	1 dzień?	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23
93	1.3.1.9.6	M	M1	10	Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25
94	1.3.1.9.7	M	M1	10	D-ż zaślepek	1 dzień?	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26
95	**1.3.1.10**	M	M1	11	**Wymiennik ciepła E-512**	**10 dn?**	**sob, 27-04-17**	**pon, 27-04-26**
96	1.3.1.10.1	M	M1	11	M-ż zaślepek	1 dzień?	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17
97	1.3.1.10.2	M	M1	11	D-ż aparatu	1 dzień?	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18
98	1.3.1.10.3	C	C1	23	Mycie aparatu (wkład rurowy mycie na placu)	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21
99	1.3.1.10.4	M	M1	11	Rewizja UDT	1 dzień?	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22
100	1.3.1.10.5	M	M1	11	M-ż aparatu	1 dzień?	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23
101	1.3.1.10.6	M	M1	11	Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25
102	1.3.1.10.7	M	M1	11	D-ż zaślepek	1 dzień?	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26
103	**1.3.1.11**	M	M1	12	**Wymiennik ciepła E-704**	**8 dn?**	**pon, 27-04-19**	**pon, 27-04-26**
104	1.3.1.11.1	M	M1	12	M-ż zaślepek	1 dzień?	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19
105	1.3.1.11.2	M	M1	12	D-ż aparatu	1 dzień?	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20
106	1.3.1.11.3	C	C1	23	Mycie aparatu (wkład rurowy mycie na placu dla MG33)	3 dn	śro, 27-04-21	pią, 27-04-23
107	1.3.1.11.4	M	M1	12	Rewizja UDT	1 dzień?	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22
108	1.3.1.11.5	M	M1	12	M-ż aparatu (montaz nowego wkładu z MG25)	1 dzień?	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23
109	1.3.1.11.6	M	M1	12	Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25
110	1.3.1.11.7	M	M1	12	D-ż zaślepek	1 dzień?	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26
111	**1.3.1.12**	**M**	**M1**	**13**	**Zbiornik V-408**	**10 dn?**	**czw, 27-04-15**	**sob, 27-04-24**
112	1.3.1.12.1	M	M1	13	M-ż zaślepek	1 dzień?	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15
113	1.3.1.12.2	M	M1	13	D-ż włazów	1 dzień?	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16
114	1.5.1.12.3	C	C1	23	Czyszczenie płaszcza zbiornika	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18
115	1.3.1.12.5	M	M1	13	Rewizja UDT	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20
116	1.3.1.12.7	M	M1	13	M-ż włazów	1 dzień?	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21
117	1.3.1.12.8	M	M1	13	Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23
118	1.3.1.12.9	M	M1	13	D-ż zaślepek	1 dzień?	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24
119	**1.3.1.13**	M	M1	14	**Zbiornik V-503**	**10 dn?**	**sob, 27-04-17**	**pon, 27-04-26**
120	1.3.1.13.1	M	M1	14	M-ż zaślepek	1 dzień?	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17
121	1.3.1.13.2	M	M1	14	D-ż włazów	1 dzień?	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18
122	1.5.1.13.3	C	C1	23	Czyszczenie płaszcza zbiornika	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20
123	1.3.1.13.3	M	M1	14	Rewizja UDT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22
124	1.3.1.13.4	C	C1	23	M-ż włazów	1 dzień?	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23
125	1.3.1.13.5	M	M1	14	Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25
126	1.3.1.13.6	M	M1	14	D-ż zaślepek	1 dzień?	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26
127	**1.3.1.14**	**M**	**M1**	**15**	**Piec F-501**	**15 dn?**	**czw, 27-04-15**	**czw, 27-04-29**
128	1.3.1.14.1	M	M1	15	M-ż zaślepek	1 dzień?	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15
129	1.3.1.14.2	M	M1	15	D-ż włazów	1 dzień	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16
130	1.5.1.14.3	C	C1	23	Montaż rusztowania wewnątrz pieca	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18
131	1.5.1.14.4	M	M1	15	Rewizja UDT	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20

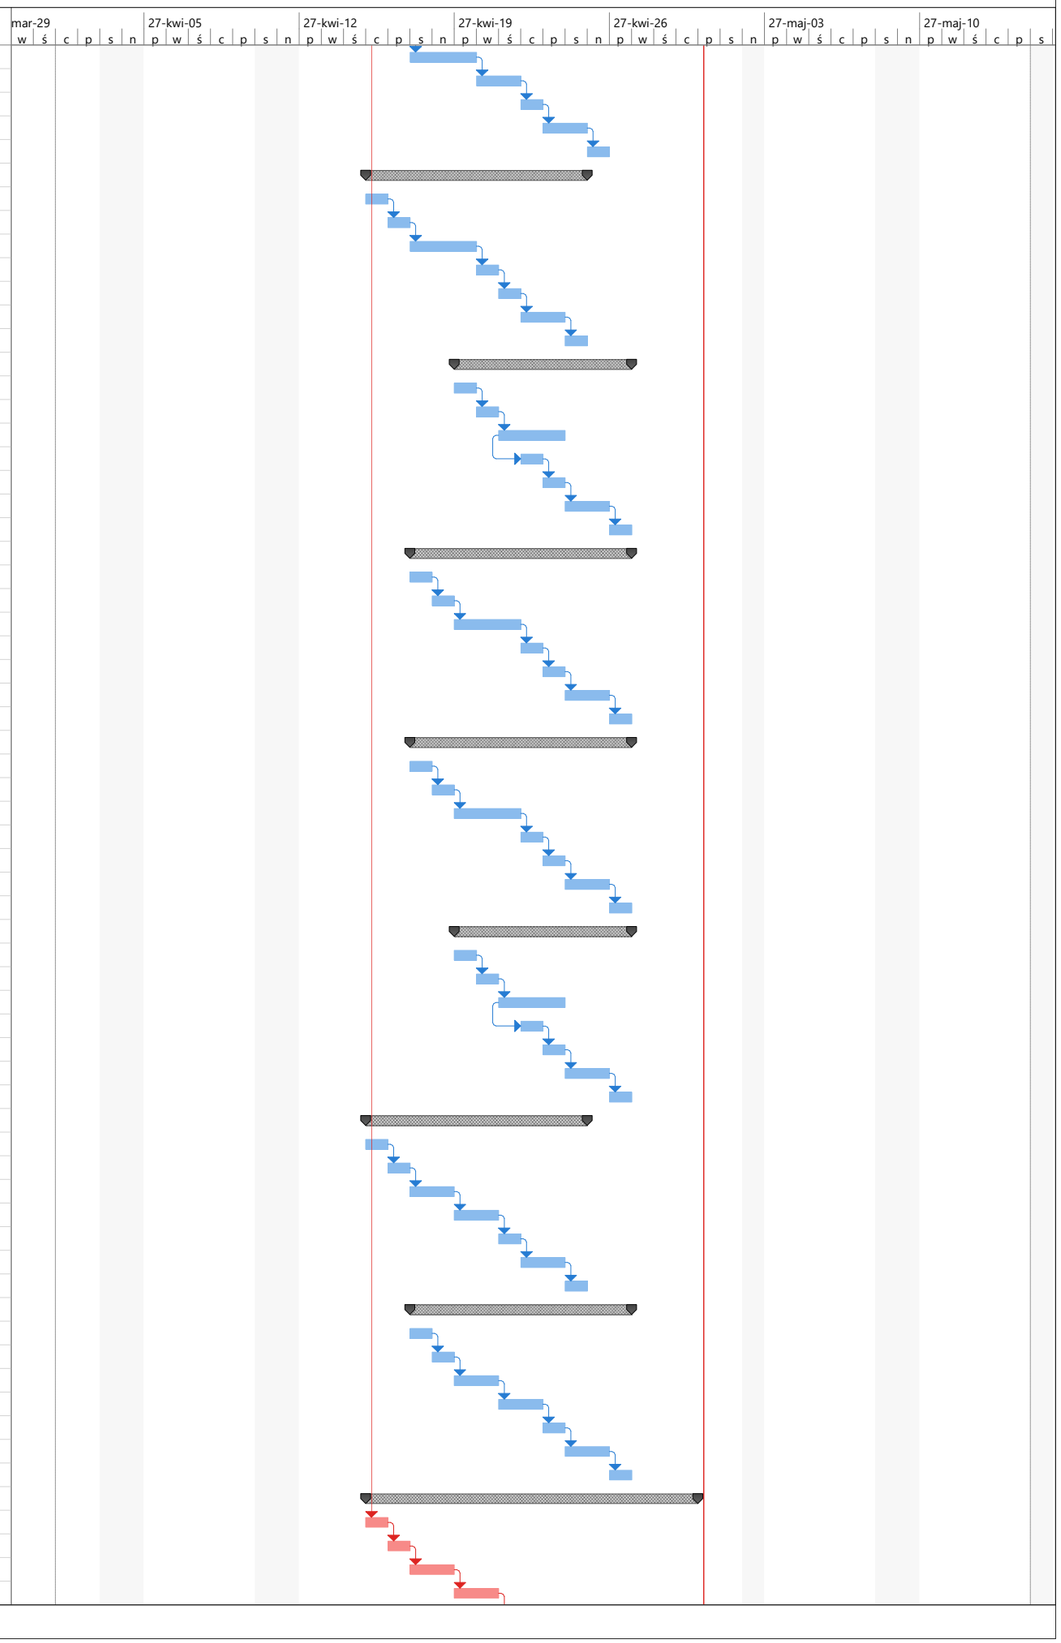


PREDESTYLACJA PT2027

Id.	SPP	Branża	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
132	1.3.1.14.3	M	M1	15	Przegląd i naprawa palników gazowych 3 szt.	3 dn	śro, 27-04-21	pią, 27-04-23
133	1.3.1.14.4	M	M1	15	Regulacja i konserwacja zawiesi 18 szt.	3 dn	śro, 27-04-21	pią, 27-04-23
134	1.3.1.14.5	M	M1	15	Sprawdzenie klapy kominowej pieca	1 dzień?	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24
135	1.3.1.14.6	M	M1	15	Przegląd i konserwacja zamocowań sprężynowcyh 2 szt.	1 dzień?	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25
136	1.5.1.14.9	C	C1	23	Demontaż rusztowania wewnątrz pieca	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27
137	1.3.1.14.9	M	M1	15	M-ż włazów	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28
138	1.5.1.14.11	M	M1	15	Przegląd i konserwacja instalacji pary gaśniczej	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28
139	1.5.1.14.12	M	M1	15	Próba funkcjonalna pary gaśniczej z ZSP	1 dzień?	czw, 27-04-29	czw, 27-04-29
140	1.3.1.14.10	M	M1	15	D-ż zaślepek	1 dzień?	czw, 27-04-29	czw, 27-04-29
141	**1.3.1.15**	**M**	**M2**	**16**	**Armatura zaporowa**	**11 dn**	**czw, 27-04-15**	**nie, 27-04-25**
142	1.3.1.15.1	M	M2	16	D-ż armatury	5 dn	czw, 27-04-15	pon, 27-04-19
143	1.3.1.15.4	M	M2	16	Regeneracja armatury	5 dn	wto, 27-04-20	sob, 27-04-24
144	1.3.1.15.6	M	M2	16	Wymiana armatury kołnierzowej wg zakresu	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21
145	1.3.1.15.8	M	M2	16	M-ż armatury	4 dn	czw, 27-04-22	nie, 27-04-25
146	**1.3.1.16**	M	M2	**17**	**Armatura PiA**	**13 dn**	**czw, 27-04-15**	**wto, 27-04-27**
147	1.3.1.16.2	M	M2	17	D-ż zaworów blokadowych I kryz	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17
148	1.3.1.16.5	A	A3	3	Regeneracja armatury PiA	7 dn	nie, 27-04-18	sob, 27-04-24
149	1.3.1.16.7	M	M2	17	M-ż zaworów blokadowych I kryz	3 dn	nie, 27-04-25	wto, 27-04-27
150	**1.3.1.17**	**M**	**M2**	**18**	**Przegląd zaworów bezpieczeństwa**	**9 dn**	**czw, 27-04-15**	**pią, 27-04-23**
151	1.3.1.17.1	M	M2	18	D-ż zaworów bezpieczeństwa	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17
152	1.3.1.17.3	M	M2	18	Regeneracja oraz ustawienie nastaw ciśnienia otwarcia zaworów	3 dn	nie, 27-04-18	wto, 27-04-20
153	1.3.1.17.6	M	M2	18	M-ż zaworów bezpieczeństwa	3 dn	śro, 27-04-21	pią, 27-04-23
154	**1.3.1.18**	**M**	**M1**	**19**	**Filtry pomp procesowych**	**14 dn**	**czw, 27-04-15**	**śro, 27-04-28**
155	1.3.1.18.1	M	M1	19	M-ż zaślepek	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16
156	1.3.1.18.2	M	M1	19	D-ż pokrywy filtra	4 dn	sob, 27-04-17	wto, 27-04-20
157	1.3.1.18.3	M	M1	19	D-ż, czyszczenie, przegląd kosza lub wkładu filtracyjnego	4 dn	pon, 27-04-19	czw, 27-04-22
158	1.3.1.18.5	M	M1	19	M-ż pokrywy filtra	4 dn	pią, 27-04-23	pon, 27-04-26
159	1.3.1.18.6	M	M1	19	D-ż zaślepek	2 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28
160	**1.3.1.19**	**M**	**M1**	**20**	**Rurociągi podlegające pod UDT i ZDT**	**13 dn**	**czw, 27-04-15**	**wto, 27-04-27**
161	1.3.1.19.1	M	M1	20	M-ż zaślepek	4 dn	czw, 27-04-15	nie, 27-04-18
162	1.3.1.19.3	M	M1	20	Próba ciśnieniowa rurociągów dla UDT/ZDT	5 dn	pon, 27-04-19	pią, 27-04-23
163	1.3.1.19.4	M	M1	20	D-ż zaślepek	4 dn	sob, 27-04-24	wto, 27-04-27
164	**1.3.1.20**	**R**	**R1**	**21**	**Rusztowania**	**16 dn?**	**czw, 27-04-15**	**pią, 27-04-30**
165	1.3.1.20.1	R	R1	21	M-ż rusztowań	11 dn?	czw, 27-04-15	nie, 27-04-25
166	1.3.1.20.2	R	R1	21	D-ż rusztowań	11 dn	wto, 27-04-20	pią, 27-04-30
167	**1.3.1.21**	**I**	**I1**	**22**	**Izolacje**	**16 dn?**	**czw, 27-04-15**	**pią, 27-04-30**
168	1.3.1.21.1	I	I1	22	D-ż izolacji	11 dn?	czw, 27-04-15	nie, 27-04-25
169	1.3.1.21.2	I	I1	22	M-z izolacji	11 dn?	wto, 27-04-20	pią, 27-04-30
170	**1.3.1.22**	**C**	**M5**	**23**	**Czyszczenie wkładów rurowych**	**9 dn**	**sob, 27-04-17**	**nie, 27-04-25**
171	**1.3.1.22.1**	**C**	**M5**	**23**	**Czyszczenie, z wykorzystaniem technologii opartej o metody hydrodynamiczne lub/i mieszaniną gazów obojętnych – zanieczyszczenie lekkie**	**7 dn**	**sob, 27-04-17**	**pią, 27-04-23**
172	1.5.1.22.1.1	C	M5	23	Wymiennik E-510 (Wkład na MG33)	3 dn	śro, 27-04-21	pią, 27-04-23
173	1.5.1.22.1.2	C	M5	23	Wymiennik E-511	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21
174	1.5.1.22.1.3	C	M5	23	Wymiennik E-512	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21
175	1.5.1.22.1.4	C	M5	23	Wymiennik E-704 (Wkład na MG33)	3 dn	śro, 27-04-21	pią, 27-04-23
176	1.5.1.22.1.5	C	M5	23	Wymiennik E-509A	3 dn	sob, 27-04-17	pon, 27-04-19
177	1.5.1.22.1.6	C	M5	23	Wymiennik E-509B	3 dn	sob, 27-04-17	pon, 27-04-19
178	1.5.1.22.1.7	C	M5	23	Wymiennik CH-3	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18
179	1.5.1.22.1.8	C	M5	23	Zbiornik V-408	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18
180	1.5.1.22.1.9	C	M5	23	Zbiornik V-503	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20
181	1.3.1.22.2	C	M5	23	Czyszczenie metodą hydrodynamiczną kolektora gazu opałowego do pieców F501 i 1-H2	9 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-25
182	**1.3.1.23**	**C**	**M4**	**24**	**Czyszczenie zraszaczy p. poż**	**15 dn?**	**czw, 27-04-15**	**czw, 27-04-29**
183	1.3.1.23.1	C	M4	24	Przegląd i czynności konserwacyjne instalacji zraszaczowej oraz pianowej	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16
184	1.3.1.23.2	C	M4	24	Czyszczenie zraszaczy instalacji p. ppoż. na kolumnach, zbiornikach i pompach	4 dn	sob, 27-04-17	wto, 27-04-20
185	1.3.1.23.3	C	M4	24	Demontaż połączenia kołnierzowego na instalacjach pianowych	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22
186	1.3.1.23.4	C	M4	24	Płukanie wodą pierścieni zraszaczowych oraz rurociągów piany	2 dn	pią, 27-04-23	sob, 27-04-24
187	1.3.1.23.5	C	M4	24	Montaż zraszaczy i przeprowadzenie próby funkcjonalnej instalacji zraszaczowej	2 dn	nie, 27-04-25	pon, 27-04-26
188	1.3.1.23.6	C	M4	24	Usuwanie i ewentualne naprawy nieszczelności na pierścieniach i orurowaniu	2 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28
189	1.3.1.23.7	C	M4	24	Przeprowadzenie próby funkcjonalnej instalacji pianowej z ZSP	1 dzień?	czw, 27-04-29	czw, 27-04-29
190	**1.5.1.23.8**	**M**	**M3**	**25**	**Zakres 25 Prace dodatkowe**	**15 dn**	**czw, 27-04-15**	**czw, 27-04-29**
191	1.5.1.23.8.1	M	M3	25	Prace wynikające z zaleceń inspektora UDT/ZDT/SUR	15 dn	czw, 27-04-15	czw, 27-04-29
192	**1.5.1.23.9**	**M**	**M6**	**26**	**Zakres 26 Czyszczenie metodą suchą chłodnic powietrznych**	**6 dn**	**czw, 27-04-15**	**wto, 27-04-20**
193	1.5.1.23.9.1	M	M6	26	Czyszczenie zewnętrzne rurek ożebrowanych chłodnic powietrznych E-508/513	6 dn	czw, 27-04-15	wto, 27-04-20
194	**1.5.2**	**A**			**BRANŻA AUTOMATYCZNA**	**15 dn**	**czw, 27-04-15**	**czw, 27-04-29**

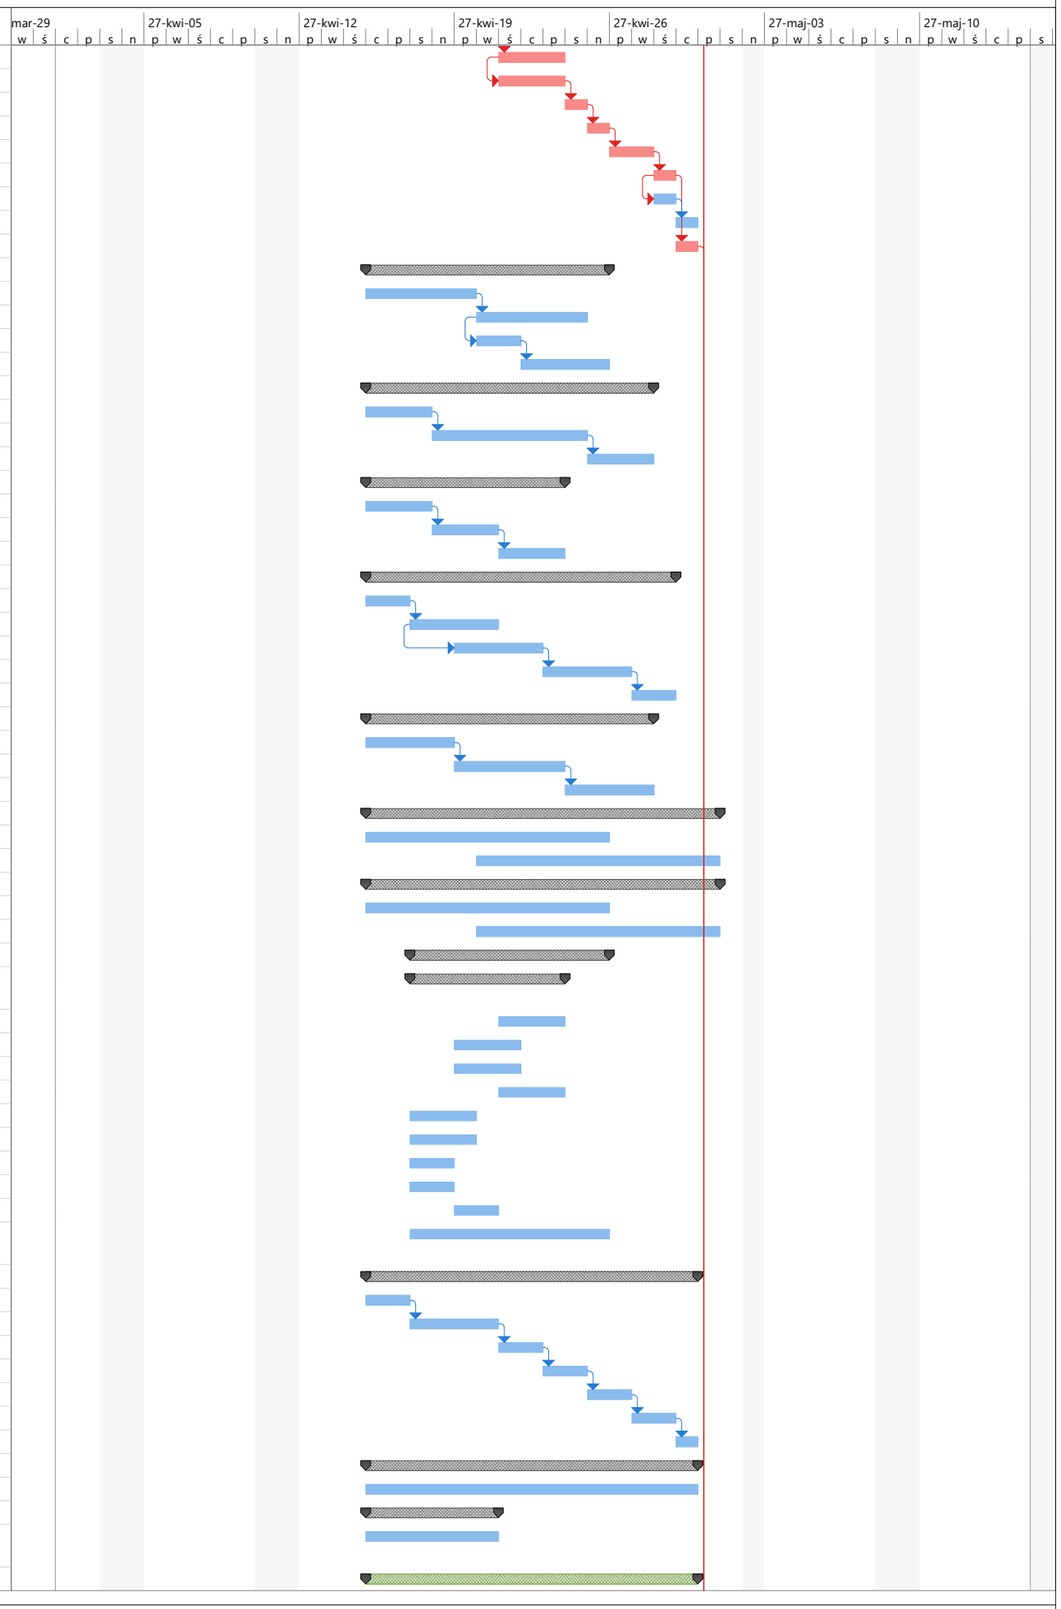


PREDESTYLACJA PT2027

Id.	SPP	Branża	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
195	**1.5.2.1**	**A**	**A2**	**2**	**Zawory MOV Z1,Z3,Z4,Z5**	**10 dn**	**czw, 27-04-15**	**sob, 27-04-24**
196	1.5.2.1.1	A	A2	2	Przygotowanie zasuw MOV (odłaczenie sygnałów sterowania)	1 dzień	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15
197	1.5.2.1.2	A	A2	2	Podłaczanie przewodów i przesterowanie	2 dn	pią, 27-04-23	sob, 27-04-24
198	**1.5.2.2**	**A**	**A2**	**2**	**Manometry PG**	**6 dn**	**czw, 27-04-15**	**wto, 27-04-20**
199	1.5.2.2.1	A	A2	2	Demontaż manometrów	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17
200	1.5.2.2.2	A	A2	2	Wymiana manometrów	3 dn	nie, 27-04-18	wto, 27-04-20
201	**1.5.2.3**	A	A2	2	**Poziomowskazy LG**	**11 dn**	**czw, 27-04-15**	**nie, 27-04-25**
202	1.5.2.3.1	A	A2	2	Demontaz poziomowskazów	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17
203	1.5.2.3.2	A	A2	2	Regeneracja zaworków	5 dn	nie, 27-04-18	czw, 27-04-22
204	1.5.2.3.3	A	A2	2	Montaż poziomowskazów	3 dn	pią, 27-04-23	nie, 27-04-25
205	**1.5.2.4**	**A**	**A3**	**3**	**Kryzy**	**14 dn**	**czw, 27-04-15**	**śro, 27-04-28**
206	1.5.2.4.1	M	M1	17	Demontaż kryz br.M	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17
207	1.5.2.4.2	A	A3	3	Obmiar FE-115, FE122, FE-124, FE-127, FE-748	4 dn	nie, 27-04-18	śro, 27-04-21
208	1.5.2.4.3	A	A3	3	Sprawdzenie przetworników przepływu i układów bilansowych	4 dn	czw, 27-04-22	nie, 27-04-25
209	1.5.2.4.4	M	M1	17	Montaż kryz br.M	3 dn	pon, 27-04-26	śro, 27-04-28
210	**1.5.2.5**	**A**	**A4**	**4**	**Próby blokad**	**9 dn**	**czw, 27-04-15**	**pią, 27-04-23**
211	1.5.2.5.1	A	A4	4	Demontaż aparatury blokadowej	1 dzień	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15
212	1.5.2.5.2	A	A4	4	Sprawdzenie aparatury blokadowej	3 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18
213	1.5.2.5.3	A	A4	4	Sprawdzenie funkcjonalne układów blokadowych	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21
214	1.5.2.5.4	A	A4	4	Montaż aparatury blokadowej	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23
215	**1.5.2.6**	**A**	**A5**	**5**	**Piec F-501**	**15 dn**	**czw, 27-04-15**	**czw, 27-04-29**
216	1.5.2.6.1	A	A5	5,17	Sprawdzenie, remont zaworów blokadowychi regulacyjnych (zał. nr 3)	7 dn	nie, 27-04-18	sob, 27-04-24
217	1.5.2.6.2	A	A5	5,17	D-ż, sprawdzenie, m-ż aparatury PiA pieca F-501 (zał. 4)	13 dn	czw, 27-04-15	wto, 27-04-27
218	1.5.2.6.3	A	A5	5,17	Kalibracja oraz diagnostyka PST zaworów blokadowych: XV711, XV712	1 dzień	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26
219	1.5.2.6.4	A	A5	5	Przegląd, konserwacja, sprawdzenie pilotów i zapalarek	13 dn	sob, 27-04-17	czw, 27-04-29
220	1.5.2.6.5	A	A5	5	Skanery płomienia: zabezpieczenie, d-ż, przegląd, m-ż	13 dn	sob, 27-04-17	czw, 27-04-29
221	1.5.2.6.6	A	A5	5	Sprawdzenie, przesterowanie klapy kominowej HV724	1 dzień	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24
222	1.5.2.6.7	A	A5	5	Sprawdzenie funkcjonalne układów blokadowych pieca F-501	3 dn	sob, 27-04-24	pon, 27-04-26
223	**1.5.3**	**E**			**BRANŻA ELEKTRYCZNA**	**14 dn**	**czw, 27-04-15**	**śro, 27-04-28**
224	**1.5.3.1**	**E**	**E1**	**1**	**Przegląd rozdzielni nn OPT-R441 N3**	**14 dn**	**czw, 27-04-15**	**śro, 27-04-28**
225	1.5.3.1.1	E	E1	1	Przegląd rozdzielni nn OPT-R441 N3 (62 pola)	14 dn	czw, 27-04-15	śro, 27-04-28
226	**1.5.3.2**	**E**	**E2**	**2**	**Przegląd i konserwacja transformatorów olejowych T5,T6**	**14 dn**	**czw, 27-04-15**	**śro, 27-04-28**
227	1.5.3.2.1	E	E2	2	Przegląd i konserwacja transformatorów olejowych T5,T6	14 dn	czw, 27-04-15	śro, 27-04-28
228	**1.5.3.3**	**E**	**E3**	**3**	**Przegląd tablic obiektowych**	**14 dn**	**czw, 27-04-15**	**śro, 27-04-28**
229	1.5.3.3.1	E	E3	3	Przegląd tablic obiektowych (5 szt.)	14 dn	czw, 27-04-15	śro, 27-04-28
230	**1.5.3.4**	**E**	**E4**	**4**	**Przegląd baterii kondensatorów BKI, BKII**	**4 dn**	**wto, 27-04-20**	**pią, 27-04-23**
231	1.5.3.4.1	E	E4	4	Przegląd baterii kondensatorów BKI, BKII	4 dn	wto, 27-04-20	pią, 27-04-23
232	**1.5.3.5**	**E**	**E5**	**5**	**Silniki elektryczne**	**14 dn**	**czw, 27-04-15**	**śro, 27-04-28**
233	1.5.3.5.1				Demontaż silników 15 szt.	4 dn	czw, 27-04-15	nie, 27-04-18
234	1.5.3.5.2				Przegląd silników 15 szt. na warsztacie elektrycznym	7 dn	nie, 27-04-18	sob, 27-04-24
235	1.5.3.5.3	E	E5	5	Montaż silników 15 szt.	6 dn	pią, 27-04-23	śro, 27-04-28
236	**1.5.3.6**	**E**	**E6**	**6**	**Przeglad i konserwacja zasuw elektrycznych**	**9 dn**	**pią, 27-04-16**	**sob, 27-04-24**
237	1.5.3.6.1	E	E6	6	Przeglad i konserwacja zasuw elektrycznych (MOV - 4 szt.).	9 dn	pią, 27-04-16	sob, 27-04-24
238	**1.5.3.7**	**E**	**E7**	**7**	**Diagnostyka instalacji zasilających silniki elektryczne**	**14 dn**	**czw, 27-04-15**	**śro, 27-04-28**
239	1.5.3.7.1	E	E7	7	Pomiary elektryczne oraz przegląd i konserwacja instalacji zasilających silniki elektryczne.	14 dn	czw, 27-04-15	śro, 27-04-28
240	**1.5.4**	**B**			**BRANŻA BUDOWLANA**	**11 dn?**	**czw, 27-04-15**	**nie, 27-04-25**
241	**1.5.4.1**	**B**	**B1**	**1**	**PIEC F-501**	**11 dn?**	**czw, 27-04-15**	**nie, 27-04-25**
242	1.5.4.1.1	B	B1	1	Organizacja zaplecza budowy	1 dzień	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15
243	1.5.4.1.2	B	B1	1	Przegląd wyłożenia ogniotrwałego części cylindrycznej i kanału spalin	1 dzień?	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16
244	1.5.4.1.3	B	B1	1	Uzupełnienie ubytków wymurówki	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21
245	1.5.4.1.4	B	B1	1	Uzupełnienie klipsów mocujących	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23
246	1.5.4.1.5	B	B1	1	Wymiana uszkodzonych cegieł i wypełenienie dylatacji	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25
247	1.5.4.1.6	B	B1	1	Czyszczenie i naprawa gniazd palników	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25
248	**1.5.5**	**W**			**BRANŻA MASZYN WIRUJĄCYCH**	**5 dn**	**pon, 27-04-19**	**pią, 27-04-23**
249	**1.5.5.1**	**W**	**W1**	**1**	**P-508B Remont planowy pompy**	**4 dn**	**pon, 27-04-19**	**czw, 27-04-22**
250	1.5.5.1.1	W	W1	1	wymiana łożysk, wymiana/regeneracja UM, przegląd sprzęgła, wyważanie rotora, zesprzęglenie, osiowanie, prace tokarskie wg. potrzeby, asysta przy uruchomieniu	4 dn	pon, 27-04-19	czw, 27-04-22
251	**1.5.5.2**	**W**	**W2**	**2**	**P-509B Remont planowy pompy**	**4 dn**	**pon, 27-04-19**	**czw, 27-04-22**
252	1.5.5.2.1	W	W2	2	wymiana łożysk, wymiana/regeneracja UM, przegląd sprzęgła, wyważanie rotora, zesprzęglenie, osiowanie, prace tokarskie wg. Potrzeby, asysta przy uruchomieniu	4 dn	pon, 27-04-19	czw, 27-04-22
253	**1.5.5.3**	**W**	**W3**	**3**	**Wentylator WE508-1**	**2 dn**	**wto, 27-04-20**	**śro, 27-04-21**
254	1.5.5.3.1	W	W3	3	D-ż i kontrola osłon, kontrola kół pasowych, d-mż pasów, kontrola łopat, dyfuzora, kąta ustawienia łopat, łożysk, m-ż pasków, kontrola naciągu pasów wentylatorów, smarowanie ,kontrola pracy	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21

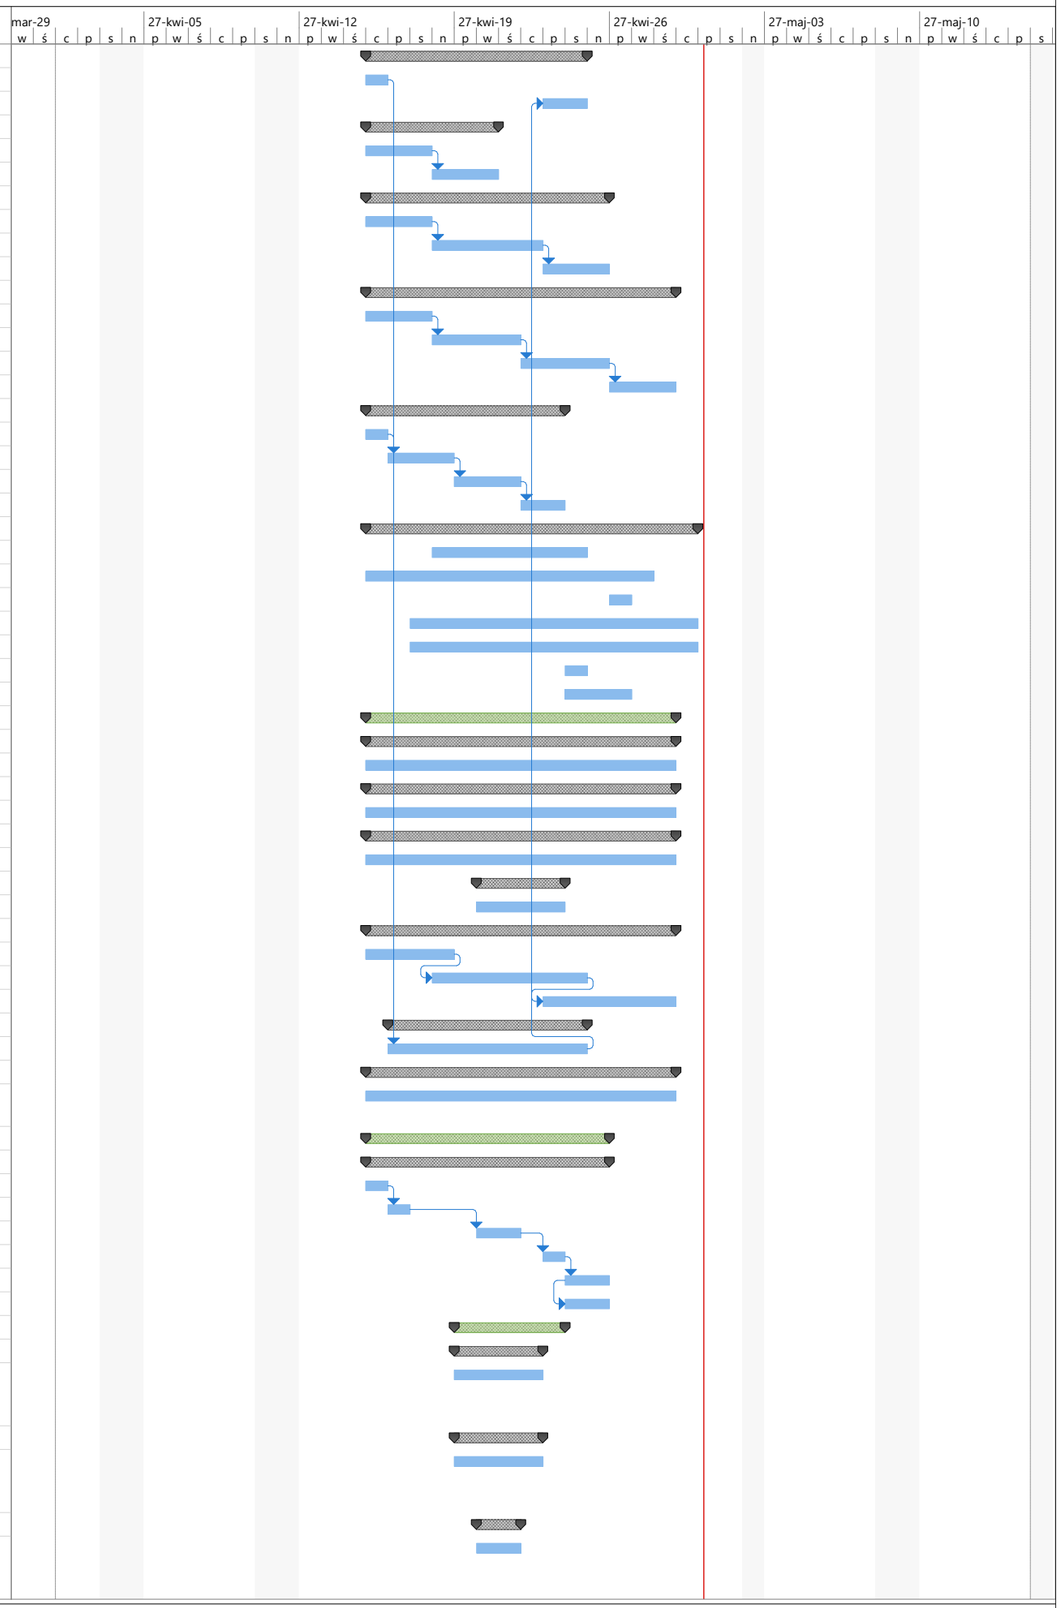

PREDESTYLACJA PT2027

Id.	SPP	Branża	Grupa	Zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
255	**1.5.5.4**	**W**	**W4**	**4**	**Wentylator WE513-2**	**2 dn**	**wto, 27-04-20**	**śro, 27-04-21**
256	1.5.5.4.1	W	W4	4	D-ż i kontrola osłon, kontrola kół pasowych, d-mż pasów, kontrola łopat, dyfuzora, kąta ustawienia łopat, łożysk, m-ż pasków, kontrola naciągu pasów wentylatorów, smarowanie ,kontrola pracy	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21
257	**1.5.5.5**	**W**	**W5**	**5**	**M-pompy**	**4 dn**	**wto, 27-04-20**	**pią, 27-04-23**
258	1.5.5.5.1	W	W5	5	Korekty osiowań pomp oraz wentylatorów	3 dn	wto, 27-04-20	czw, 27-04-22
259	1.5.5.5.2	W	W5	5	Przegląd/czyszczenie systemów cieczy buforowej	3 dn	śro, 27-04-21	pią, 27-04-23
260	**1.6**				**BADANIA MATERIAŁOWE**	**7 dn**	**czw, 27-04-15**	**śro, 27-04-21**
261	**1.6.1**				**Pomiary grubości ścianek aparatów i rurociągów**	**5 dn**	**czw, 27-04-15**	**pon, 27-04-19**
262	1.6.1.1				Badania UTT - 7810 pkt (Realizacja prac 08.02-19.04)	5 dn	czw, 27-04-15	pon, 27-04-19
263	**1.6.2**				**PBE dla Pieca F-501**	**7 dn**	**czw, 27-04-15**	**śro, 27-04-21**
264	1.6.2.1				Program Badań Eksploatacyjnych	7 dn	czw, 27-04-15	śro, 27-04-21
265	**1.4**				**PRÓBA KOMPLEKSOWA INSTALACJI**	**1 dzień?**	**pią, 27-04-30**	**pią, 27-04-30**
266	1.4.1		PRODUK	PP11/1	Wykonanie prób szczelności węzła/instalacji	1 dzień?	pią, 27-04-30	pią, 27-04-30
267	**1.5**				**ROZRUCH INSTALACJI**	**6 dn**	**pią, 27-04-30**	**czw, 27-05-06**
268	1.8.1		PRODUK	PP11/1	Rozruch instalacji	6 dn	pią, 27-04-30	czw, 27-05-06
269	1.5.1	M	M1	1	Prace związane z rozruchem instalacji (asysta br.M)	6 dn	pią, 27-04-30	czw, 27-05-06
270	1.8.3	W	W5	5	Asysta przy uruchomieniu instalacji EAR (M-pompy)	5 dn	pią, 27-04-30	śro, 27-05-05
271	1.9	R	R1	21	D-ż rusztowań niezbędnych do rozruchu	6 dn	pią, 27-05-07	pią, 27-05-14
272	1.10	I	I1	22	M-ż izolacji niezbędnych do rozruchu	6 dn	pią, 27-05-07	pią, 27-05-14
273	**1.6**				**URUCHOMIENIE INSTALACJI**	**0 dn**	**czw, 27-05-06**	**czw, 27-05-06**
274	1.6.1		PRODUK	PP11/1	Uruchomienie instalacji	0 dn	czw, 27-05-06	czw, 27-05-06

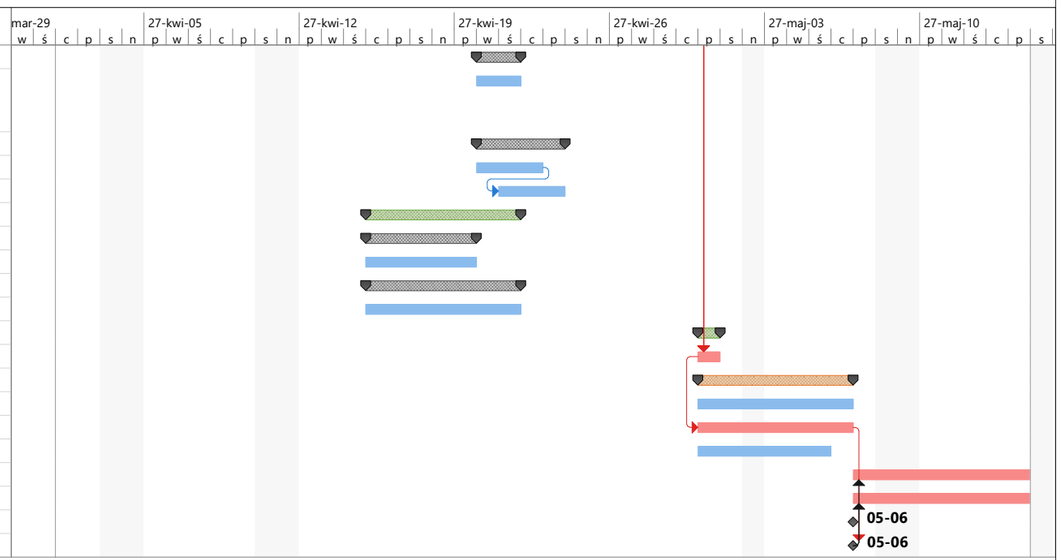

Rybacki Mateusz
Elektronicznie podpisany przez Rybacki Mateusz
Data: 2026.10.07 12:46:32 +02'00'

Piotr Polek
Elektronicznie podpisany przez Piotr Polek
Data: 2026.10.12 10:49:55 +02'00'

Elektronicznie podpisany przez Szadkowski Marcin
Data: 2026.10.07 12:41:14 +02'00'

Konopski Krzysztof
Elektronicznie podpisany przez Konopski Krzysztof
Data: 2026.10.07 11:32:56 +02'00'

Gasik Mariusz
Elektronicznie podpisany przez Gasik Mariusz
Data: 2026.10.12 12:10:14 +02'00'

Niesiobedzki Piotr
Elektronicznie podpisany przez Niesiobedzki Piotr
Data: 2026.10.08 12:20:15 +02'00'

Gacek Bartlomiej
Elektronicznie podpisany przez Gacek Bartlomiej
Data: 2026.10.07 12:59:59 +02'00'

Krakowiak Marek
Elektronicznie podpisany przez Krakowiak Marek
Data: 2026.10.13 10:47:52 +02'00'

Elektronicznie podpisany przez Tomasz Szyda
Data: 2026.10.08 '07:41:58 +02'00
Tomas z Szyda

Domzalski Marcin
Elektronicznie podpisany przez Domzalski Marcin
Data: 2026.10.08 08:17:58 +02'00'
