HARMONOGRAM PRAC W POSTOJU TECHNOLOGICZNYM INSTALACJI OXYCLAUS II 01.09 - 14.10.2026

Id.	Nr zakresu	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1		**Postój instalacji 01.09 - 14.10.2026**	44 dn	wto, 26-09-01	śro, 26-10-14
2		**Prace remontowe na instalacji Claus II 08.09.2026 - 08.10.2026**	31 dn	wto, 26-09-08	czw, 26-10-08
3	1	Zaślepki do instalacji Clausa II	13 dn	wto, 26-09-01	śro, 26-10-14
4	2	Palnik i komora spalania 22H2	28 dn	wto, 26-09-08	pon, 26-10-05
5	3	Kocioł parowy 22E1	28 dn	wto, 26-09-08	pon, 26-10-05
6	4	Kondensator siarki 22E2	28 dn	wto, 26-09-08	pon, 26-10-05
7	5	Podgrzewacz parowy 22E3	28 dn	wto, 26-09-08	pon, 26-10-05
8	6	Kondensator siarki 22E4	28 dn	wto, 26-09-08	pon, 26-10-05
9	7	Podgrzewacz parowy 22E5	28 dn	wto, 26-09-08	pon, 26-10-05
10	8	Kondensator siarki 22E6	28 dn	wto, 26-09-08	pon, 26-10-05
11	9	Zbiornik siarki płynnej 22V1	29 dn	wto, 26-09-08	wto, 26-10-06
12	10	Reaktor katalityczny 22R1	29 dn	wto, 26-09-08	wto, 26-10-06
13	11	Reaktor katalityczny 22R2	29 dn	wto, 26-09-08	wto, 26-10-06
14	12	Reaktor katalityczny 22R3	29 dn	wto, 26-09-08	wto, 26-10-06
15	13	Demontaż, montaż armatury automatycznej	18 dn	wto, 26-09-08	wto, 26-10-06
16	14	D-ż, m-ż i regener. armat. zap. i zaw. bezpiecz.	29 dn	wto, 26-09-08	wto, 26-10-06
17	15	Kondensator siarki 22E7	27 dn	czw, 26-09-10	wto, 26-10-06
18	16	Separator siarkowodoru 22S1	24 dn	pią, 26-09-11	nie, 26-10-04
19	17	Separator siarkowodoru 22S2	24 dn	pią, 26-09-11	nie, 26-10-04
20	18	Separator siarki 22S3	26 dn	czw, 26-09-10	pon, 26-10-05
21	19	Zamknięcie siarkowe 22X2	23 dn	sob, 26-09-12	nie, 26-10-04
22	20	Zamknięcie siarkowe 22X3	23 dn	sob, 26-09-12	nie, 26-10-04
23	21	Zamknięcie siarkowe 22X4	23 dn	sob, 26-09-12	nie, 26-10-04
24	22	Zamknięcie siarkowe 22X5	23 dn	sob, 26-09-12	nie, 26-10-04
25	23	Zamknięcie siarkowe 22X6	23 dn	sob, 26-09-12	nie, 26-10-04
26	24	Remont armatury automatycznej.	29 dn	wto, 26-09-08	wto, 26-10-06
27	*25A	Roboty izolacyjne	45 dn	pon, 26-08-24	wto, 26-10-20
28	*25B	Roboty rusztowaniowe	45 dn	pon, 26-08-24	wto, 26-10-20
29	26	Kanalizacja przemysłowa	4 dn	sob, 26-09-26	wto, 26-09-29
30	27	Czyszczenie aparatów i rurociągów	27 dn	wto, 26-09-08	nie, 26-10-04
31	28	**Wymiana kompensatorów na rurociągach**	29 dn	wto, 26-09-08	wto, 26-10-06
32		700-GPC-201 Wymiana kompensatorów	25 dn	wto, 26-09-08	pią, 26-10-02
33		250-GPC-212 Wymiana kompensatorów	25 dn	sob, 26-09-12	wto, 26-10-06
34		250-GSW-203 Wymiana kompensatorów	22 dn	nie, 26-09-13	nie, 26-10-04
35		350-GSW-203 Wymiana kompensatorów	22 dn	nie, 26-09-13	nie, 26-10-04
36		350-GSW-204 Wymiana kompensatorów	22 dn	nie, 26-09-13	nie, 26-10-04
37		500-GSW-204 Wymiana kompensatorów	22 dn	nie, 26-09-13	nie, 26-10-04
38		700-GPC-203 Wymiana kompensatorów	25 dn	czw, 26-09-10	nie, 26-10-04
39		700-GPC-204 Wymiana kompensatorów	25 dn	czw, 26-09-10	nie, 26-10-04
40		700-GPC-205 Wymiana kompensatorów	25 dn	czw, 26-09-10	nie, 26-10-04
41		700-GPC-206 Wymiana kompensatorów	25 dn	sob, 26-09-12	wto, 26-10-06
42		700-GPC-207 Wymiana kompensatorów	25 dn	sob, 26-09-12	wto, 26-10-06
43		700-GPC-208 Wymiana kompensatorów	25 dn	sob, 26-09-12	wto, 26-10-06
44		700-GPC-209 Wymiana kompensatorów	25 dn	sob, 26-09-12	wto, 26-10-06
45	29	Silniki elektryczne	25 dn	śro, 26-09-09	sob, 26-10-03
46	30	Instalacje elektryczne	25 dn	śro, 26-09-09	sob, 26-10-03
47	31	Prace wymurówkowe w 22H2/E1, 22R1,R2,R3	23 dn	śro, 26-09-09	czw, 26-10-01
48	32	Pomiary ECT rur kotła 22E1	6 dn	pią, 26-09-18	śro, 26-09-23
49	33	Aparaty wymiany ciepła - zakres dodatkowy	27 dn	wto, 26-09-08	nie, 26-10-04
50	34	Pomiary UTT i UT	27 dn	wto, 26-09-08	nie, 26-10-04
51		Próba kompleksowa	1 dzień	śro, 25-09-24	śro, 25-09-24
52		*25A,B: Do 08.10.2026 zakończenie prac izolacyjnych i d-z rusztowań, oprócz połączeń kołnierzowych biorących udział w próbie kompleksowej i rozruchu.			

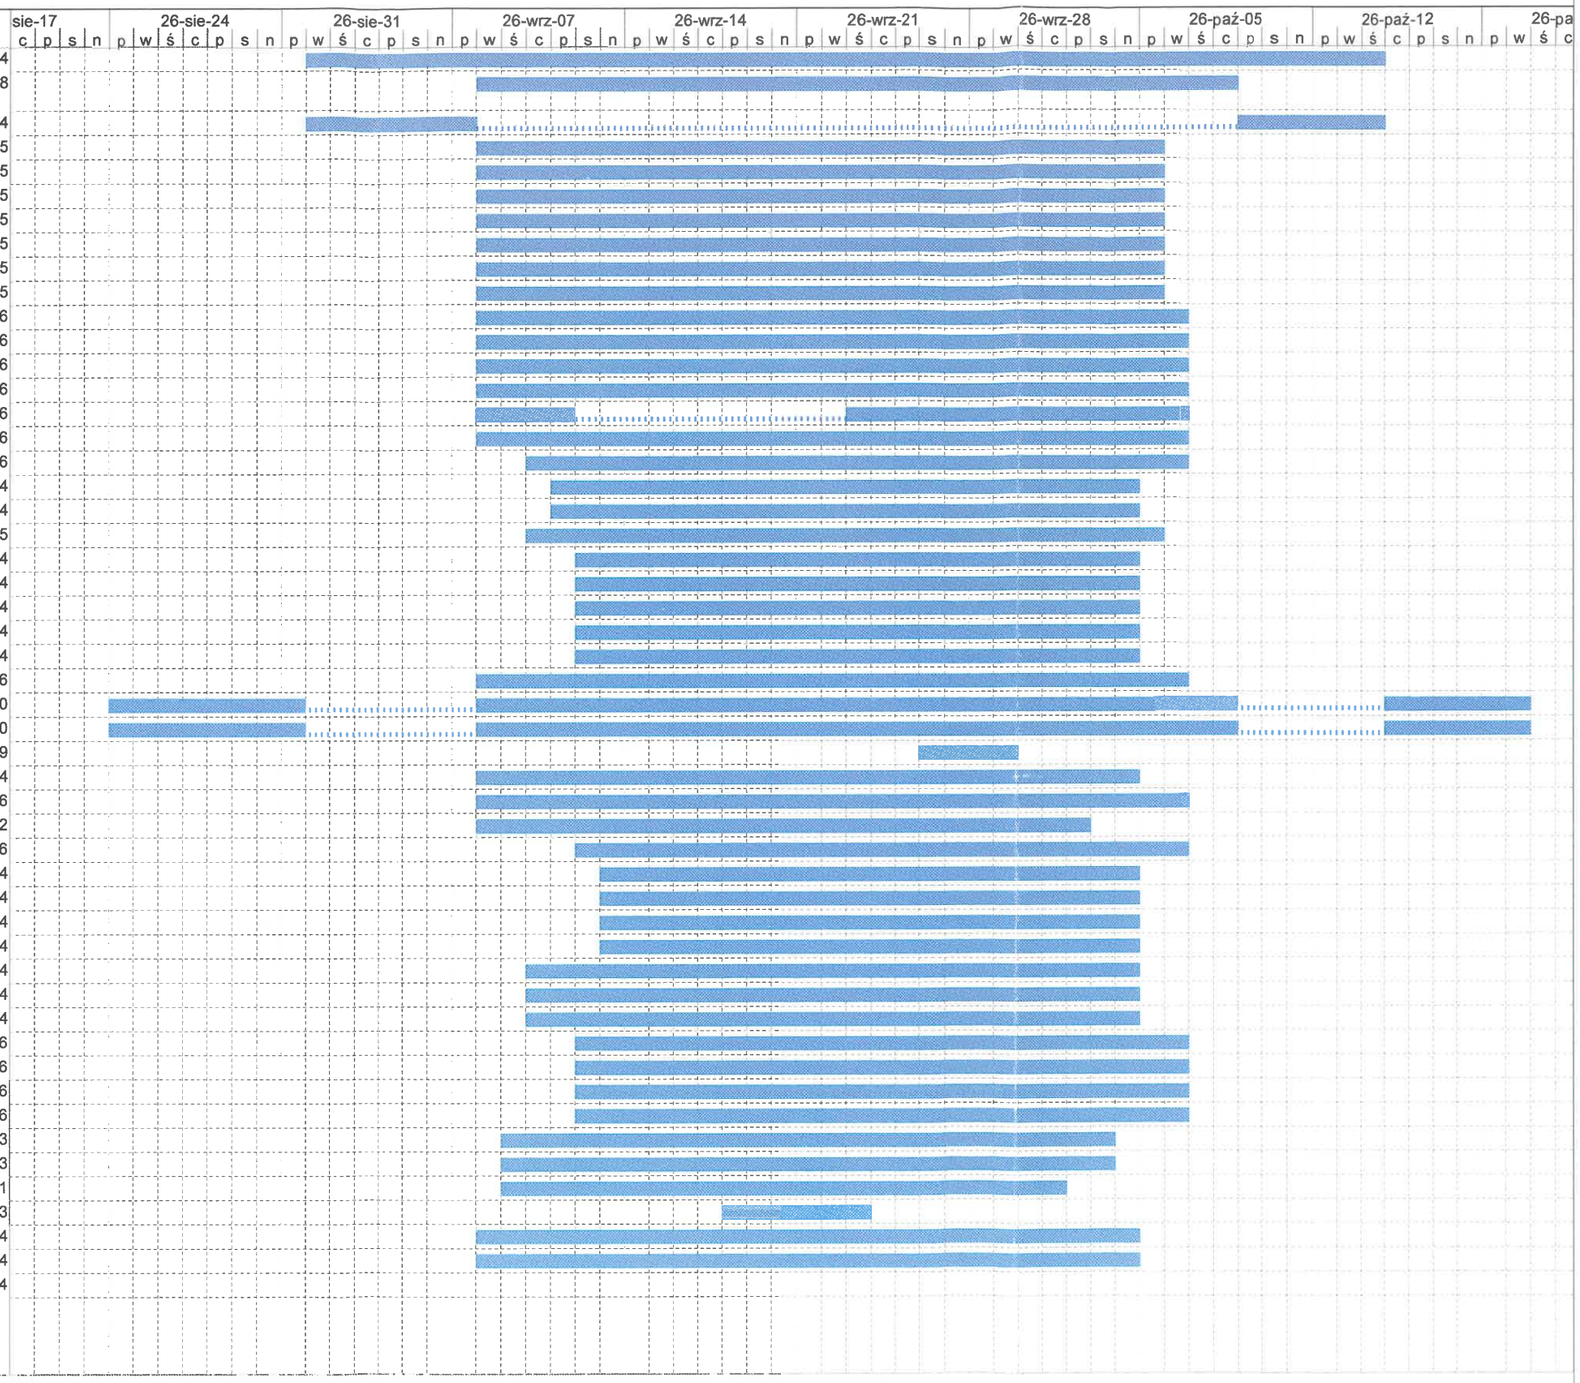

Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami
Radosław Żółtowski
Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami
Łukasz Rybicki

Mariusz Pawlak
Młodszy Specjalista
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami

Tomasz Smulewicz
Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół Inżynierów Kompleksu Gospodarki Gazami
Branża Automatyczna i Elektryczna

Dariusz Solak
Kierownik
Zespół ds. Remontów Budowlanych

Główny Inżynier
Blok Gospodarki Gazami
Wydział Utylizacji Gazów
Jarosław Krzemiński

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami
Łukasz Rybicki

Sebastian Solak
p.o. Kierownik
Zespół Inżynierów Kompleksu Gospodarki Gazami
Branża Mechaniczna

28.08.2025	St.Inż.Wsp.Prod. (br.mech.)	Inż.Wsp. Prod. (br.PIA)	Inż. Wsp.Prod.(br.Elekt.)	Kierownik (TCI)	Gł.Inż PR5/1	Kierownik TR5/1
