

Harmonogram miesięczny postoju remontowego sekcji 400/500 Paraksylenu (09.04. - 19.05.2027r)

Id.	Tryb zadania	Branża	Nr zakresu	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1		**M,A,E,W**		**Wypad remontowy**	41 dn?	pią, 27-04-09	śro, 27-05-19
2		**M,A,E,W**		**Remont planowy**	24 dn?	pią, 27-04-16	nie, 27-05-09
213		**A**	**1**	**Prace ogólne**	21 dn	pią, 27-04-16	czw, 27-05-06
214		**A**	**2**	**Układy ISO**	**18 dn?**	**pią, 27-04-16**	**pon, 27-05-03**
215		**A**		*Demontaże, transport na warsztat*	7 dn?	pią, 27-04-16	czw, 27-04-22
216		**A**		*Prace na warsztacie*	12 dn?	pon, 27-04-19	pią, 27-04-30
217		**A**		*Montaż, uruchomienie*	7 dn?	wto, 27-04-27	pon, 27-05-03
218		**A**	**3A**	**Zawory regulacyjne, MOV**	**19 dn?**	**pią, 27-04-16**	**wto, 27-05-04**
219		**A**		*Odłączenia tras sygnałowych, zasilania*	6 dn?	pią, 27-04-16	śro, 27-04-21
220		**A**		*Prace na warsztacie*	11 dn?	pon, 27-04-19	czw, 27-04-29
221		**A**		*Podłączenia, test, kasowanie błędów*	9 dn?	pon, 27-04-26	wto, 27-05-04
222		**A**	**3B**	**Zawory blokadowe**	**19 dn?**	**pią, 27-04-16**	**wto, 27-05-04**
223		**A**		*Odłączenia tras sygnałowych, zasilania*	6 dn?	pią, 27-04-16	śro, 27-04-21
224		**A**		*Prace na warsztacie*	11 dn?	pon, 27-04-19	czw, 27-04-29
225		**A**		*Podłączenia, test, kasowanie błędów*	9 dn?	pon, 27-04-26	wto, 27-05-04
226		**A**	**4**	**Przetworniki/czujniki blokadowe**	**18 dn?**	**pią, 27-04-16**	**pon, 27-05-03**
227		**A**		*Demontaże, transport na warsztat*	7 dn?	pią, 27-04-16	czw, 27-04-22
228		**A**		*Prace na warsztacie*	10 dn?	sob, 27-04-17	pon, 27-04-26
229		**A**		*Montaż, uruchomienie*	11 dn?	pią, 27-04-23	pon, 27-05-03
230		**A**	**5**	**Pomiary poziomu - poziomowskazy**	**19 dn?**	**sob, 27-04-17**	**śro, 27-05-05**
231		**A**		*Przygotowanie do demontażu*	4 dn?	sob, 27-04-17	wto, 27-04-20
232		**A**		*Prace warsztatowe*	8 dn?	wto, 27-04-20	wto, 27-04-27
233		**A**		*Uruchomienie*	8 dn?	śro, 27-04-28	śro, 27-05-05
234		**A**	**6**	**Układy bilansowe**	**15 dn?**	**czw, 27-04-22**	**czw, 27-05-06**
235		**A**		*Demontaże, transport na warsztat*	5 dn?	czw, 27-04-22	pon, 27-04-26

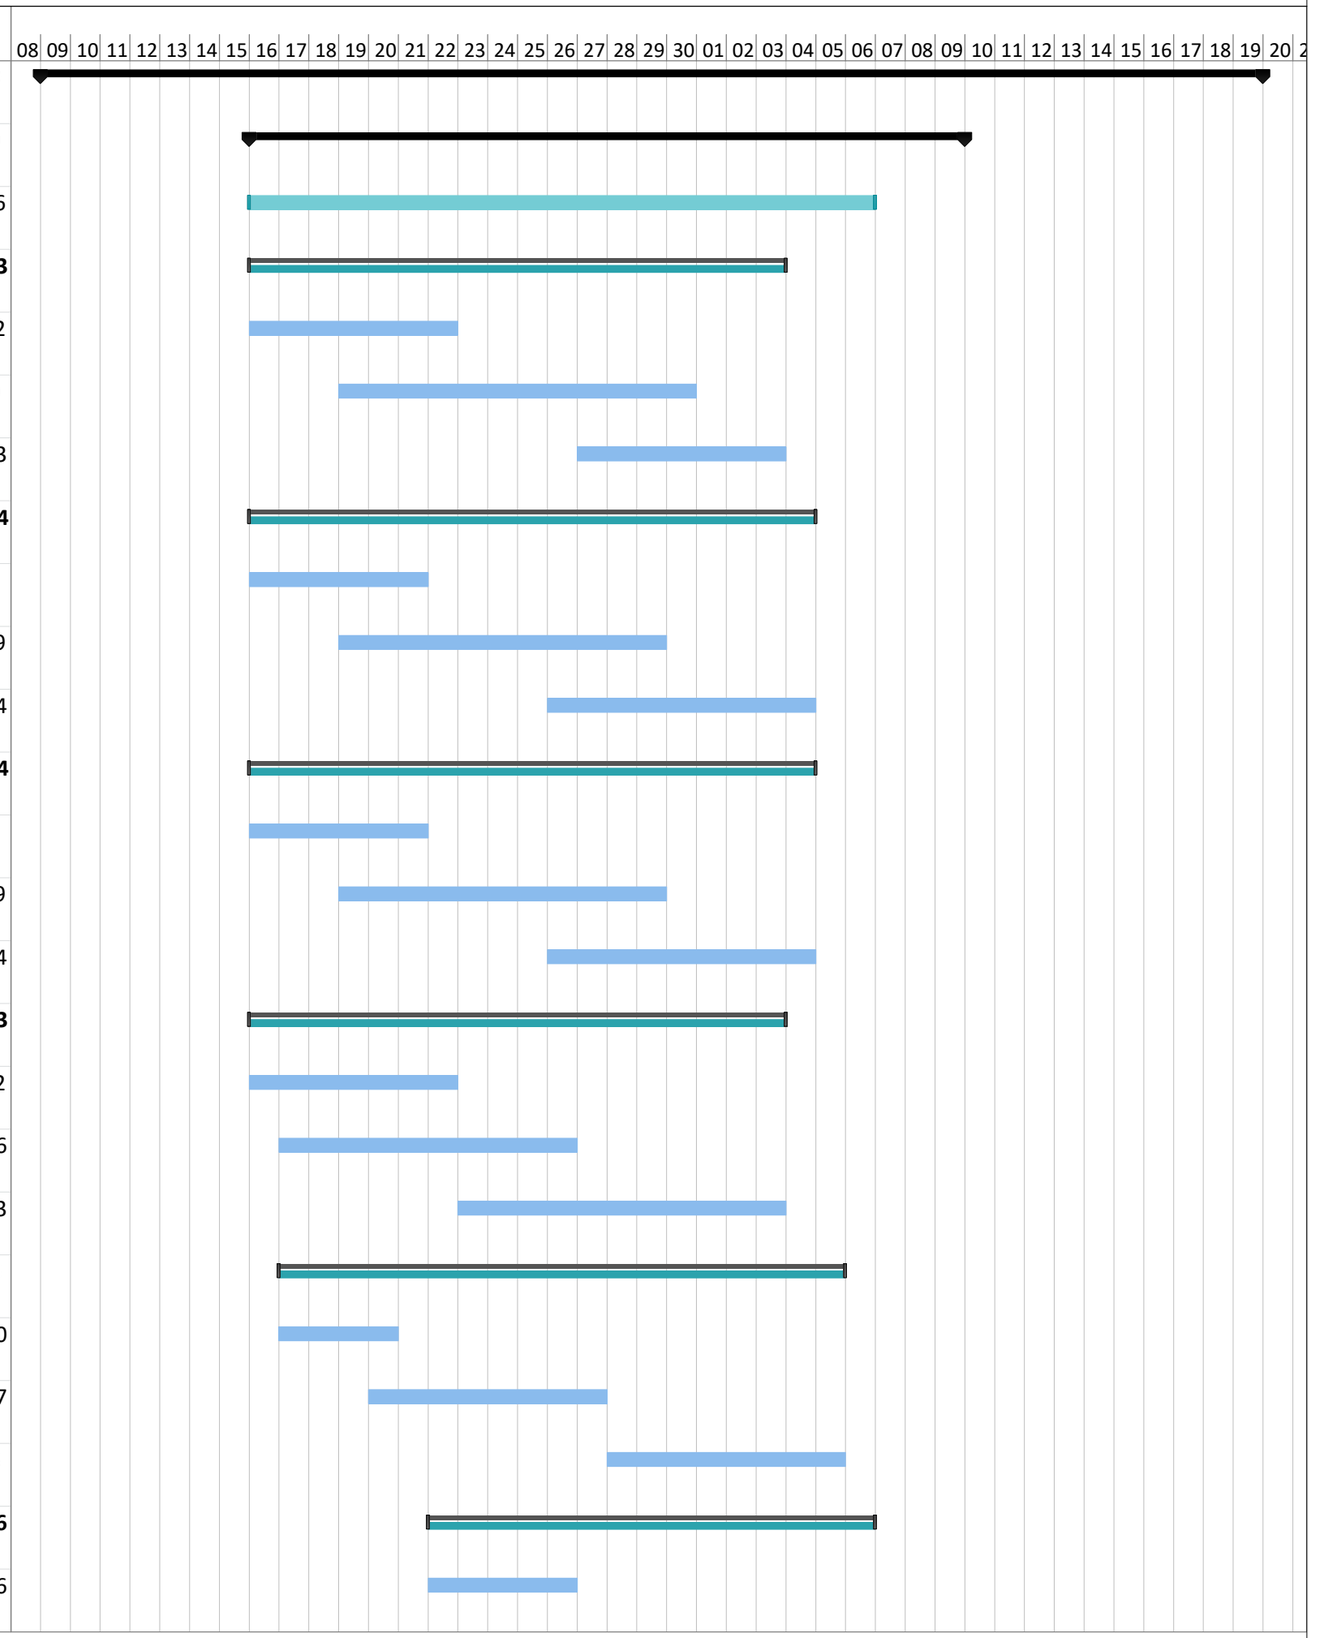


Harmonogram miesięczny postoju remontowego sekcji 400/500 Paraksylenu (09.04. - 19.05.2027r)

Id.	Tryb zadania	Branża	Nr zakresu	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
236		A		*Prace na warsztacie*	8 dn?	pią, 27-04-23	pią, 27-04-30
237		A		*Montaż, uruchomienie*	8 dn?	czw, 27-04-29	czw, 27-05-06
238		A	7	**Kryzy pomiarowe**	**20 dn?**	**sob, 27-04-17**	**czw, 27-05-06**
239		A		*Odłączenie tras impulsowych*	6 dn?	sob, 27-04-17	czw, 27-04-22
240		A		*Prace warsztatowe*	11 dn?	wto, 27-04-20	pią, 27-04-30
241		A		*Weryfikacja kierunku montażu, podłączenie tr*	10 dn?	wto, 27-04-27	czw, 27-05-06
242		A	8	**Testy PST**	6 dn	czw, 27-04-29	wto, 27-05-04
243		A	9	**Piece technologiczne**	**19 dn?**	**nie, 27-04-18**	**czw, 27-05-06**
244		A		*Demontaż, konserwacja zapalarek, flamerodó*	6 dn?	nie, 27-04-18	pią, 27-04-23
245		A		*Czyszczenie soczewek skanerów płomieni, funk*	5 dn?	pią, 27-04-30	wto, 27-05-04
246		A		*Przygotowanie do demntażu siłowników*	1 dzień?	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19
247		A		*Warsztat - kontrola elementów wewnętrznych*	11 dn?	wto, 27-04-20	pią, 27-04-30
248		A		*Podłączenie, uruchomienie, testy*	8 dn?	czw, 27-04-29	czw, 27-05-06
249		A	10	**Czujniki temperatury pomp i silników**	**21 dn?**	**pią, 27-04-16**	**czw, 27-05-06**
250		A		Odłączenie, demontaż czujników	11 dn?	pią, 27-04-16	pon, 27-04-26
251		A		Montaż, podłączenie czujników	11 dn?	pon, 27-04-26	czw, 27-05-06
252		A	11	**Aparatura analityczna**	**21 dn?**	**pią, 27-04-16**	**czw, 27-05-06**
253		A		Przegląd chromatografów i analizatorów,kons	16 dn?	pią, 27-04-16	sob, 27-05-01
254		A		Kalibracja	4 dn?	pon, 27-05-03	czw, 27-05-06
255		A	12	**Czujniki wibracji**	**21 dn?**	**pią, 27-04-16**	**czw, 27-05-06**
256		A		Odłączenie, demontaż czujników	11 dn?	pią, 27-04-16	pon, 27-04-26
257		A		Montaż, podłączenie czujników	5 dn?	wto, 27-04-27	sob, 27-05-01
258		A		Testy mechaniczne czujników wibracji	4 dn?	pon, 27-05-03	czw, 27-05-06
259		A	13	**Testy blokad**	4 dn	pon, 27-05-03	czw, 27-05-06
260		A	14	**Przegląd systemu szczelności den**	**9 dn?**	**śro, 27-04-28**	**czw, 27-05-06**

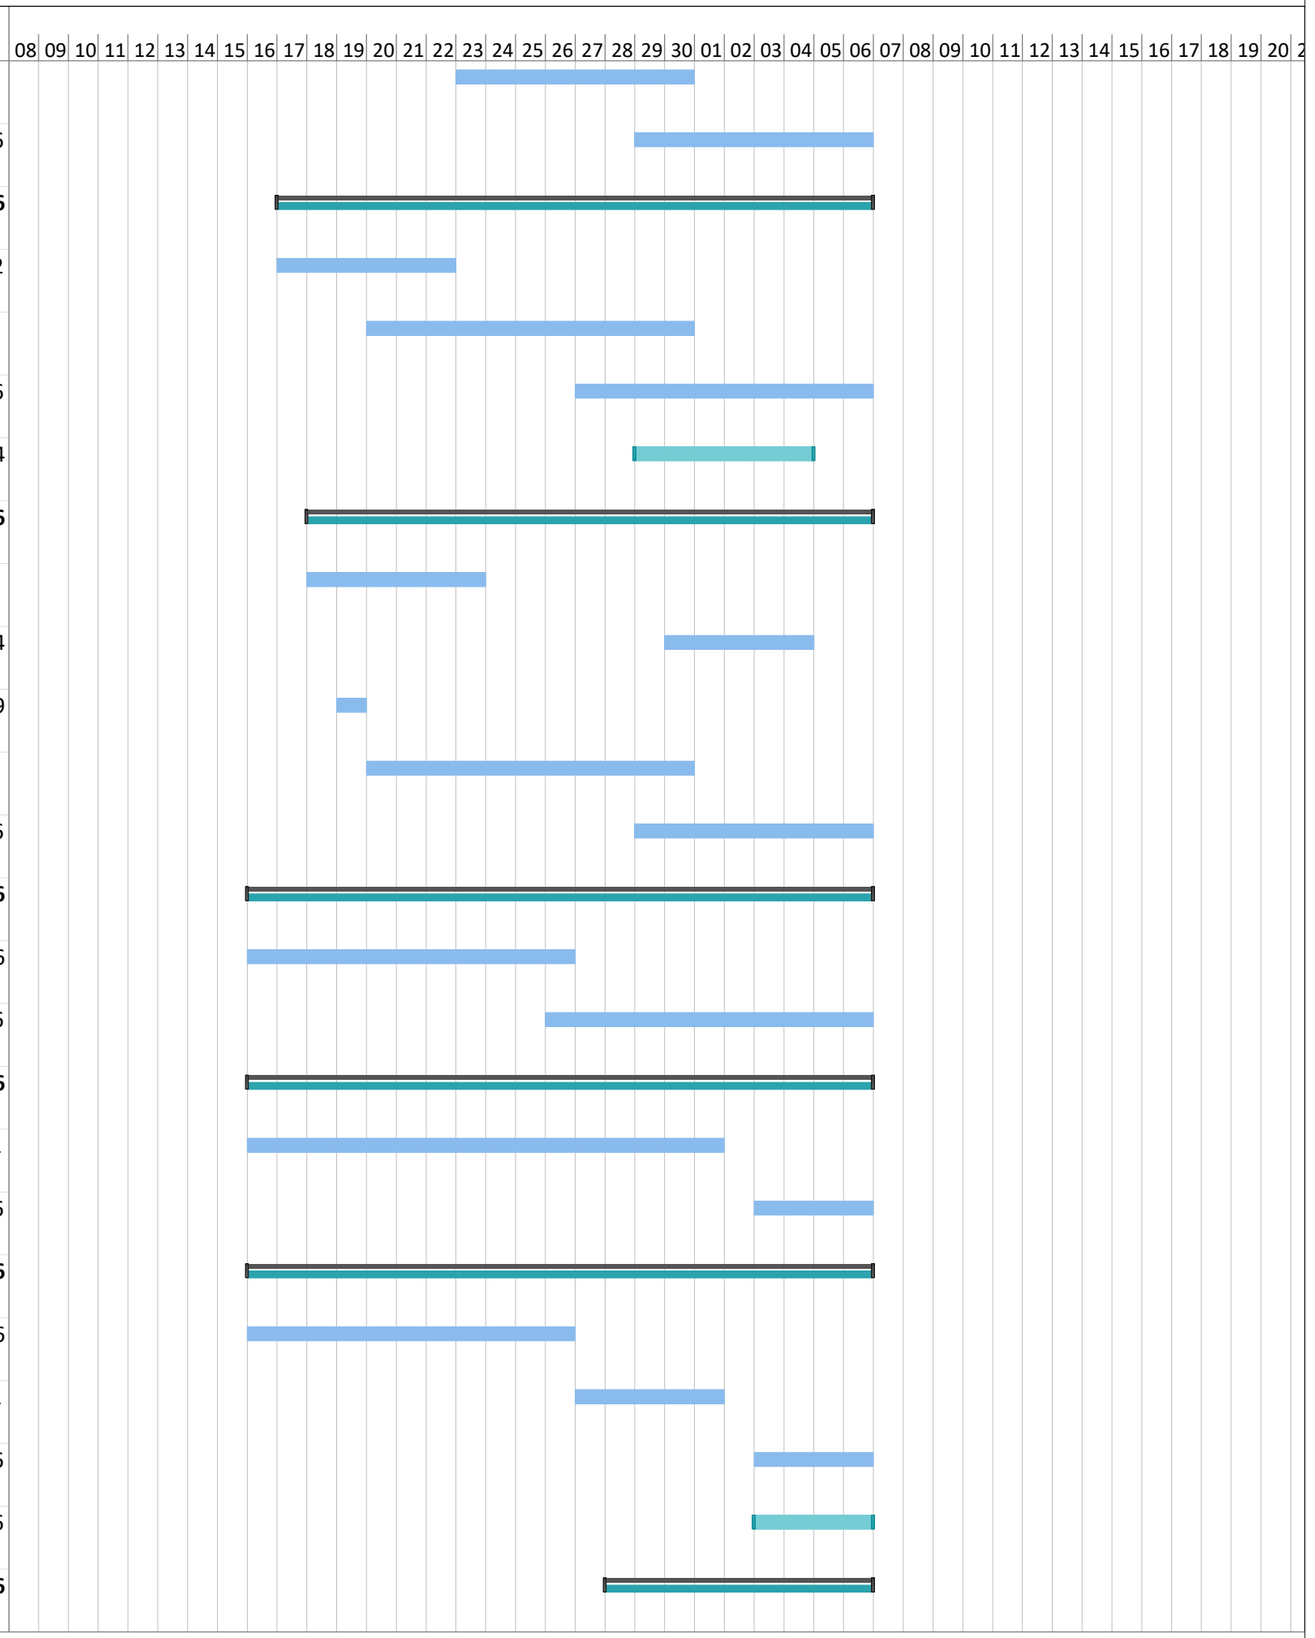

Harmonogram miesięczny postoju remontowego sekcji 400/500 Paraksylenu (09.04. - 19.05.2027r)

Id.	Tryb zadania	Branża	Nr zakresu	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
261		**A**		*Demontaże, transport na warsztat*	3 dn?	śro, 27-04-28	pią, 27-04-30
262		**A**		*Prace na warsztacie*	6 dn?	śro, 27-04-28	pon, 27-05-03
263		**A**		*Montaż, uruchomienie*	7 dn?	pią, 27-04-30	czw, 27-05-06
264		**A**	**16**	**Asysta remontowa zaworów**	16 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-05-04
265		**A**	**17**	**Przetworniki Vortex Kalibracja**	**21 dn?**	**pią, 27-04-16**	**czw, 27-05-06**
266		**A**		*Przygotowanie do demontażu*	2 dn?	pią, 27-04-16	sob, 27-04-17
267		**A**		*Prace sprawdzające, kalibracje*	16 dn?	pon, 27-04-19	wto, 27-05-04
268		**A**		*Podłączenie, uruchomienie*	3 dn?	wto, 27-05-04	czw, 27-05-06
269		**A**	**18**	**Układy bilansowe - masowce**	**21 dn?**	**pią, 27-04-16**	**czw, 27-05-06**
270		**A**		*Przygotowanie do demontażu*	2 dn?	pią, 27-04-16	sob, 27-04-17
271		**A**		*Prace sprawdzające, kalibracje*	16 dn?	pon, 27-04-19	wto, 27-05-04
272		**A**		*Podłączenie, uruchomienie*	3 dn?	wto, 27-05-04	czw, 27-05-06

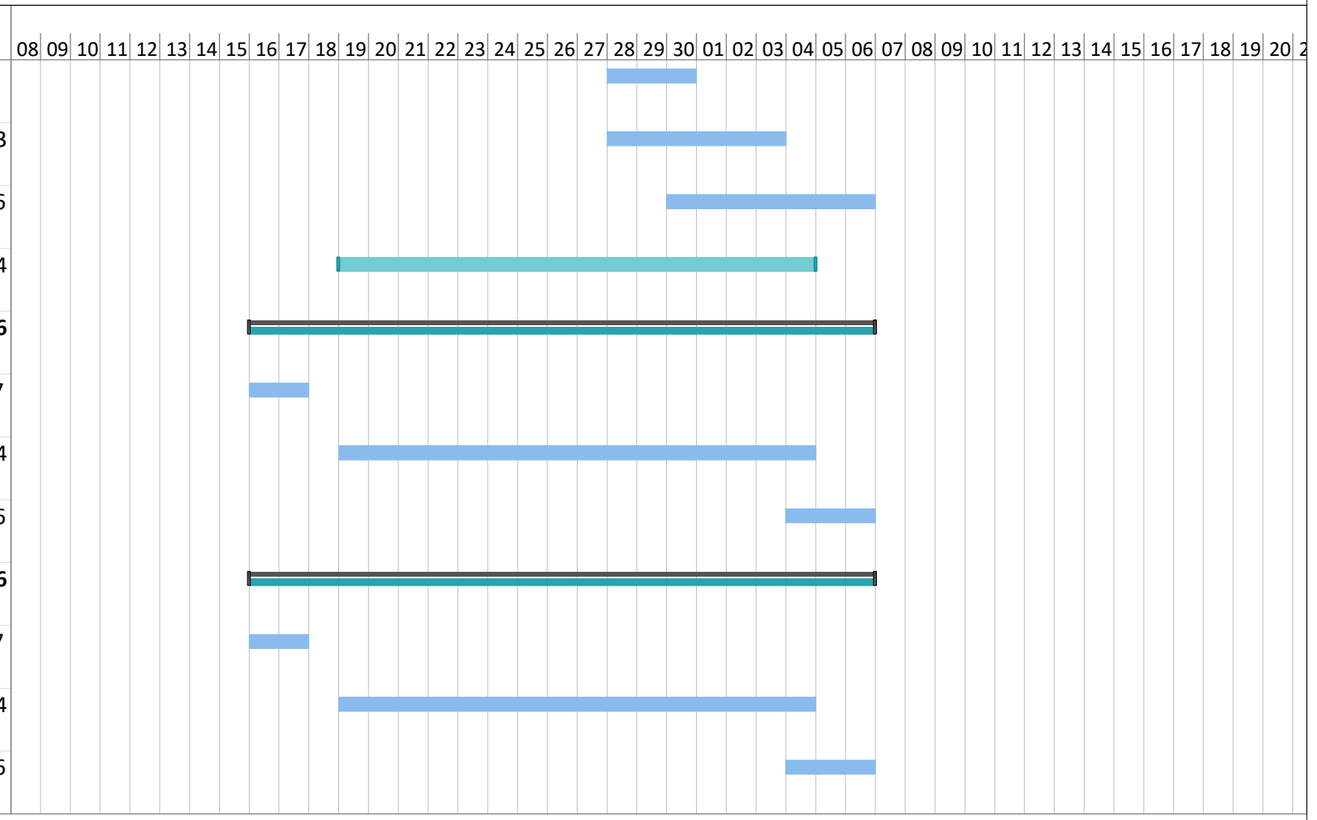

Tomasz Szyda
Elektronicznie podpisany przez Tomasz Szyda
Data: 2026.10.15 09:07:07 +02'00'

Gasik Mariusz
Elektronicznie podpisany przez Gasik Mariusz
Data: 2026.10.15 08:36:42 +02'00'

Piotr Polek
Elektronicznie podpisany przez Piotr Polek
Data: 2026.10.15 08:41:56 +02'00'
