

Id.	Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia					2027-maja														
										17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10	
1					Postój remontowy HON VI - 2027	37 dn	pią, 27-04-02	sob, 27-05-08																					
2					02.04.2027 - 08.05.2027 - 37 dni																								
3					Prace remontowe HON VI - 2027	33 dn	nie, 27-04-04	czw, 27-05-06																					
4					04.04.2027 - 06.05.2027 - 33 dni																								
5					Dekontaminacja - 11C-03, 12C-01	4 dn	pon, 27-04-05	czw, 27-04-08																					
6		104	M	M1	Prace pomocnicze przy dekontaminacji	4 dn	pon, 27-04-05	czw, 27-04-08																					
7		2	M	M1	Remont wymiennika 11E-01A	14 dn	pon, 27-04-05	nie, 27-04-18																					
8					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																					
9					M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	wto, 27-04-06	wto, 27-04-06																					
10					D-ż aparatu	3 dn	śro, 27-04-07	pią, 27-04-09																					
11					Mycie aparatu	2 dn	sob, 27-04-10	nie, 27-04-11																					
12					Rewizja UDT	1 dzień	pon, 27-04-12	pon, 27-04-12																					
13					M-ż aparatu	3 dn	wto, 27-04-13	czw, 27-04-15																					
14					Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	pią, 27-04-16	sob, 27-04-17																					
15					D-ż zaślepek	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18																					
16		3	M	M1	Remont wymiennika 11E-01B	14 dn	pon, 27-04-05	nie, 27-04-18																					
17					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																					
18					M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	wto, 27-04-06	wto, 27-04-06																					
19					D-ż aparatu	3 dn	śro, 27-04-07	pią, 27-04-09																					
20					Mycie aparatu	2 dn	sob, 27-04-10	nie, 27-04-11																					
21					Rewizja UDT	1 dzień	pon, 27-04-12	pon, 27-04-12																					
22					M-ż aparatu	3 dn	wto, 27-04-13	czw, 27-04-15																					
23					Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	pią, 27-04-16	sob, 27-04-17																					
24					D-ż zaślepek	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18																					
25		4	M	M1	Remont wymiennika 11E-01C	14 dn	pon, 27-04-05	nie, 27-04-18																					
26					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																					
27					M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	wto, 27-04-06	wto, 27-04-06																					
28					D-ż aparatu	3 dn	śro, 27-04-07	pią, 27-04-09																					
29					Mycie aparatu	2 dn	sob, 27-04-10	nie, 27-04-11																					
30					Rewizja UDT	1 dzień	pon, 27-04-12	pon, 27-04-12																					
31					M-ż aparatu	3 dn	wto, 27-04-13	czw, 27-04-15																					
32					Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	pią, 27-04-16	sob, 27-04-17																					
33					D-ż zaślepek	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18																					
34		5	M	M1	Remont wymiennika 11E-02	15 dn	pon, 27-04-05	pon, 27-04-19																					
35					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																					
36					M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	wto, 27-04-06	wto, 27-04-06																					
37					D-ż aparatu	3 dn	śro, 27-04-07	pią, 27-04-09																					
38					Mycie aparatu	2 dn	sob, 27-04-10	nie, 27-04-11																					
39					Rewizja UDT	1 dzień	pon, 27-04-12	pon, 27-04-12																					
40					M-ż nowego wkładu	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14																					
41					M-ż aparatu	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16																					
42					Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18																					
43					D-ż zaślepek	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19																					

Strona 1

Id.	Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia														2027-maja					
										17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10	
44		6	M	M1	Remont wymiennika 11E-03A	13 dn	pon, 27-04-05	sob, 27-04-17																					
45					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																					
46					M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	wto, 27-04-06	wto, 27-04-06																					
47					D-ż aparatu	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08																					
48					Mycie aparatu	2 dn	pią, 27-04-09	sob, 27-04-10																					
49					Rewizja UDT	1 dzień	nie, 27-04-11	nie, 27-04-11																					
50					M-ż aparatu	3 dn	pon, 27-04-12	śro, 27-04-14																					
51					Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16																					
52					D-ż zaślepek	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17																					
53		7	M	M1	Remont wymiennika 11E-03B	13 dn	pon, 27-04-05	sob, 27-04-17																					
54					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																					
55					M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	wto, 27-04-06	wto, 27-04-06																					
56					D-ż aparatu	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08																					
57					Mycie aparatu	2 dn	pią, 27-04-09	sob, 27-04-10																					
58					Rewizja UDT	1 dzień	nie, 27-04-11	nie, 27-04-11																					
59					M-ż aparatu	3 dn	pon, 27-04-12	śro, 27-04-14																					
60					Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16																					
61					D-ż zaślepek	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17																					
62		8	M	M1	Remont wymiennika 11E-04A	17 dn	pon, 27-04-05	śro, 27-04-21																					
63					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																					
64					M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	wto, 27-04-06	śro, 27-04-07																					
65					D-ż aparatu	3 dn	czw, 27-04-08	sob, 27-04-10																					
66					Mycie aparatu	2 dn	nie, 27-04-11	pon, 27-04-12																					
67					Rewizja UDT	1 dzień	wto, 27-04-13	wto, 27-04-13																					
68					M-ż aparatu	4 dn	śro, 27-04-14	sob, 27-04-17																					
69					Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19																					
70					D-ż zaślepek	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21																					
71		9	M	M1	Remont wymiennika 11E-04B	17 dn	pon, 27-04-05	śro, 27-04-21																					
72					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																					
73					M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	wto, 27-04-06	śro, 27-04-07																					
74					D-ż aparatu	3 dn	czw, 27-04-08	sob, 27-04-10																					
75					Mycie aparatu	2 dn	nie, 27-04-11	pon, 27-04-12																					
76					Rewizja UDT	1 dzień	wto, 27-04-13	wto, 27-04-13																					
77					M-ż aparatu	4 dn	śro, 27-04-14	sob, 27-04-17																					
78					Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19																					
79					D-ż zaślepek	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21																					
80		10	M	M1	Remont wymiennika 11E-04C	17 dn	pon, 27-04-05	śro, 27-04-21																					
81					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																					
82					M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	wto, 27-04-06	śro, 27-04-07																					
83					D-ż aparatu	3 dn	czw, 27-04-08	sob, 27-04-10																					
84					Mycie aparatu	2 dn	nie, 27-04-11	pon, 27-04-12																					
85					Rewizja UDT	1 dzień	wto, 27-04-13	wto, 27-04-13																					



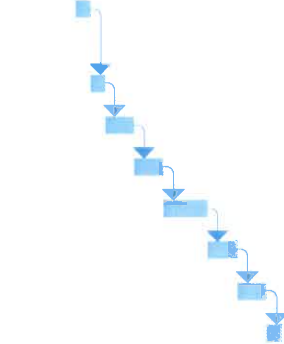
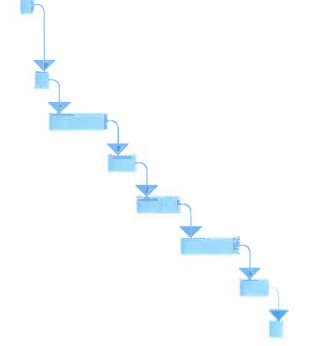
Id.		Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia														2027-maja				
											17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10
86						M-ż aparatu	4 dn	śro, 27-04-14	sob, 27-04-17																				
87						Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19																				
88						D-ż zaślepek	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21																				
89			11	M	M1	Remont wymiennika 11E-05	13 dn	pon, 27-04-05	sob, 27-04-17																				
90						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																				
91						M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	wto, 27-04-06	wto, 27-04-06																				
92						D-ż aparatu	3 dn	śro, 27-04-07	pią, 27-04-09																				
93						Mycie aparatu	2 dn	sob, 27-04-10	nie, 27-04-11																				
94						Rewizja UDT	1 dzień	pon, 27-04-12	pon, 27-04-12																				
95						M-ż aparatu	3 dn	wto, 27-04-13	czw, 27-04-15																				
96						Próba ciśnieniowa UDT	1 dzień	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16																				
97						D-ż zaślepek	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17																				
98			12	M	M1	Remont wymiennika 11E-06	16 dn	pon, 27-04-05	wto, 27-04-20																				
99						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																				
100						M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	wto, 27-04-06	wto, 27-04-06																				
101						D-ż aparatu	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08																				
102						Mycie aparatu	3 dn	pią, 27-04-09	nie, 27-04-11																				
103						Rewizja UDT	2 dn	pon, 27-04-12	wto, 27-04-13																				
104						M-ż aparatu	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14																				
105						Próba ciśnieniowa UDT	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17																				
106						D-ż zaślepek	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19																				
107			13	M	M2	Remont chłodnicy powietrznej 11E-07A	15 dn	pon, 27-04-05	pon, 27-04-19																				
108						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																				
109						M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	wto, 27-04-06	wto, 27-04-06																				
110						D-ż korków	1 dzień	śro, 27-04-07	śro, 27-04-07																				
111						D-ż osłon z blachy	1 dzień	czw, 27-04-08	czw, 27-04-08																				
112						Mycie apartu	2 dn	pią, 27-04-09	sob, 27-04-10																				
113						Czyszczenie zewnętrzne złączy spawanych	1 dzień	nie, 27-04-11	nie, 27-04-11																				
114						Badania UT	2 dn	pon, 27-04-12	wto, 27-04-13																				
115						M-ż osłon z blachy	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14																				
116						M-ż korków	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17																				
117						Próba ciśnieniowa UDT	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18																				
118						D-ż zaślepek	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19																				
119			14	M	M2	Remont chłodnicy powietrznej 11E-07B	15 dn	pon, 27-04-05	pon, 27-04-19																				
120						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																				
121						M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	wto, 27-04-06	wto, 27-04-06																				
122						D-ż korków	1 dzień	śro, 27-04-07	śro, 27-04-07																				
123						D-ż osłon z blachy	1 dzień	czw, 27-04-08	czw, 27-04-08																				
124						Mycie apartu	2 dn	pią, 27-04-09	sob, 27-04-10																				
125						Czyszczenie zewnętrzne złączy spawanych	1 dzień	nie, 27-04-11	nie, 27-04-11																				
126						Badania UT	2 dn	pon, 27-04-12	wto, 27-04-13																				
127						M-ż osłon z blachy	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14																				
128						M-ż korków	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17																				

Id.		Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia														2027-maja				
											17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10
129						Próba ciśnieniowa UDT	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18																				
130						D-ż zaślepek	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19																				
131			15	M	M2	Remont chłodziwy powietrznej 11E-08A	15 dn	pon, 27-04-05	pon, 27-04-19																				
132						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																				
133						M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	wto, 27-04-06	wto, 27-04-06																				
134						D-ż korków	1 dzień	śro, 27-04-07	śro, 27-04-07																				
135						D-ż osłon z blachy	1 dzień	czw, 27-04-08	czw, 27-04-08																				
136						Mycie apartu	2 dn	pią, 27-04-09	sob, 27-04-10																				
137						Czyszczenie zewnętrzne złączy spawanych	1 dzień	nie, 27-04-11	nie, 27-04-11																				
138						Badania UT	2 dn	pon, 27-04-12	wto, 27-04-13																				
139						M-ż osłon z blachy	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14																				
140						M-ż korków	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17																				
141						Próba ciśnieniowa UDT	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18																				
142						D-ż zaślepek	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19																				
143			16	M	M2	Remont chłodziwy powietrznej 11E-08B	15 dn	wto, 27-04-06	wto, 27-04-20																				
144						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	wto, 27-04-06	wto, 27-04-06																				
145						M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	śro, 27-04-07	śro, 27-04-07																				
146						D-ż korków	1 dzień	czw, 27-04-08	czw, 27-04-08																				
147						D-ż osłon z blachy	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09																				
148						Mycie apartu	2 dn	sob, 27-04-10	nie, 27-04-11																				
149						Czyszczenie zewnętrzne złączy spawanych	1 dzień	pon, 27-04-12	pon, 27-04-12																				
150						Badania UT	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14																				
151						M-ż osłon z blachy	1 dzień	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15																				
152						M-ż korków	3 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18																				
153						Próba ciśnieniowa UDT	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19																				
154						D-ż zaślepek	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20																				
155			17	M	M2	Remont generatora pary 11E-09	14 dn	pią, 27-04-09	czw, 27-04-22																				
156						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09																				
157						M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	sob, 27-04-10	sob, 27-04-10																				
158						D-ż aparatu	3 dn	nie, 27-04-11	wto, 27-04-13																				
159						Mycie aparatu	2 dn	śro, 27-04-14	czw, 27-04-15																				
160						Rewizja UDT	1 dzień	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16																				
161						M-ż aparatu	3 dn	sob, 27-04-17	pon, 27-04-19																				
162						Próba ciśnieniowa UDT	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20																				
163						D-ż zaślepek	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22																				
164			18	M	M2	Remont chłodziwy powietrznej 11E-10A	13 dn	pon, 27-04-05	sob, 27-04-17																				
165						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																				
166						M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	wto, 27-04-06	wto, 27-04-06																				
167						D-ż korków	1 dzień	śro, 27-04-07	śro, 27-04-07																				
168						D-ż osłon z blachy	1 dzień	czw, 27-04-08	czw, 27-04-08																				
169						Czyszczenie zewnętrzne złączy spawanych	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09																				
170						Badania UT	2 dn	sob, 27-04-10	nie, 27-04-11																				
171						M-ż osłon z blachy	1 dzień	pon, 27-04-12	pon, 27-04-12																				

Long R. M. K. L.

Id.		Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia														2027-maja				
											17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10
172			19	M	M2	M-ż korków	3 dn	wto, 27-04-13 czw, 27-04-15																					
173						Próba ciśnieniowa UDT	1 dzień	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16																				
174						D-ż zaślepek	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17																				
175						Remont chłodnicy powietrznej 11E-10B	13 dn	pon, 27-04-05 sob, 27-04-17																					
176						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																				
177						M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	wto, 27-04-06	wto, 27-04-06																				
178						D-ż korków	1 dzień	śro, 27-04-07	śro, 27-04-07																				
179						D-ż osłon z blachy	1 dzień	czw, 27-04-08	czw, 27-04-08																				
180						Czyszczenie zewnętrzne złączy spawanych	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09																				
181						Badania UT	2 dn	sob, 27-04-10	nie, 27-04-11																				
182			20	M	M2	M-ż osłon z blachy	1 dzień	pon, 27-04-12	pon, 27-04-12																				
183						M-ż korków	3 dn	wto, 27-04-13	czw, 27-04-15																				
184						Próba ciśnieniowa UDT	1 dzień	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16																				
185						D-ż zaślepek	1 dzień	sob, 27-04-17	sob, 27-04-17																				
186						Remont chłodnicy powietrznej 11E-11A	19 dn	czw, 27-04-08 pon, 27-04-26																					
187						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	czw, 27-04-08	czw, 27-04-08																				
188						M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09																				
189						D-ż korków	3 dn	sob, 27-04-10	pon, 27-04-12																				
190						D-ż osłon z blachy	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14																				
191						Czyszczenie zewnętrzne złączy spawanych	1 dzień	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15																				
192			21	M	M2	Badania UT	3 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18																				
193						M-ż osłon z blachy	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20																				
194						M-ż korków	3 dn	śro, 27-04-21	pią, 27-04-23																				
195						Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25																				
196						D-ż zaślepek	1 dzień	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26																				
197						Remont chłodnicy powietrznej 11E-11B	19 dn	czw, 27-04-08 pon, 27-04-26																					
198						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	czw, 27-04-08	czw, 27-04-08																				
199						M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09																				
200						D-ż korków	3 dn	sob, 27-04-10	pon, 27-04-12																				
201						D-ż osłon z blachy	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14																				
202			22	M	M2	Czyszczenie zewnętrzne złączy spawanych	1 dzień	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15																				
203						Badania UT	3 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18																				
204						M-ż osłon z blachy	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20																				
205						M-ż korków	3 dn	śro, 27-04-21	pią, 27-04-23																				
206						Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25																				
207						D-ż zaślepek	1 dzień	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26																				
208						Remont chłodnicy powietrznej 11E-11C	19 dn	pią, 27-04-09 wto, 27-04-27																					
209						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09																				
210						M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	sob, 27-04-10	sob, 27-04-10																				
211						D-ż korków	3 dn	nie, 27-04-11	wto, 27-04-13																				
212						D-ż osłon z blachy	2 dn	śro, 27-04-14	czw, 27-04-15																				
213						Czyszczenie zewnętrzne złączy spawanych	1 dzień	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16																				
214						Badania UT	3 dn	sob, 27-04-17	pon, 27-04-19																				

Swid D W Kink

Id.	Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia														2027-maja			
										17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07
215		22	M	M2	M-ż osłon z blachy	2 dn	wto, 27-04-20 śro, 27-04-21																				
216					M-ż korków	3 dn	czw, 27-04-22 sob, 27-04-24																				
217					Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	nie, 27-04-25 pon, 27-04-26																				
218					D-ż zaślepek	1 dzień	wto, 27-04-27 wto, 27-04-27																				
219					Remont chłodnicy powietrznej 11E-12	10 dn	pon, 27-04-19 śro, 27-04-28																				
220					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-19 pon, 27-04-19																				
221					M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	wto, 27-04-20 wto, 27-04-20																				
222					D-ż korków, osłon z blachy	2 dn	śro, 27-04-21 czw, 27-04-22																				
223					Czyszczenie zewnętrzne złączy spawanych	1 dzień	pią, 27-04-23 pię, 27-04-23																				
224					Badania UT	2 dn	sob, 27-04-24 nie, 27-04-25																				
225		24	M	M2	M-ż osłon z blachy, korków	1 dzień	pon, 27-04-26 pon, 27-04-26																				
226					Próba ciśnieniowa UDT	1 dzień	wto, 27-04-27 wto, 27-04-27																				
227					D-ż zaślepek	1 dzień	śro, 27-04-28 śro, 27-04-28																				
228					Remont chłodnicy powietrznej 11E-14X	14 dn	wto, 27-04-13 pon, 27-04-26																				
229					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	wto, 27-04-13 wto, 27-04-13																				
230					M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	śro, 27-04-14 śro, 27-04-14																				
231					D-ż korków, osłon z blachy	2 dn	czw, 27-04-15 pię, 27-04-16																				
232					Czyszczenie zewnętrzne złączy spawanych	2 dn	sob, 27-04-17 nie, 27-04-18																				
233					Badania UT	3 dn	pon, 27-04-19 śro, 27-04-21																				
234					M-ż osłon z blachy, korków	2 dn	czw, 27-04-22 pię, 27-04-23																				
235		Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	sob, 27-04-24 nie, 27-04-25																							
236		D-ż zaślepek	1 dzień	pon, 27-04-26 pon, 27-04-26																							
237		25	M	M2	Remont chłodnicy 11E-16			18 dn	czw, 27-04-08 nie, 27-04-25																		
238		Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	czw, 27-04-08 czw, 27-04-08																							
239		M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	pią, 27-04-09 pię, 27-04-09																							
240		D-ż aparatu	4 dn	sob, 27-04-10 wto, 27-04-13																							
241		Mycie aparatu	2 dn	śro, 27-04-14 czw, 27-04-15																							
242		Rewizja UDT	3 dn	pią, 27-04-16 nie, 27-04-18																							
243		M-ż aparatu	4 dn	pon, 27-04-19 czw, 27-04-22																							
244		Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	pią, 27-04-23 sob, 27-04-24																							
245		D-ż zaślepek	1 dzień	nie, 27-04-25 nie, 27-04-25																							
246		26	M	M2	Remont skraplacza 11E-18X	18 dn	pią, 27-04-09 pon, 27-04-26																				
247		Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pią, 27-04-09 pię, 27-04-09																							
248		M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	sob, 27-04-10 nie, 27-04-11																							
249		Prace dodatkowe	8 dn	pon, 27-04-12 pon, 27-04-19																							
250		Mycie aparatu	2 dn	wto, 27-04-20 śro, 27-04-21																							
251		Próba ciśnieniowa UDT	3 dn	czw, 27-04-22 sob, 27-04-24																							
252		D-ż zaślepek	2 dn	nie, 27-04-25 pon, 27-04-26																							
253		27	M	M2	Remont skraplacza 11E-19X	22 dn	śro, 27-04-07 śro, 27-04-28																				
254		Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	śro, 27-04-07 śro, 27-04-07																							
255		M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	czw, 27-04-08 pię, 27-04-09																							
256		D-ż aparatu	4 dn	sob, 27-04-10 wto, 27-04-13																							

Send D M K L K

Id.	Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia														2027-maja				
										17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10
257					Mycie aparatu	3 dn	śro, 27-04-14	pią, 27-04-16																				
258					Przygotowanie do rewizji - zacyszczanie	4 dn	sob, 27-04-17	wto, 27-04-20																				
259					Rewizja UDT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22																				
260					D-ż zaślepek	2 dn	pią, 27-04-23	sob, 27-04-24																				
261					Próba ciśnieniowa UDT	4 dn	nie, 27-04-25	śro, 27-04-28																				
262		28	M	M2	Remont skraplacza 11E-20X	21 dn	czw, 27-04-08	śro, 27-04-28																				
263					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	czw, 27-04-08	czw, 27-04-08																				
264					M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	pią, 27-04-09	sob, 27-04-10																				
265					D-ż aparatu	4 dn	nie, 27-04-11	śro, 27-04-14																				
266					Mycie aparatu	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16																				
267					Przygotowanie do rewizji - zacyszczanie	4 dn	sob, 27-04-17	wto, 27-04-20																				
268					Rewizja UDT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22																				
269					Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	pią, 27-04-23	sob, 27-04-24																				
270					D-ż zaślepek	4 dn	nie, 27-04-25	śro, 27-04-28																				
271		29	M	M2	Remont chłodnicy 11E-22	17 dn	pon, 27-04-12	śro, 27-04-28																				
272					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-12	pon, 27-04-12																				
273					M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	wto, 27-04-13	wto, 27-04-13																				
274					D-ż aparatu	3 dn	śro, 27-04-14	pią, 27-04-16																				
275					Mycie aparatu	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18																				
276					Rewizja UDT	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20																				
277					M-ż aparatu	4 dn	śro, 27-04-21	sob, 27-04-24																				
278					Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	nie, 27-04-25	pon, 27-04-26																				
279					D-ż zaślepek	2 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28																				
280		30	M	M4	Remont wymiennika 11E-23A	21 dn	pią, 27-04-09	czw, 27-04-29																				
281					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09																				
282					M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	sob, 27-04-10	nie, 27-04-11																				
283					D-ż wkładu	5 dn	pon, 27-04-12	pią, 27-04-16																				
284					Mycie aparatu	3 dn	sob, 27-04-17	pon, 27-04-19																				
285					Rewizja UDT	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21																				
286					M-ż wkładu	5 dn	czw, 27-04-22	pon, 27-04-26																				
287					Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28																				
288					D-ż zaślepek	1 dzień	czw, 27-04-29	czw, 27-04-29																				
289		31	M	M4	Remont wymiennika 11E-23B	18 dn	pią, 27-04-09	pon, 27-04-26																				
290					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09																				
291					M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	sob, 27-04-10	nie, 27-04-11																				
292					D-ż wkładu	2 dn	pon, 27-04-12	wto, 27-04-13																				
293					Mycie aparatu	3 dn	śro, 27-04-14	pią, 27-04-16																				
294					Rewizja UDT	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18																				
295					M-ż wkładu	4 dn	pon, 27-04-19	czw, 27-04-22																				
296					Próba ciśnieniowa UDT	3 dn	pią, 27-04-23	nie, 27-04-25																				
297					D-ż zaślepek	1 dzień	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26																				
298		32	M	M1	Remont wymiennika 11E-31CX	20 dn	pią, 27-04-09	śro, 27-04-28																				

Handwritten signature and initials.

Id.	Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia														2027-maja			
										17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07
299					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09																			
300					M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	sob, 27-04-10	nie, 27-04-11																			
301					D-ż wkładu	5 dn	pon, 27-04-12	pią, 27-04-16																			
302					Mycie aparatu	3 dn	sob, 27-04-17	pon, 27-04-19																			
303					Rewizja	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21																			
304					M-ż wkładu	4 dn	czw, 27-04-22	nie, 27-04-25																			
305					Próba ciśnieniowa	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27																			
306					D-ż zaślepek	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28																			
307		33	M	M1	Remont wymiennika 11E-31DX	20 dn	pią, 27-04-09	śro, 27-04-28																			
308					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09																			
309					M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	sob, 27-04-10	nie, 27-04-11																			
310					D-ż wkładu	5 dn	pon, 27-04-12	pią, 27-04-16																			
311					Mycie aparatu	3 dn	sob, 27-04-17	pon, 27-04-19																			
312					Rewizja	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21																			
313					M-ż wkładu	4 dn	czw, 27-04-22	nie, 27-04-25																			
314					Próba ciśnieniowa	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27																			
315					D-ż zaślepek	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28																			
316		34	M	M1	Remont wymiennika 11E-34AX	20 dn	pią, 27-04-09	śro, 27-04-28																			
317					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09																			
318					M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	sob, 27-04-10	nie, 27-04-11																			
319					D-ż wkładu	5 dn	pon, 27-04-12	pią, 27-04-16																			
320					Mycie aparatu	3 dn	sob, 27-04-17	pon, 27-04-19																			
321					Rewizja	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21																			
322					M-ż wkładu	4 dn	czw, 27-04-22	nie, 27-04-25																			
323					Próba ciśnieniowa	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27																			
324					D-ż zaślepek	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28																			
325		35	M	M1	Remont wymiennika 11E-34BX	20 dn	pią, 27-04-09	śro, 27-04-28																			
326					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09																			
327					M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	sob, 27-04-10	nie, 27-04-11																			
328					D-ż wkładu	5 dn	pon, 27-04-12	pią, 27-04-16																			
329					Mycie aparatu	3 dn	sob, 27-04-17	pon, 27-04-19																			
330					Rewizja	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21																			
331					M-ż wkładu	4 dn	czw, 27-04-22	nie, 27-04-25																			
332					Próba ciśnieniowa	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27																			
333					D-ż zaślepek	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28																			
334		36	M	M2	Remont chłodnicy 11E-35	14 dn	czw, 27-04-15	śro, 27-04-28																			
335					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15																			
336					M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16																			
337					D-ż aparatu	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18																			
338					Mycie aparatu	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20																			
339					Rewizja UDT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22																			
340					M-ż aparatu	3 dn	pią, 27-04-23	nie, 27-04-25																			

Id.	Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia														2027-maja						
										17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10		
383					Mycie aparatu	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18																						
384					Rewizja UDT	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20																						
385					M-ż aparatu	5 dn	śro, 27-04-21	nie, 27-04-25																						
386					Próba ciśnieniowa UDT	3 dn	pon, 27-04-26	śro, 27-04-28																						
387					D-ż zaślepek	1 dzień	czw, 27-04-29	czw, 27-04-29																						
388		42	M	M2	Remont wymiennika 11E-38	21 dn	pon, 27-04-05	nie, 27-04-25																						
389					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																						
390					M-ż zaślepek, parowanie	3 dn	wto, 27-04-06	czw, 27-04-08																						
391					D-ż aparatu	5 dn	pią, 27-04-09	wto, 27-04-13																						
392					Mycie aparatu	2 dn	śro, 27-04-14	czw, 27-04-15																						
393					Rewizja UDT	2 dn	pią, 27-04-16	sob, 27-04-17																						
394					M-ż aparatu	4 dn	nie, 27-04-18	śro, 27-04-21																						
395					Próba ciśnieniowa UDT	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24																						
396					D-ż zaślepek	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25																						
397		43	M	M1	Remont pieca 11H-01	29 dn	wto, 27-04-06	wto, 27-05-04																						
398					Przygotowanie aparatu do remontu - prace związane z reaktorem 11-R-01	3 dn	wto, 27-04-06	czw, 27-04-08																						
399					M-ż zaślepek, otwarcie włączów	2 dn	wto, 27-04-06	śro, 27-04-07																						
400					M-ż rusztowania wewnątrz pieca	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08																						
401					D-ż elementów pieca na potrzeby piggingu - d-ż kolan, d-ż osprzętu PiA	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08																						
402					Prace w br. budowlanej - przegląd stanu wymurówki	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09																						
403		45			Czyszczenie rur wewnątrz pieca - pigging	2 dn	pią, 27-04-09	sob, 27-04-10																						
404					Zaczyszczanie wężownic na potrzeby rewizji UDT i badań NDT	2 dn	nie, 27-04-11	pon, 27-04-12																						
405					Wykonanie badań NDT - realizacja PBE	4 dn	wto, 27-04-13	pią, 27-04-16																						
406					Wymiana rur i kolan	7 dn	sob, 27-04-17	pią, 27-04-23																						
407					Prace w br. budowlanej - naprawa wymurówki	3 dn	sob, 27-04-24	pon, 27-04-26																						
408					Prace w br. budowlanej - czyszczenie ręczne	3 dn	sob, 27-04-24	pon, 27-04-26																						
409					- Rewizja UDT + próba ciśnieniowa	1 dzień	wto, 27-04-27	wto, 27-04-27																						
410					D-ż rusztowań	2 dn	śro, 27-04-28	czw, 27-04-29																						
411					Prace w br. budowlanej - uzupełnianie dylatacji poziomych i naprawa gniazd palników	2 dn	pią, 27-04-30	sob, 27-05-01																						
412					Odbiór częściowy, przyjęcie gazu opałowego	2 dn	nie, 27-05-02	pon, 27-05-03																						
413					M-ż elementów pieca, usunięcie pozostałości wody z wężownic po próbie ciśn	2 dn	nie, 27-05-02	pon, 27-05-03																						
414					D-ż zaślepek	1 dzień	wto, 27-05-04	wto, 27-05-04																						
415		44	M	M1	Remont pieca 11H-02	26 dn	wto, 27-04-06	sob, 27-05-01																						
416					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	3 dn	wto, 27-04-06	czw, 27-04-08																						
417					M-ż zaślepek, otwarcie włączów	2 dn	wto, 27-04-06	śro, 27-04-07																						
418					Przeglądy, konserwacje, regulacje elementów pieca zgodnie z	2 dn	wto, 27-04-06	śro, 27-04-07																						
419					M-ż rusztowania wewnątrz pieca	2 dn	czw, 27-04-08	pią, 27-04-09																						
420					D-ż elementów pieca na potrzeby piggingu - d-ż kolan, d-ż osprzętu PiA	2 dn	czw, 27-04-08	pią, 27-04-09																						
421					Prace w br. budowlanej - przegląd stanu wymurówki	1 dzień	sob, 27-04-10	sob, 27-04-10																						
422		45			Czyszczenie rur wewnątrz pieca - pigging	2 dn	nie, 27-04-11	pon, 27-04-12																						

Senar D Bł K&K

Id.	Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia														2027-maja			
										17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07
423	★				Zaczyszczanie węzownic na potrzeby rewizji UDT i badań NDT	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14																			
424	★				Wykonanie badań NDT - realizacja PBE	4 dn	czw, 27-04-15	nie, 27-04-18																			
425	★				Prace w br. budowlanej - naprawa wymurówki	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21																			
426	★				Prace w br. budowlanej - czyszczenie ręczne	3 dn	czw, 27-04-22	sob, 27-04-24																			
427	★				- Rewizja UDT + próba ciśnieniowa	2 dn	nie, 27-04-25	pon, 27-04-26																			
428	★				D-ż rusztowań	2 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28																			
429	★				Prace w br. budowlanej - uzupełnianie dylatacji poziomych i naprawa gniazd palników	1 dzień	czw, 27-04-29	czw, 27-04-29																			
430	★				Odbiór częściowy, przyjęcie gazu opałowego	2 dn	pią, 27-04-30	sob, 27-05-01																			
431	★				M-ż elementów pieca, usunięcie pozostałości wody z węzownic po próbie ciśn	2 dn	pią, 27-04-30	sob, 27-05-01																			
432	★				D-ż zaślepek	1 dzień	sob, 27-05-01	sob, 27-05-01																			
433	★	45	M	D	Czyszczenie węzownic pieca 11H-01, 11H-02 pigging	2 dn	pią, 27-04-09	sob, 27-04-10																			
434	★	46	M	M1	Remont reaktora 11R-01	22 dn	wto, 27-04-06	wto, 27-04-27																			
435	→				Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	wto, 27-04-06	wto, 27-04-06																			
436	→				Ślepienie reaktora	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08																			
437	→				Wyładunek katalizatora	5 dn	pią, 27-04-09	wto, 27-04-13																			
438	→				Rewizja wewnętrzna 11R01	3 dn	śro, 27-04-14	pią, 27-04-16																			
439	→				Załadunek katalizatora	6 dn	sob, 27-04-17	czw, 27-04-22																			
440	→				Skręcanie kolana, d-ż zaślepek	5 dn	pią, 27-04-23	wto, 27-04-27																			
441	★	47	M	M1	Remont reaktora 11R-02	17 dn	pon, 27-04-12	śro, 27-04-28																			
442	→				Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-12	pon, 27-04-12																			
443	→				M-ż zaślepek	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14																			
444	→				D-ż - m-ż pierścieni parowych połączeń kołnierzowych, zasuw	12 dn	czw, 27-04-15	pon, 27-04-26																			
445	→				D-ż zaślepek	2 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28																			
446	★	48	M	M1	Remont kolumny 11C-01	25 dn	czw, 27-04-08	nie, 27-05-02																			
447	→				Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	czw, 27-04-08	czw, 27-04-08																			
448	→				M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09																			
449	→				D_ż włączów	2 dn	sob, 27-04-10	nie, 27-04-11																			
450	→				Wyładunek pierścieni	2 dn	pon, 27-04-12	wto, 27-04-13																			
451	→				M-ż rusztowania	2 dn	śro, 27-04-14	czw, 27-04-15																			
452	→				D-ż dystrybutora	2 dn	pią, 27-04-16	sob, 27-04-17																			
453	→				Mycie kolumny	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19																			
454	→				Rewizja UDT	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21																			
455	→				M-ż dystrybutora	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23																			
456	→				D-ż rusztowania	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25																			
457	→				M-ż włączów	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27																			
458	→				Zasyp pierścieni	2 dn	śro, 27-04-28	czw, 27-04-29																			
459	→				Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	pią, 27-04-30	sob, 27-05-01																			
460	→				D-ż zaślepek	1 dzień	nie, 27-05-02	nie, 27-05-02																			
461	★	49	M	M2	Remont kolumny 11C-02	19 dn	pon, 27-04-12	pią, 27-04-30																			
462	→				Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-12	pon, 27-04-12																			
463	→				M-ż zaślepek, parowanie	3 dn	wto, 27-04-13	czw, 27-04-15																			

[Handwritten signature]
[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Id.	Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia														2027-maja												
										17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10								
464					Wyładunek pierścieni	1 dzień	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16																												
465					D-ż dystrybutora, demistara, włazów w półkach	3 dn	sob, 27-04-17	pon, 27-04-19																												
466					Mycie kolumny	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20																												
467					M-ż rusztowania	1 dzień	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21																												
468					Rewizja UDT	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22																												
469					M-ż włazów w półkach, dytrybutora, demistera	3 dn	pią, 27-04-23	nie, 27-04-25																												
470					D-ż rusztowania	1 dzień	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26																												
471					M-ż włazów	1 dzień	wto, 27-04-27	wto, 27-04-27																												
472					Zasyp pierścieni	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28																												
473					Próba ciśnieniowa UDT	1 dzień	czw, 27-04-29	czw, 27-04-29																												
474					D-ż zaślepek	1 dzień	pią, 27-04-30	pią, 27-04-30																												
475		50	M	M2	Remont kolumny 11C-03	26 dn	pon, 27-04-05	pią, 27-04-30																												
476					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																												
477					M-ż zaślepek, parowanie	3 dn	wto, 27-04-06	czw, 27-04-08																												
478					D-ż włazów	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09																												
479					Mycie kolumny	2 dn	sob, 27-04-10	nie, 27-04-11																												
480					Wymiana pieścieni wsporczych i półek	12 dn	pon, 27-04-12	pią, 27-04-23																												
481					Rewizja UDT	1 dzień	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24																												
482					Zamknięcie studni	3 dn	nie, 27-04-25	wto, 27-04-27																												
483					M-ż włazów	1 dzień	śro, 27-04-28	śro, 27-04-28																												
484					Próba ciśnieniowa UDT	1 dzień	czw, 27-04-29	czw, 27-04-29																												
485					D-ż zaślepek	1 dzień	pią, 27-04-30	pią, 27-04-30																												
486		51	M	M2	Remont kolumny 11C-04X	19 dn	pią, 27-04-09	wto, 27-04-27																												
487					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09																												
488					M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	sob, 27-04-10	sob, 27-04-10																												
489					D-ż włazów	1 dzień	nie, 27-04-11	nie, 27-04-11																												
490					Mycie kolumny	2 dn	pon, 27-04-12	wto, 27-04-13																												
491					M-ż rusztowania	2 dn	śro, 27-04-14	czw, 27-04-15																												
492					D-ż dystrybutora	2 dn	pią, 27-04-16	sob, 27-04-17																												
493					Rewizja UDT	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18																												
494					M-ż dystrybutora	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20																												
495					D-ż rusztowań	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22																												
496					M-ż włazów	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23																												
497					Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25																												
498					D-ż zaślepek	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27																												
499		52	M	M2	Remont kolumny 11C-05	24 dn	pon, 27-04-05	śro, 27-04-28																												
500					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																												
501					M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	wto, 27-04-06	śro, 27-04-07																												
502					D-ż włazów	2 dn	czw, 27-04-08	pią, 27-04-09																												
503					Wyładunek wypełnienia	3 dn	sob, 27-04-10	pon, 27-04-12																												
504					D-ż demistera	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14																												
505					Mycie kolumny	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16																												
506					Rewizja UDT	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18																												

Id.	Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia														2027-maja				
										17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10
507					M-ż demistera	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20																				
508					M-ż włazów	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22																				
509					Zasyp wypełnienia	3 dn	pią, 27-04-23	nie, 27-04-25																				
510					Próba ciśnieniowa UDT	1 dzień	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26																				
511					D-ż zaślepek	2 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28																				
512		53	M	M2	Remont zbiornika 11V-01	18 dn	czw, 27-04-08	nie, 27-04-25																				
513					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	czw, 27-04-08	czw, 27-04-08																				
514					M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09																				
515					D-ż włazu	1 dzień	sob, 27-04-10	sob, 27-04-10																				
516					D-ż demistera	3 dn	nie, 27-04-11	wto, 27-04-13																				
517					Mycie/ zaczyszczanie	3 dn	śro, 27-04-14	pią, 27-04-16																				
518					Rewizja UDT	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18																				
519					M-ż demistera	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21																				
520					M-ż włazu	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22																				
521					Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	pią, 27-04-23	sob, 27-04-24																				
522					D-ż zaślepek	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25																				
523		54	M	M2	Remont zbiornika 11V-02	23 dn	czw, 27-04-08	pią, 27-04-30																				
524					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	czw, 27-04-08	czw, 27-04-08																				
525					M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	pią, 27-04-09	sob, 27-04-10																				
526					D-ż włazu	2 dn	nie, 27-04-11	pon, 27-04-12																				
527					Mycie / zaczyszczanie	7 dn	wto, 27-04-13	pon, 27-04-19																				
528					Rewizja UDT	3 dn	wto, 27-04-20	czw, 27-04-22																				
529					M-ż włazu	2 dn	pią, 27-04-23	sob, 27-04-24																				
530					Próba ciśnieniowa UDT	3 dn	nie, 27-04-25	wto, 27-04-27																				
531					D-ż zaślepek	3 dn	śro, 27-04-28	pią, 27-04-30																				
532		55	M	M2	Remont zbiornika 11V-03	24 dn	czw, 27-04-08	sob, 27-05-01																				
533					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	czw, 27-04-08	czw, 27-04-08																				
534					M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	pią, 27-04-09	sob, 27-04-10																				
535					D-ż włazów	2 dn	nie, 27-04-11	pon, 27-04-12																				
536					D-ż demistera	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14																				
537					Mycie/ zaczyszczanie	6 dn	czw, 27-04-15	wto, 27-04-20																				
538					Rewizja UDT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22																				
539					M-ż demistera	2 dn	pią, 27-04-23	sob, 27-04-24																				
540					M-ż włazów	2 dn	nie, 27-04-25	pon, 27-04-26																				
541					Próba ciśnieniowa UDT	3 dn	wto, 27-04-27	czw, 27-04-29																				
542					D-ż zaślepek	2 dn	pią, 27-04-30	sob, 27-05-01																				
543		56	M	M2	Remont zbiornika 11V-04	22 dn	pon, 27-04-12	pon, 27-05-03																				
544					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-12	pon, 27-04-12																				
545					M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14																				
546					D-ż włazów	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16																				
547					D-ż demistera	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18																				
548					Mycie/ zaczyszczanie	5 dn	pon, 27-04-19	pią, 27-04-23																				
549					Rewizja UDT	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25																				

Handwritten signatures and initials: "Sey", "R M", "Kh K"

Id.		Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia														2027-maja					
											17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10	
550			57	M	M2	M-ż demistera	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27																					
551						M-ż włazów	2 dn	śro, 27-04-28	czw, 27-04-29																					
552						Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	pią, 27-04-30	sob, 27-05-01																					
553						D-ż zaślepek	2 dn	nie, 27-05-02	pon, 27-05-03																					
554						Remont zbiornika 11V-05	19 dn	czw, 27-04-08	pon, 27-04-26																					
555						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	czw, 27-04-08	czw, 27-04-08																					
556						M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	pią, 27-04-09	sob, 27-04-10																					
557						D-ż włączu	2 dn	nie, 27-04-11	pon, 27-04-12																					
558						Mycie/ zaczyszczanie	6 dn	wto, 27-04-13	nie, 27-04-18																					
559						Rewizja UDT	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20																					
560			58	M	M2	M-ż włączu	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22																					
561						Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	pią, 27-04-23	sob, 27-04-24																					
562						D-ż zaslepek	2 dn	nie, 27-04-25	pon, 27-04-26																					
563						Remont zbiornika 11V-06	21 dn	pon, 27-04-05	nie, 27-04-25																					
564						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																					
565						M-ż zaślepek, parowanie	3 dn	wto, 27-04-06	czw, 27-04-08																					
566						D-ż włazów	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09																					
567						D-ż demistera	2 dn	sob, 27-04-10	nie, 27-04-11																					
568						Mycie/ zaczyszczanie	3 dn	pon, 27-04-12	śro, 27-04-14																					
569						Rewizja UDT	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16																					
570			59	M	M2	M-ż demistera	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18																					
571						M-ż włazów	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20																					
572						Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22																					
573						D-ż zaślepek	2 dn	pią, 27-04-23	sob, 27-04-24																					
574						Remont zbiornika 11V-07	18 dn	wto, 27-04-06	pią, 27-04-23																					
575						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	wto, 27-04-06	wto, 27-04-06																					
576						M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	śro, 27-04-07	śro, 27-04-07																					
577						D-ż dennicy	1 dzień	czw, 27-04-08	czw, 27-04-08																					
578						D-ż demistera	2 dn	pią, 27-04-09	sob, 27-04-10																					
579						Mycie/ zaczyszczanie	4 dn	nie, 27-04-11	śro, 27-04-14																					
580			60	M	M2	Rewizja UDT	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16																					
581						M-ż demistera	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18																					
582						M-ż dennicy	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20																					
583						Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22																					
584						D-ż zaślepek	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23																					
585						Remont zbiornika 11V-08	22 dn	wto, 27-04-06	wto, 27-04-27																					
586						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	wto, 27-04-06	wto, 27-04-06																					
587						M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08																					
588						D-ż dennicy	2 dn	pią, 27-04-09	sob, 27-04-10																					
589						D-ż demistera	2 dn	nie, 27-04-11	pon, 27-04-12																					
590						Mycie/ zaczyszczanie	5 dn	wto, 27-04-13	sob, 27-04-17																					
591						Rewizja UDT	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19																					
592						M-ż demistera	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21																					

Łucy R M K L K

Id.	Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia					2027-maja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
593					M-ż dennicy	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Id.	i	Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia														2027-maja				
											17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10
635						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																				
636						M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	wto, 27-04-06	wto, 27-04-06																				
637						D-ż pokrywy	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08																				
638						D-ż demistera	2 dn	pią, 27-04-09	sob, 27-04-10																				
639						Mycie/ zaczyszczanie	2 dn	nie, 27-04-11	pon, 27-04-12																				
640						Rewizja UDT	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14																				
641						M-ż demistera	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16																				
642						M-ż pokrywy	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18																				
643						Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20																				
644						D-ż zaślepek	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22																				
645			66	M	M2	Remont zbiornika 11V-17	21 dn	pon, 27-04-05	nie, 27-04-25																				
646						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																				
647						M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	wto, 27-04-06	śro, 27-04-07																				
648						D-ż pokrywy	2 dn	czw, 27-04-08	pią, 27-04-09																				
649						D-ż demistera	2 dn	sob, 27-04-10	nie, 27-04-11																				
650						Mycie/ zaczyszczanie	4 dn	pon, 27-04-12	czw, 27-04-15																				
651						Rewizja UDT	2 dn	pią, 27-04-16	sob, 27-04-17																				
652						M-ż demistera	2 dn	nie, 27-04-18	pon, 27-04-19																				
653						M-ż pokrywy	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21																				
654						Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23																				
655						D-ż zaślepek	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25																				
656			67	M	M2	Remont zbiornika 11V-18	18 dn	pon, 27-04-05	czw, 27-04-22																				
657						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																				
658						M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	wto, 27-04-06	wto, 27-04-06																				
659						D-ż włazu	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08																				
660						Mycie/ zaczyszczanie	2 dn	pią, 27-04-09	sob, 27-04-10																				
661						M-ż rusztowania	2 dn	nie, 27-04-11	pon, 27-04-12																				
662						Rewizja UDT	2 dn	wto, 27-04-13	śro, 27-04-14																				
663						D-ż rusztowań	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16																				
664						M-ż włazu	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18																				
665						Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20																				
666						D-ż zaślepek	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22																				
667			68	M	M2	Remont zbiornika 11V-19	22 dn	pon, 27-04-05	pon, 27-04-26																				
668						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																				
669						M-ż zaślepek, parowanie	3 dn	wto, 27-04-06	czw, 27-04-08																				
670						D-ż włazów	2 dn	pią, 27-04-09	sob, 27-04-10																				
671						Mycie/ zaczyszczanie	6 dn	nie, 27-04-11	pią, 27-04-16																				
672						Rewizja UDT	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18																				
673						M-ż włazów	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20																				
674						Próba ciśnieniowa UDT	3 dn	śro, 27-04-21	pią, 27-04-23																				
675						D-ż zaslepek	3 dn	sob, 27-04-24	pon, 27-04-26																				
676			69	M	M2	Remont zbiornika 11V-20	15 dn	pią, 27-04-16	pią, 27-04-30																				

Id.	Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia					2027-maja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
677					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Id.	Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia					2027-maja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
719					Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Seuf R M K L K

Id.		Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia														2027-maja				
											17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10
761						Mycie /zaczyszczanie	1 dzień	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24																				
762						Rewizja UDT	2 dn	nie, 27-04-25	pon, 27-04-26																				
763						M-ż aparatu	2 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28																				
764						Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30																				
765						D-ż zaślepek	1 dzień	sob, 27-05-01	sob, 27-05-01																				
766			79	M	M2	Remont filtrów 11X-05A/B	12 dn	wto, 27-04-20 sob, 27-05-01																					
767						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20																				
768						M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21																				
769						D-ż aparatu	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23																				
770						Mycie /zaczyszczanie	1 dzień	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24																				
771						Rewizja UDT	2 dn	nie, 27-04-25	pon, 27-04-26																				
772						M-ż aparatu	2 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28																				
773						Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30																				
774						D-ż zaślepek	1 dzień	sob, 27-05-01	sob, 27-05-01																				
775			80	M	M4	Remont filtrów 11X-06A/B	12 dn	wto, 27-04-20 sob, 27-05-01																					
776						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	wto, 27-04-20	wto, 27-04-20																				
777						M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	śro, 27-04-21	śro, 27-04-21																				
778						D-ż aparatu	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23																				
779						Mycie /zaczyszczanie	1 dzień	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24																				
780						Rewizja UDT	2 dn	nie, 27-04-25	pon, 27-04-26																				
781						M-ż aparatu	2 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28																				
782						Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30																				
783						D-ż zaślepek	1 dzień	sob, 27-05-01	sob, 27-05-01																				
784			81	M	M2	Remont kolumny 12C-01	18 dn	pon, 27-04-05 czw, 27-04-22																					
785						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																				
786						M-ż zaślepek, parowanie, płukanie wodą	3 dn	wto, 27-04-06	czw, 27-04-08																				
787						D-ż włączów	1 dzień	pią, 27-04-09	pią, 27-04-09																				
788						Wykonanie studni	4 dn	sob, 27-04-10	wto, 27-04-13																				
789						Mycie kolumny	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14																				
790						Rewizja UDT	1 dzień	czw, 27-04-15	czw, 27-04-15																				
791						Zamknięcie studni	3 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18																				
792						M-ż włączów	1 dzień	pon, 27-04-19	pon, 27-04-19																				
793						Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21																				
794						D-ż zaślepek	1 dzień	czw, 27-04-22	czw, 27-04-22																				
795			82	M	M2	Remont zbiornika 12V-01	11 dn	pią, 27-04-23 pon, 27-05-03																					
796						Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pią, 27-04-23	pią, 27-04-23																				
797						M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	sob, 27-04-24	sob, 27-04-24																				
798						D-ż włączów	1 dzień	nie, 27-04-25	nie, 27-04-25																				
799						Mycie /zaczyszczanie	1 dzień	pon, 27-04-26	pon, 27-04-26																				
800						Rewizja UDT	2 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28																				
801						M-ż włączów	1 dzień	czw, 27-04-29	czw, 27-04-29																				
802						Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	pią, 27-04-30	sob, 27-05-01																				
803						D-ż zaślepek	2 dn	nie, 27-05-02	pon, 27-05-03																				

Id.	Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia														2027-maja			
										17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07
846					Mycie / zaczyszczanie	2 dn	czw, 27-04-08	pią, 27-04-09																			
847					Rewizja UDT	2 dn	sob, 27-04-10	nie, 27-04-11																			
848					M-ż włączów	2 dn	pon, 27-04-12	wto, 27-04-13																			
849					Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	śro, 27-04-14	czw, 27-04-15																			
850					D-ż zaślepek	1 dzień	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16																			
851		88	M	M2	Remont filtra oleju 11V-21AX/BX	15 dn	pią, 27-04-16	pią, 27-04-30																			
852					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16																			
853					M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18																			
854					D-ż aparatu (pokrywy, poł. Kołnierzowe)	3 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-21																			
855					Przygotowanie do rewizji UDT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23																			
856					Rewizja UDT	2 dn	sob, 27-04-24	nie, 27-04-25																			
857					M-ż aparatu	3 dn	pon, 27-04-26	śro, 27-04-28																			
858					D-ż zaślepek	2 dn	czw, 27-04-29	pią, 27-04-30																			
859		89	M	M2	Remont zbiornika 12V-10	17 dn	wto, 27-04-13	czw, 27-04-29																			
860					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	wto, 27-04-13	wto, 27-04-13																			
861					M-ż zaślepek, parowanie	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14																			
862					D-ż włączów	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16																			
863					Mycie / zaczyszczanie	4 dn	sob, 27-04-17	wto, 27-04-20																			
864					Rewizja UDT	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22																			
865					M-ż włączów	2 dn	pią, 27-04-23	sob, 27-04-24																			
866					Próba ciśnieniowa UDT	3 dn	nie, 27-04-25	wto, 27-04-27																			
867					D-ż zaślepek	2 dn	śro, 27-04-28	czw, 27-04-29																			
868		90	M	M2	Remont filtrów 12X-01X/12X-02X	16 dn	śro, 27-04-14	czw, 27-04-29																			
869					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14																			
870					M-ż zaślepek, parowanie	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16																			
871					D-ż aparatu (pokrywy, poł. Kołnierzowe, elementy wew. filtra	3 dn	sob, 27-04-17	pon, 27-04-19																			
872					Przygotowanie do rewizji UDT	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21																			
873					Rewizja UDT	2 dn	czw, 27-04-22	pią, 27-04-23																			
874					M-ż aparatu	4 dn	sob, 27-04-24	wto, 27-04-27																			
875					D-ż zaślepek	2 dn	śro, 27-04-28	czw, 27-04-29																			
876		91	M	M2	Remont wyparki 12E-01	18 dn	pon, 27-04-05	czw, 27-04-22																			
877					Przygotowanie aparatu do remontu (drenowanie, dmuchanie azotem itp.)	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																			
878					M-ż zaślepek, parowanie	3 dn	wto, 27-04-06	czw, 27-04-08																			
879					D-ż aparatu	3 dn	pią, 27-04-09	nie, 27-04-11																			
880					Mycie / zaczyszczanie	2 dn	pon, 27-04-12	wto, 27-04-13																			
881					Rewizja UDT	2 dn	śro, 27-04-14	czw, 27-04-15																			
882					M-ż aparatu	3 dn	pią, 27-04-16	nie, 27-04-18																			
883					Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20																			
884					D-ż zaślepek	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22																			
885		92	M	M2	Remont chłodnicy powietrznej 12E-02	18 dn	pon, 27-04-05	czw, 27-04-22																			
886					Przygotowanie aparatu do remontu (parowanie, dmuchanie : 1 dzień	1 dzień	pon, 27-04-05	pon, 27-04-05																			
887					M-ż zaślepek, parowanie	3 dn	wto, 27-04-06	czw, 27-04-08																			
888					D-ż korków	3 dn	pią, 27-04-09	nie, 27-04-11																			

Sev D M K L K

Id.	Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia										2027-maja								
										17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10
950					Mycie kolumny	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16																				
951					Rewizja UDT	2 dn	sob, 27-04-17	nie, 27-04-18																				
952					M-ż dystrybutora	2 dn	pon, 27-04-19	wto, 27-04-20																				
953					D-ż rusztowania	2 dn	śro, 27-04-21	czw, 27-04-22																				
954					M-ż włączów	2 dn	pią, 27-04-23	sob, 27-04-24																				
955					Zasyp pierścieni	2 dn	nie, 27-04-25	pon, 27-04-26																				
956					Próba ciśnieniowa UDT	2 dn	wto, 27-04-27	śro, 27-04-28																				
957					D-ż zaślepek	1 dzień	czw, 27-04-29	czw, 27-04-29																				
958		111	A	H	Reduktory, Zawory	31 dn	pon, 27-04-05	śro, 27-05-05																				
959					Reduktory - 6 szt. 11-PCV-0110, 11-PCV-1002, 11-PCV-1110, 11-PCV-2752, 11-PCV-2803, 11-PCV-2810	18 dn	wto, 27-04-06	pią, 27-04-23																				
960					- d-ż, transport na warsztat	4 dn	wto, 27-04-06	pią, 27-04-09																				
961					- prace na warsztacie	5 dn	pon, 27-04-12	pią, 27-04-16																				
962					- transport z warsztatu na instalację, m-ż	5 dn	pon, 27-04-19	pią, 27-04-23																				
963					Zawory blokadowe - 61 szt.	25 dn?	wto, 27-04-06	pią, 27-04-30																				
964					zawory blokadowe na piecu 11-H-01 (gaz opalowy) - 6 szt. 11-XV-0101 - 0106	15 dn	wto, 27-04-06	wto, 27-04-20																				
965					- d-ż, transport na warsztat	3 dn	wto, 27-04-06	czw, 27-04-08																				
966					- prace na warsztacie	6 dn	pią, 27-04-09	śro, 27-04-14																				
967					- transport na instalację m-ż	6 dn	czw, 27-04-15	wto, 27-04-20																				
968					zawory blokadowe na piecu 11-H-02 (gaz opałowy) - 10 szt. 11-XV-1101, 03, 05, 06, 1016 - 1021,	15 dn	wto, 27-04-06	wto, 27-04-20																				
969					- d-ż, transport na warsztat	3 dn	wto, 27-04-06	czw, 27-04-08																				
970					- prace na warsztacie	6 dn	pią, 27-04-09	śro, 27-04-14																				
971					- transport na instalację, m-ż	6 dn	czw, 27-04-15	wto, 27-04-20																				
972					pozostałe zawory blokadowe - 45 szt.	24 dn	śro, 27-04-07	pią, 27-04-30																				
973					- d-ż, transport na warsztat	7 dn	śro, 27-04-07	wto, 27-04-13																				
974					- prace na warsztacie	14 dn	pią, 27-04-09	czw, 27-04-22																				
975					- transport na instalację, m-ż	12 dn	pon, 27-04-19	pią, 27-04-30																				
976					Zawory regulacyjne - 102 szt.	26 dn?	pon, 27-04-05	pią, 27-04-30																				
977					zawory regulacyjne na piecu 11-H-01 - 1 szt. 11-PV-0108	10 dn	śro, 27-04-07	pią, 27-04-16																				
978					- d-ż, transport na warsztat	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08																				
979					- prace na warsztacie	6 dn	pią, 27-04-09	śro, 27-04-14																				
980					- transport na instalację, m-ż	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16																				
981					zawory regulacyjne na piecu 11-H-02 - 1 szt. 11-PV-1108	10 dn	śro, 27-04-07	pią, 27-04-16																				
982					- d-ż, transport na warsztat	2 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-08																				
983					- prace na warsztacie	6 dn	pią, 27-04-09	śro, 27-04-14																				
984					- transport na instalację, m-ż	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16																				
985					zawory regulacyjne - pozostałe - 100 szt.	26 dn	pon, 27-04-05	pią, 27-04-30																				
986					- d-ż, transport na warsztat	10 dn	pon, 27-04-05	śro, 27-04-14																				
987					- prace na warsztacie	18 dn	wto, 27-04-06	pią, 27-04-23																				
988					- transport na instalację, m-ż	19 dn	pon, 27-04-12	pią, 27-04-30																				
989		112	A	H	Kryzy, Poziomowskazy	31 dn?	pon, 27-04-05	śro, 27-05-05																				
990					Kryzy - 19 szt.	23 dn?	wto, 27-04-06	śro, 27-04-28																				
991					kryza 11-FE-0102 - gaz opałowy na BL	7 dn	wto, 27-04-06	pon, 27-04-12																				

Sej DZ KHK

Id.	Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia										2027-maja							
										17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07
995						kryzy pozostałe 18 szt.	23 dn	wto, 27-04-06	śro, 27-04-28																		
996						- d-ż kryzy, transport na warsztat	7 dn	wto, 27-04-06	pon, 27-04-12																		
997						- prace na warsztacie	14 dn	śro, 27-04-07	wto, 27-04-20																		
998						- transport na instalację, m-ż kryzy	10 dn	pon, 27-04-19	śro, 27-04-28																		
999						Poziomowskazy - 31 szt.	25 dn	wto, 27-04-06	pią, 27-04-30																		
1000						- d-ż poziomowskazów,	8 dn	wto, 27-04-06	wto, 27-04-13																		
1001						- prace na warsztacie	16 dn	śro, 27-04-07	czw, 27-04-22																		
1002						- m-ż poziowskazów	15 dn	pią, 27-04-16	pią, 27-04-30																		
1003			113	A	H	Przetworniki DP; P; PS; T; T(MTL)	25 dn	wto, 27-04-06	pią, 27-04-30																		
1004						- d-ż poziomowskazów,	8 dn	wto, 27-04-06	wto, 27-04-13																		
1005						- prace na warsztacie	14 dn	śro, 27-04-07	wto, 27-04-20																		
1006						- m-ż poziowskazów	15 dn	pią, 27-04-16	pią, 27-04-30																		
1007			114	A	H	Przepływomierze VORTEX, Sygnalizatory poziomu, Przetworniki poziomu	25 dn	wto, 27-04-06	pią, 27-04-30																		
1008						- d-ż poziomowskazów,	8 dn	wto, 27-04-06	wto, 27-04-13																		
1009						- prace na warsztacie	14 dn	śro, 27-04-07	wto, 27-04-20																		
1010						- m-ż poziowskazów	15 dn	pią, 27-04-16	pią, 27-04-30																		
1011			115	A	H	Aparatura analityczna i monitoring na instalacji	34 dn	pon, 27-04-05	sob, 27-05-08																		
1016			116	A	H	Aparatura obiektowa	23 dn	pon, 27-04-05	wto, 27-04-27																		
1017						- prace przygotowawcze do d-ż, m-ż zaworów																					
1018						- prace przygotowawcze do d-ż, m-ż układów PiA																					
1019			117	A	H	Przepływomierze masowe - 11 szt.	31 dn	pon, 27-04-05	śro, 27-05-05																		
1020						11-FT-0001	31 dn	pon, 27-04-05	śro, 27-05-05																		
1021						- d-ż, transport na warsztat, przygotowanie do tranportu poza zakład	3 dn	pon, 27-04-05	śro, 27-04-07																		
1022						- prace u kontahenta zewnętrznego	23 dn	czw, 27-04-08	pią, 27-04-30																		
1023						- przygotowanie do tranportu z powrotem, transport na warsztat, m-ż	5 dn	sob, 27-05-01	śro, 27-05-05																		
1024						pozostałe przepływomierze masowe	26 dn	pon, 27-04-05	pią, 27-04-30																		
1025						- d-ż, transport na warsztat	12 dn	pon, 27-04-05	pią, 27-04-16																		
1026						- prace na warsztacie	16 dn	pon, 27-04-12	wto, 27-04-27																		
1027						- tranport na instalację, m-ż	11 dn	wto, 27-04-20	pią, 27-04-30																		
1028			118	E	E1	Rozdzielnica OPR P-52	28 dn	pon, 27-04-05	nie, 27-05-02																		
1029						Sekcja A	14 dn	pon, 27-04-19	nie, 27-05-02																		
1030						Sekcja B	14 dn	pon, 27-04-05	nie, 27-04-18																		
1031			119	E	E1	Rozdzielnice nn	28 dn	pon, 27-04-05	nie, 27-05-02																		
1032						Sekcja A	14 dn	pon, 27-04-19	nie, 27-05-02																		
1033						Sekcja B	14 dn	pon, 27-04-05	nie, 27-04-18																		
1034			120	E	E1	Przegląd, konserwacja rozdzielniczy TOA, TOP	31 dn	pon, 27-03-01	śro, 27-03-31																		
1035			121	E	E1	Transformatory T1 i T2	28 dn	pon, 27-04-05	nie, 27-05-02																		
1036						Transformator T1	14 dn	pon, 27-04-19	nie, 27-05-02																		
1037						Transformator T2	14 dn	pon, 27-04-05	nie, 27-04-18																		
1038			122	E	E1	Przegląd konserwacja ogrzewania	32 dn	pon, 27-04-05	czw, 27-05-06																		
1039			123	E	E1	Przegląd konserwacja oświetlenia na ruchu	58 dn	wto, 27-02-02	śro, 27-03-31																		
1040			124	E	E1	Przegląd konserwacja oświetlenia na postoju	26 dn	pon, 27-04-05	pią, 27-04-30																		
1041			125	E	E1	Przegląd urządzeń Ex na ruchu	24 dn	pon, 27-03-08	śro, 27-03-31																		

Id.		Tryb zadania	zakres	Branża	grupa zakresów	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2027-kwietnia												2027-maja						
											17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10
1042			126	E	E1	Przegląd urządzeń Ex na postoju	28 dn	pon, 27-04-05	nie, 27-05-02																				
1043			127	E	E1	Przegląd baterii kondensatorów	31 dn	pon, 27-03-01	śro, 27-03-31																				
1044			128	E	E1	Przegląd i konserwacja silników nn na ruchu	52 dn	pon, 27-02-08	śro, 27-03-31																				
1045			129	E	E1	Przegląd i konserwacja silników Sn i nn na postoju	28 dn	pon, 27-04-05	nie, 27-05-02																				

Lukasz Lewandowski

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół Inżynierów Kompleksu Reformingów
Branża Automatyczna i Elektryczna

Damian Marczewski

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydział Reformingu VI

Marcin Dytus

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół Inżynierów Kompleksu Reformingów
Branża Automatyczna i Elektryczna

Krzysztof Kokosza

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół Inżynierów Kompleksu Reformingów
Branża Mechaniczna

Paweł Orliński

Kierownik
Zespół Inżynierów Kompleksu Reformingów
Branża Mechaniczna

